




公費解体の進捗状況（令和7年9月末）

- ・解体見込棟数 42,710棟（別管理建物を除く）の **88.0%**となる **37,584棟**の解体が完了
- ・9月単月 計画: 3,323棟 実績: 2,008棟 達成率:60.4%
- ・9月末累計 計画:40,134棟 実績:37,584棟 達成率:93.6%

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1】					加速化プラン【R7.7】					解体見込棟数	別管理建物
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	44,953	2,243
解体計画	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	2,449	2,584	3,323	2,576		
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	34,227	36,811	40,134	42,710		
	解体実施率（累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.1%	7.9%	13%	18%	24%	29%	39%	43%	50%	57%	64%	71%	80%	86%	94%	100%		
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118	2,263	1,535	2,008			
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778	34,041	35,576	37,584			
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.1%	8.0%	11.9%	18.1%	25.8%	33.1%	40.1%	44.4%	52.6%	60.9%	67.1%	74.4%	79.7%	83.3%	88.0%			
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%	84.8%	104%	92.4%	59.4%	60.4%			
	計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%	104%	104%	99.5%	96.6%	93.6%			

解体見込棟数
（別管理建物を除く）

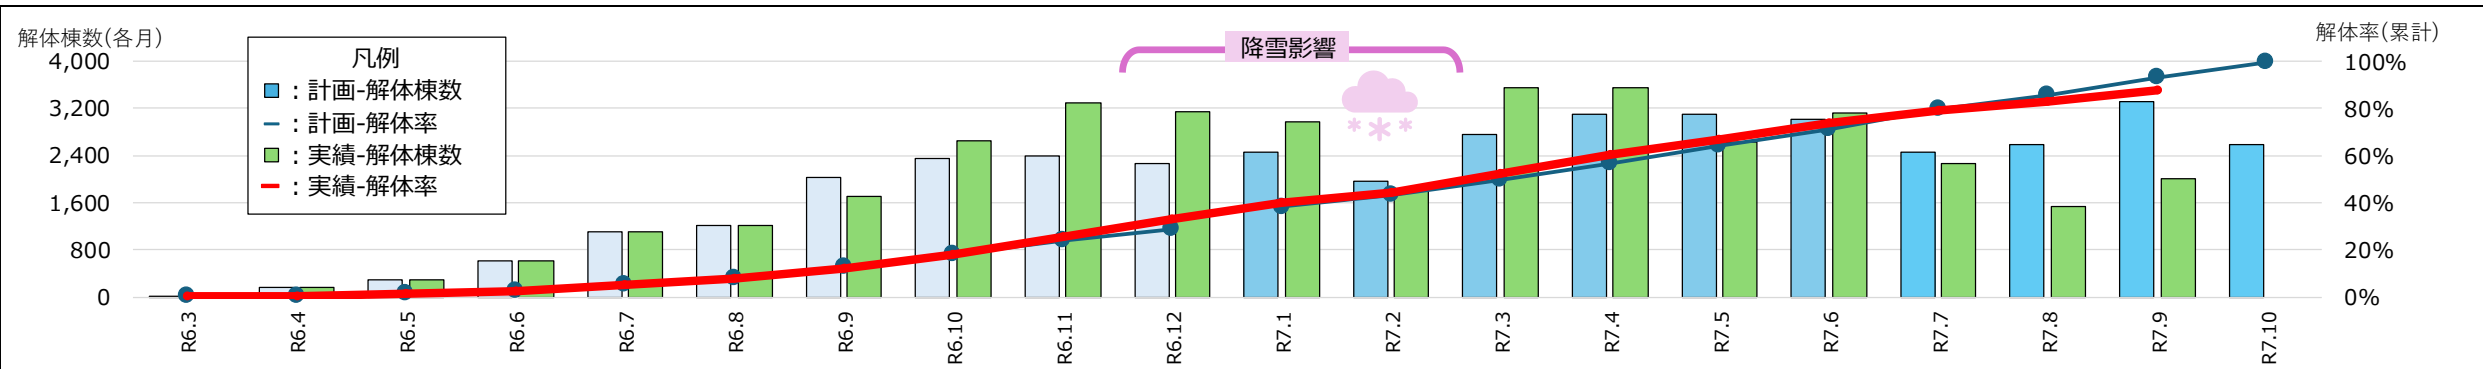

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計
※解体見込棟数は、加速化プラン【R7.7】の棟数。別管理建物の棟数は、最新値

市町別の進捗状況（令和7年9月末）



・穴水町で97%、志賀町で95%、珠洲市で94%の公費解体が完了

市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕 A	申請棟数 B	完了棟数 C	公費解体	緊急解体	自費解体	別管理建物 D	解体率 (見込棟数あたり) C÷(A-D)	解体率 (申請棟数あたり) C÷(B-D)
珠洲市	8,499 〔57〕	8,507 〔57〕	7,825 〔45〕	7,664 〔45〕	111 〔0〕	50 〔0〕	171 〔5〕	94.0% 〔86.5%〕	93.9% 〔86.5%〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,461 〔214〕	10,741 〔77〕	10,421 〔77〕	259 〔0〕	61 〔0〕	670 〔0〕	88.5% 〔35.5%〕	91.1% 〔36.0%〕
能登町	4,456 〔18〕	4,474 〔18〕	3,867 〔18〕	3,777 〔18〕	2 〔0〕	88 〔0〕	10 〔0〕	87.0% 〔100%〕	86.6% 〔100%〕
穴水町	2,819	2,795	2,698	2,659	0	39	27	96.6%	97.5%
七尾市	7,500	7,154	4,883	4,342	0	541	674	71.5%	75.4%
志賀町	5,104	4,931	4,436	4,041	9	386	424	94.8%	98.4%
上記以外の市町	3,767	3,747	3,134	2,730	4	400	267	89.5%	90.1%
計	44,953 〔292〕	44,069 〔289〕	37,584 〔140〕	35,634 〔140〕	385 〔0〕	1,565 〔0〕	2,243 〔5〕	88.0% 〔48.8%〕	89.9% 〔49.3%〕

※能美市、小松市、加賀市は公費解体完了。能登町は豪雨分の公費解体完了。公費解体は、13市町で実施中

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数



災害廃棄物の処理状況（令和7年8月末・暫定値）


- 発生推計量（別管理建物を除く）373万トンの **77.2%**となる **288万トン**の処理が完了
- 8月単月 計画：17万トン 実績：12万トン 達成率：72%
- 8月末累計 計画：286万トン 実績：288万トン 達成率：100%

（単位：千トン）

		加速化プラン【R7.1】												加速化プラン【R7.7】										全発生推計量	別管理建物						
		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3			
処理計画※	解体ごみの推計発生量（単月）	1			17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	202	213	274	279							4,195	470
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	174	166	209	221	201	160	61	9	2			
	②　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,696	2,863	3,072	3,293	3,493	3,653	3,714	3,723	3,726			
	処理率（累計）	0.07%	0.44%	0.94%	1.5%	2.3%	3.5%	6.5%	9.7%	14%	19%	25%	30%	35%	39%	46%	53%	60%	67%	72%	77%	82%	88%	94%	98%	99%	99%	100%			
処理実績	③処理実績（単月）	4	14	20	24	32	49	123	121	151	196	235	235	224	189	285	272	222	196	164	120										
	④　　（累計）	4	18	37	61	94	142	265	386	538	734	969	1,203	1,427	1,616	1,902	2,174	2,396	2,592	2,756	2,876										
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.47%	1.00%	1.6%	2.5%	3.8%	7.1%	10.4%	14.4%	19.7%	26.0%	32.3%	38.3%	43.4%	51.0%	58.3%	64.3%	69.6%	74.0%	77.2%										
	計画達成率（単月） （③÷①）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140%	107%	115%	104%	81.6%	79.0%	94.2%	72.3%										
	計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110%	110%	111%	110%	106%	104%	102%	100%										

発生推計量
（別管理建物を除く）

発生推計量
（別管理建物を除く）

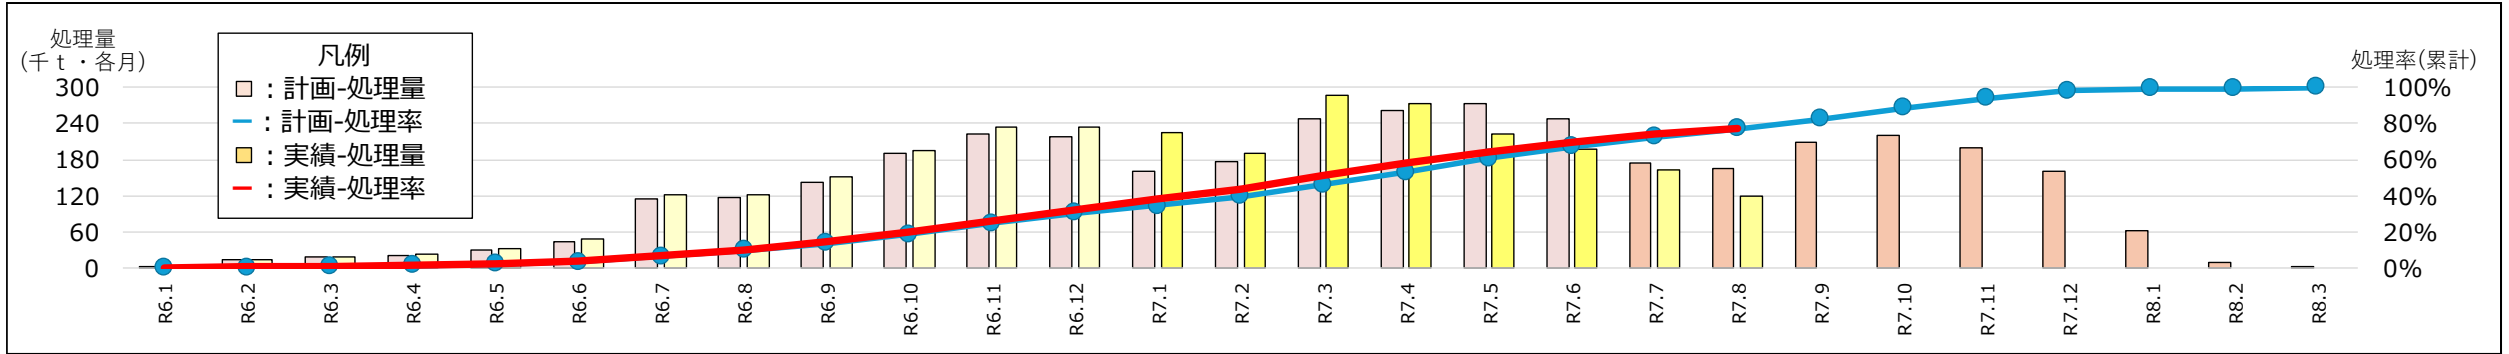

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計
※発生推計量は、加速化プラン【R7.7】の量。別管理建物分の解体ごみ推計発生量は、最新値

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年8月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	別管理建物分 C	処理率 B÷(A-C)
珠州市	831	685 (100%)	68 (9.9%)	101 (14.8%)	307 (44.8%)	11 (1.6%)	198 (28.9%)	0 (0.0%)	21	84.6%
輪島市	1,276	905 (100%)	73 (8.1%)	145 (16.0%)	387 (42.7%)	21 (2.3%)	279 (30.9%)	0 (0.0%)	88	76.2%
能登町	348	255 (100%)	15 (6.0%)	57 (22.4%)	86 (33.5%)	5 (2.0%)	92 (36.1%)	0 (0.0%)	38	82.4%
穴水町	259	240 (100%)	21 (8.6%)	35 (14.5%)	121 (50.5%)	5 (2.0%)	58 (24.4%)	0 (0.0%)	2	93.5%
七尾市	800	327 (100%)	27 (8.1%)	59 (18.1%)	111 (33.8%)	7 (2.2%)	124 (37.8%)	0 (0.0%)	242	58.7%
志賀町	365	239 (100%)	10 (4.1%)	57 (23.8%)	99 (41.5%)	3 (1.4%)	70 (29.1%)	0 (0.1%)	52	76.5%
上記以外の市 町	316	224 (100%)	10 (4.4%)	42 (18.6%)	63 (28.0%)	4 (1.8%)	106 (47.2%)	0 (0.1%)	25	77.0%
合 計	4,195	2,876 (100%)	224 (7.8%)	496 (17.2%)	1,172 (40.8%)	56 (2.0%)	927 (32.2%)	1 (0.0%)	470	77.2%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など
