

公費解体の進捗状況（令和7年10月末）





- 10月末時点で、申請棟数42,162棟のうち **40,056棟**の解体が完了し、公費解体加速化プランで設定した **10月末での解体完了目標をおおむね達成（解体率95%）**
※ 進捗管理のために用いていた解体見込棟数に代えて、より実態に即した申請棟数ベースで解体率を算出
- 穴水町、宝達志水町、かほく市、能美市、小松市、加賀市は解体完了**

（注）いずれも別管理建物（修繕・利活用を申し出た建物、土砂崩れで解体できない建物、解体に時間を要する大規模建物など、市町がやむを得ないと判断した建物）を除く

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	別管理建物 を除く申請棟数
解体実績	① 申請実績（累計）	3,087	10,557	17,119	21,767	25,212	28,198	30,040	31,865	33,411	34,839	36,304	37,188	38,825	40,029	41,674	42,854	43,221	43,990	44,069	44,146	42,162
	② 解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118	2,263	1,535	2,008	2,472	
	③ “（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778	34,041	35,576	37,584	40,056	別管理建物
	④ 解体率（申請・累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.6%	5.2%	8.1%	12.1%	18.3%	26.1%	33.6%	40.6%	44.9%	53.3%	61.7%	68.0%	75.4%	80.7%	84.4%	89.1%	95.0%	1,984

（参考）公費解体加速化プランにおける解体計画

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	別管理建物
解体計画	① 解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	2,449	2,584	3,323	3,354	
	② “（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	34,227	36,811	40,134	43,488	1,465
	③ 解体率（累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.0%	7.8%	12%	18%	25%	33%	39%	44%	52%	60%	66%	73%	79%	85%	92%	100%	

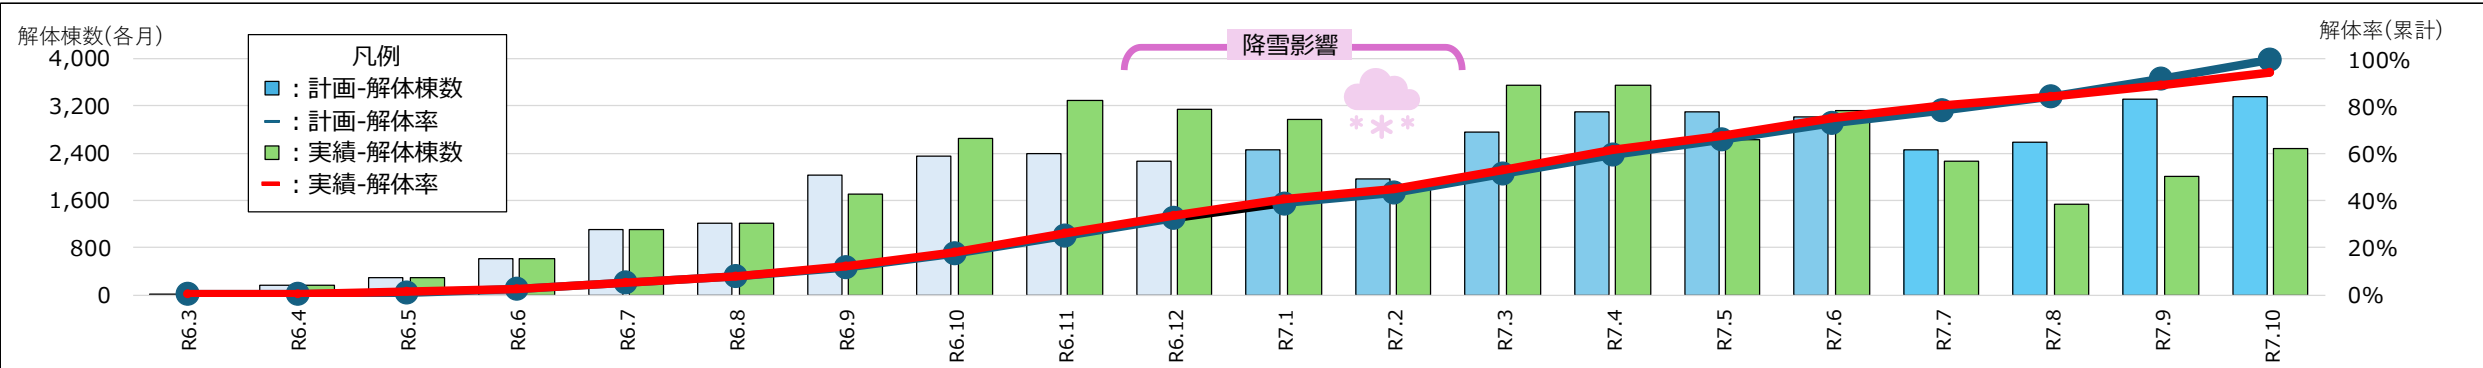

11月以降の公費解体の見込

- ・別管理建物を除く**解体未完了の建物 2,106棟の年内の解体完了**と、令和8年3月末の災害廃棄物の処理完了を目指し、**引き続き、国、関係団体と連携し、工程管理会議などを通して、市町を支援していく**
- ・未完了棟数は七尾市が最も多く、次いで、輪島市、能登町、志賀町の順であり、その理由は、**駆け込み申請が多かった**ことや、転居・移転先の確保や家財の片付けの都合などから、**解体時期をできるだけ遅らせてほしいなどの被災者の声を反映**したことが挙げられる

解体未完了の建物（計2,106棟・別管理建物を除く）

七尾市(1,073)、輪島市(500)、能登町(210)、志賀町(130)、珠洲市(109)、中能登町(30)、内灘町(29)、羽咋市(23)、津幡町(1)、金沢市(1)



（参考）別管理建物（1,984棟）

- ・早期の解体完了を目指すものの、個別の事情に応じ、できる限り柔軟に対応する
- ・「土砂崩れや道路の不通により、解体に着手できない建物」が最も多く、次いで、「解体に時間を要する大規模建物」が多い
- ・「その他」には、転居・移転待ちや家財等の片付けのため、11月以降に解体を希望する建物が多い

市町名	修繕・利活用	土砂崩れ等	大規模・石綿	不明制度活用※	重要文化財等	その他	計
珠洲市	36	38	6		1	99	180
輪島市	124	344	38	3	48	51	608
能登町			14				14
穴水町	4		1			9	14
七尾市	10		135	15		601	761
志賀町	37	5	33	2		57	134
上記以外	1		13	10	1	248	273
県全体	212	387	240	30	50	1,065	1,984

※不明制度活用
所有者が特定できない建物を公費解体するために、「所有者不明建物管理制度」の法的手続きを行った建物

6市町の進捗状況（令和7年10月末）



・穴水町で解体完了、珠洲市で99%、志賀町で97%、輪島市で96%、能登町で95%の解体が完了

市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕	申請棟数 A	完了棟数 B				別管理建物 C	解体未完了	解体率 B÷（A-C）
				公費解体	緊急解体	自費解体			
珠洲市	8,499 〔57〕	8,449 〔57〕	8,160 〔48〕	7,986 〔48〕	111 〔0〕	63 〔0〕	180 〔5〕	109 〔4〕	98.7% 〔92%〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,523 〔215〕	11,415 〔149〕	11,088 〔147〕	259 〔0〕	68 〔2〕	608 〔24〕	500 〔42〕	95.8% 〔78.0%〕
能登町	4,456 〔18〕	4,535 〔18〕	4,311 〔18〕	4,153 〔18〕	2 〔0〕	156 〔0〕	14 〔0〕	210 〔0〕	95.4% 〔100%〕
穴水町	2,819	2,795	2,781	2,742	0	39	14	0	100%
七尾市	7,500	7,175	5,341	4,774	0	567	761	1,073	83.3%
志賀町	5,104	4,931	4,667	4,272	9	386	134	130	97.3%
上記以外の市町	3,767	3,738	3,381	2,977	4	400	273	84	97.6%
計	44,953 〔292〕	44,146 〔290〕	40,056 〔215〕	37,992 〔213〕	385 〔0〕	1,679 〔2〕	1,984 〔29〕	2,106	95.0% 〔82.4%〕

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

6市町以外の進捗状況（令和7年10月末）



・宝達志水町、かほく市、能美市、小松市、加賀市で解体完了

資源循環推進課 076(225)1470

市町	解体見込棟数 【R7.7加速化プラン】	申請棟数 A	完了棟数 B				別管理建物 C	解体未完了	解体率 B÷（A-C）
				公費解体	緊急解体	自費解体			
中能登町	1,310	1,313	1,193	1,070	0	123	90	30	97.5%
羽咋市	808	788	695	615	0	80	70	23	96.8%
宝達志水町	222	221	207	188	0	19	14	0	100%
かほく市	259	261	220	202	0	18	41	0	100%
津幡町	74	78	77	49	0	28	0	1	98.7%
内灘町	688	671	595	571	0	24	47	29	95.4%
金沢市	246	246	234	182	4	48	11	1	99.6%
能美市	20	20	20	7	0	13	0	0	100%
小松市	91	91	91	51	0	40	0	0	100%
加賀市	49	49	49	42	0	7	0	0	100%
小計	3,767	3,738	3,381	2,977	4	400	273	84	97.6%

引き続き、国や関係団体と連携して市町を支援し、被災者に寄り添いながら、年内の解体完了を目指す
