

公費解体の進捗状況（令和7年12月末）

・別管理建物を除いた申請棟数 42,385棟について、**全ての解体が完了**
 （解体未完了 令和7年10月末：2,106棟 → 11月末：881棟 → 12月末：**0棟**）

（注）別管理建物：修繕・利活用を申し出た建物、土砂崩れで解体できない建物、解体に時間を要する大規模建物など、市町がやむを得ないと判断した建物


		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	別管理建物 を除く申請棟数
解体実績	申請実績（累計）	3,087	10,557	17,119	21,767	25,212	28,198	30,040	31,865	33,411	34,839	36,304	37,188	38,825	40,029	41,674	42,854	43,221	43,990	44,069	44,146	44,142	44,148	42,385
	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118	2,263	1,535	2,008	2,472	1,241	1,088	
	④ "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778	34,041	35,576	37,584	40,056	41,297	42,385	別管理建物
	解体率（申請・累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.2%	8.0%	12.0%	18.2%	26.0%	33.4%	40.4%	44.7%	53.0%	61.4%	67.6%	75.0%	80.3%	83.9%	88.7%	94.5%	97.4%	100%	1,763
（参考）公費解体加速化プランにおける解体計画																								
解体計画	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	2,449	2,584	3,323	3,354	別管理建物		
	② "（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	34,227	36,811	40,134	43,488	1,465		
	解体率（累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.0%	7.8%	12%	18%	25%	33%	39%	44%	52%	60%	66%	73%	79%	85%	92%	100%			

実行計画【R6.2】
解体見込22,499棟

加速化プラン【R6.8】
解体見込32,410棟

加速化プラン【R7.1】
解体見込39,235棟

加速化プラン【R7.7】
解体見込44,953棟

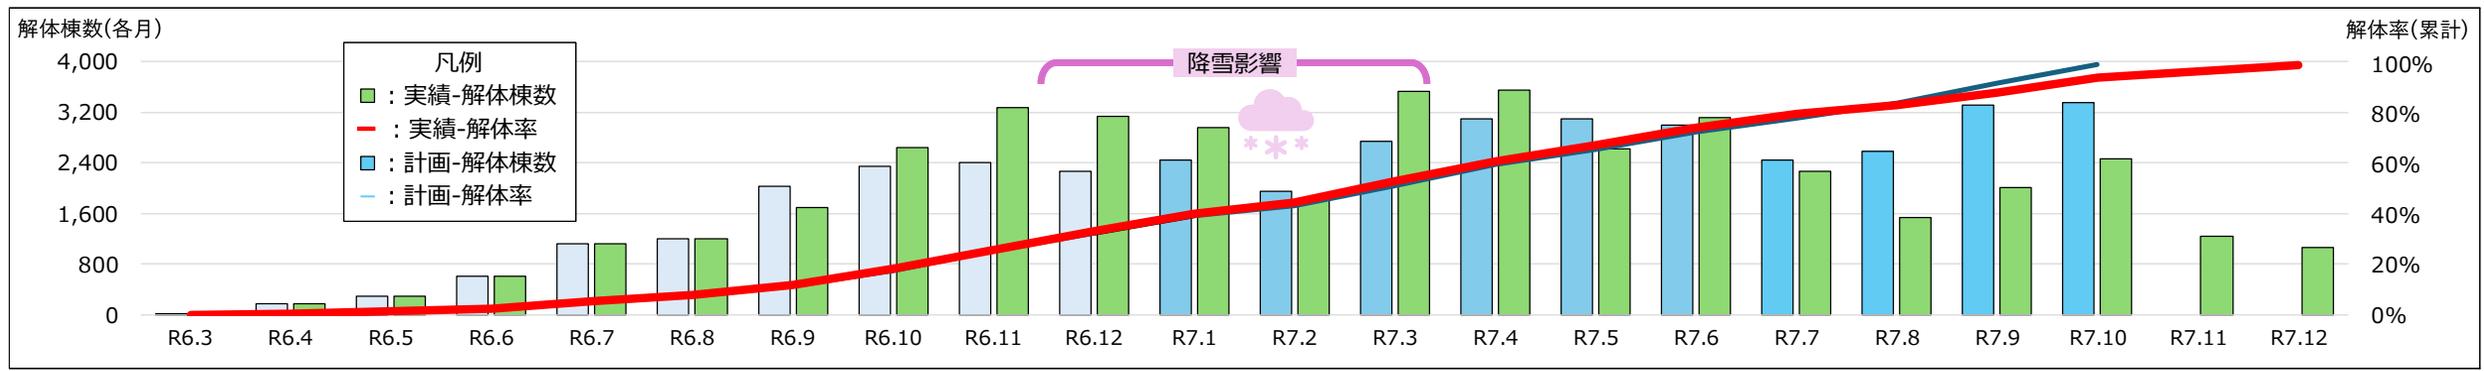

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

6市町の進捗状況（令和7年12月末）



・穴水町が10月末で、**珠洲市、輪島市、能登町、七尾市、志賀町**が12月末で解体完了

市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕	申請棟数 A	完了棟数 B	別管理建物			別管理建物 C	解体率 B÷(A-C)	完了年月
				公費解体	緊急解体	自費解体			
珠洲市	8,499 〔57〕	8,462 〔59〕	8,335 〔49〕	8,155 〔49〕	111 〔0〕	69 〔0〕	127 〔10〕	100% 〔100%〕	R7.12 〔R7.12〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,519 〔211〕	11,820 〔183〕	11,493 〔181〕	259 〔0〕	68 〔2〕	699 〔28〕	100% 〔100%〕	R7.12 〔R7.12〕
能登町	4,456 〔18〕	4,536 〔18〕	4,516 〔18〕	4,356 〔18〕	2 〔0〕	158 〔0〕	20 〔0〕	100% 〔100%〕	R7.12 〔R7.7〕
穴水町	2,819	2,795	2,790	2,751	0	39	5	100%	R7.10
七尾市	7,500	7,157	6,482	5,912	0	570	675	100%	R7.12
志賀町	5,104	4,936	4,778	4,387	9	382	158	100%	R7.12
上記以外の市町	3,767	3,743	3,664	3,260	4	400	79	100%	—
計	44,953 〔292〕	44,148 〔288〕	42,385 〔250〕	40,314 〔248〕	385 〔0〕	1,686 〔2〕	1,763 〔38〕	100% 〔100%〕	

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

6市町以外の進捗状況（令和7年12月末）



・羽咋市、津幡町、金沢市が11月末で、中能登町、内灘町が12月末で解体完了

資源循環推進課 076(225)1470

市町	解体見込棟数 【R7.7加速化プラン】	申請棟数 A	完了棟数 B	別管理建物			別管理建物 C	解体率 B÷(A-C)	完了年月
				公費解体	緊急解体	自費解体			
中能登町	1,310	1,318	1,304	1,181	0	123	14	100%	R7.12
羽咋市	808	789	783	703	0	80	6	100%	R7.11
宝達志水町	222	222	215	196	0	19	7	100%	R7.10
かほく市	259	261	236	218	0	18	25	100%	R7.10
津幡町	74	78	78	50	0	28	0	100%	R7.11
内灘町	688	669	650	626	0	24	19	100%	R7.12
金沢市	246	246	238	186	4	48	8	100%	R7.11
能美市	20	20	20	7	0	13	0	100%	R7.5
小松市	91	91	91	51	0	40	0	100%	R7.7
加賀市	49	49	49	42	0	7	0	100%	R7.5
小計	3,767	3,743	3,664	3,260	4	400	79	100%	

別管理建物について、引き続き、所有者の意向に寄り添い、市町、国、関係団体と連携しながら、着実に解体を進める
