

# 公費解体の進捗状況（令和8年2月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕	申請棟数	完了棟数	解体状況			別管理建物
				公費解体	緊急解体	自費解体	
珠洲市	8,499 〔57〕	8,450 〔58〕	8,362 〔50〕	8,181 〔50〕	111 〔0〕	70 〔0〕	88 〔8〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,512 〔210〕	11,950 〔191〕	11,623 〔189〕	259 〔0〕	68 〔2〕	562 〔19〕
能登町	4,456 〔18〕	4,563 〔18〕	4,537 〔18〕	4,376 〔18〕	2 〔0〕	159 〔0〕	26 〔0〕
穴水町	2,819	2,797	2,792	2,751	0	41	5
七尾市	7,500	7,265	6,789	6,104	0	685	476
志賀町	5,104	4,927	4,833	4,452	9	372	94
上記以外の市町	3,767	3,755	3,693	3,289	4	400	62
<b>計</b>	<b>44,953</b> 〔292〕	<b>44,269</b> 〔286〕 <b>(+66)</b>	<b>42,956</b> 〔259〕 <b>(+233)</b>	<b>40,776</b> 〔257〕 <b>(+198)</b>	<b>385</b> 〔0〕 <b>(+0)</b>	<b>1,795</b> 〔2〕 <b>(+35)</b>	<b>1,313</b> 〔27〕 <b>(-167)</b>

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数（）は、前月末からの増減数

# 6市町以外の公費解体の進捗状況（令和8年2月末）



市町	解体見込棟数 【R7.7加速化プラン】	申請棟数	完了棟数	解体状況			別管理建物
				公費解体	緊急解体	自費解体	
中能登町	1,310	1,317	1,312	1,189	0	123	5
羽咋市	808	796	787	707	0	80	9
宝達志水町	222	225	216	197	0	19	9
かほく市	259	261	251	233	0	18	10
津幡町	74	78	78	50	0	28	0
内灘町	688	672	650	626	0	24	22
金沢市	246	246	239	187	4	48	7
能美市	20	20	20	7	0	13	0
小松市	91	91	91	51	0	40	0
加賀市	49	49	49	42	0	7	0
<b>小計</b>	<b>3,767</b>	<b>3,755</b>	<b>3,693</b>	<b>3,289</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>62</b>



# 災害廃棄物の処理状況（令和8年1月末・暫定値）

- 発生推計量（別管理建物を除く）375万トンの **93.5%**となる **350万トン**の処理が完了
- 1月単月 計画: 5.0万トン 実績: 4.6万トン 達成率: 91.8%
- 1月末累計 計画: 370万トン 実績: 350万トン 達成率: 94.6%


（単位：千トン）

加速化プラン【R7.1】

加速化プラン【R7.7】

		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	全発生推計量	別管理建物
処理計画※	解体ごみの推計発生量（単月）			1	17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	202	213	274	279						4,195	450
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	174	166	209	221	201	160	50	20	22		
	②"（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,696	2,863	3,072	3,293	3,493	3,653	3,703	3,723	3,745		
	処理率（累計）	0.07%	0.44%	0.94%	1.5%	2.3%	3.4%	6.5%	9.6%	13%	18%	24%	30%	35%	39%	46%	53%	60%	67%	72%	76%	82%	88%	93%	98%	99%	99%	100%		
処理実績	③処理実績（単月）	4	14	20	24	32	48	123	121	152	196	235	235	224	190	286	273	225	201	165	125	169	172	118	105	46				
	④"（累計）	4	18	37	61	94	142	264	386	537	734	969	1,204	1,428	1,618	1,904	2,177	2,402	2,603	2,769	2,894	3,062	3,234	3,352	3,457	3,503				
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.47%	0.99%	1.6%	2.5%	3.8%	7.1%	10.3%	14.3%	19.6%	25.9%	32.2%	38.1%	43.2%	50.8%	58.1%	64.1%	69.5%	73.9%	77.3%	81.8%	86.4%	89.5%	92.3%	93.5%				
	計画達成率（単月） （③÷①）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140%	107%	115%	105%	82.7%	81.0%	95.1%	75.1%	80.5%	77.7%	58.8%	66.0%	91.8%			
計画達成率（累計） （④÷②）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110%	110%	111%	110%	107%	104%	103%	101%	99.7%	98.2%	95.9%	94.6%	94.6%				

発生推計量  
（別管理建物を除く）

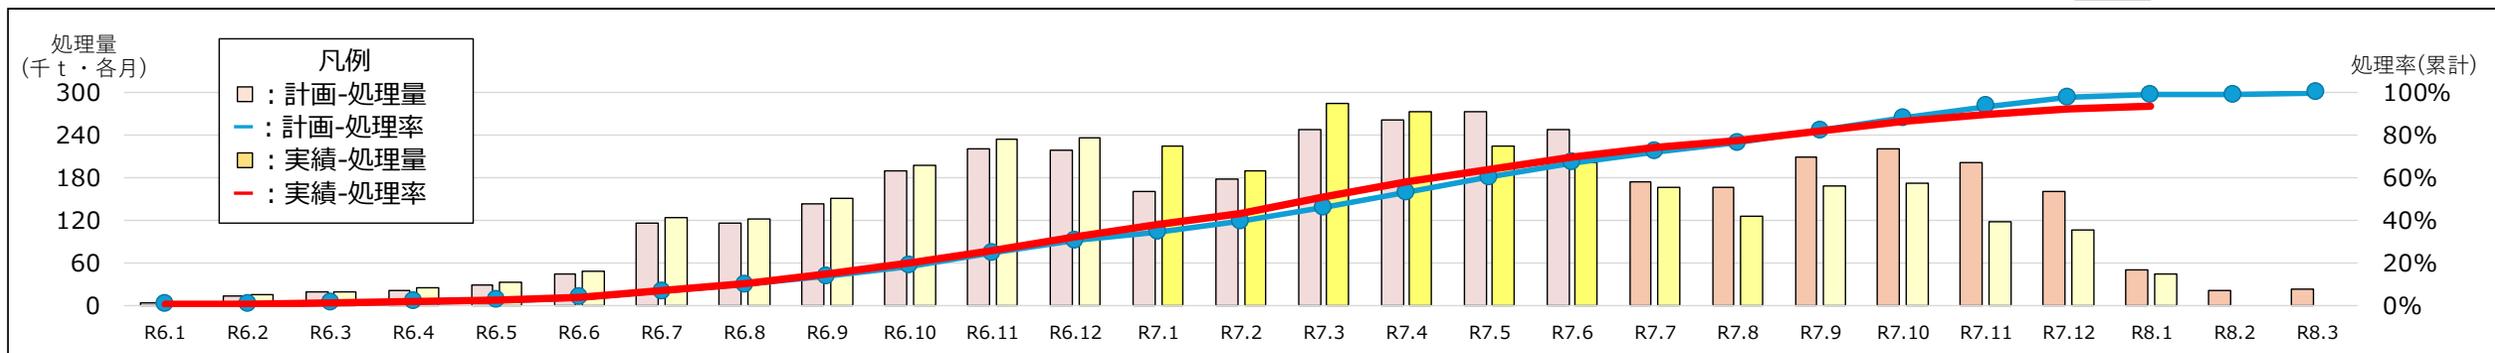

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

※発生推計量は、加速化プラン【R7.7】の量

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和8年1月末・暫定値）



・**珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、志賀町**の災害廃棄物処理が完了

（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量A 【R7.7加速化プラン】	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	別管理建 物分 C	処理率* B÷(A-C)	完了* 年月
珠洲市	831	796 (100%)	74 (9.3%)	115 (14.5%)	365 (45.8%)	14 (1.7%)	228 (28.7%)	0 (0.0%)	21	100%	R8.1
輪島市	1,276	1,073 (100%)	82 (7.7%)	183 (17.1%)	459 (42.8%)	24 (2.3%)	323 (30.1%)	0 (0.0%)	94	100%	R8.1
能登町	348	321 (100%)	18 (5.6%)	70 (22.0%)	112 (34.8%)	6 (1.9%)	114 (35.7%)	0 (0.0%)	38	100%	R8.1
穴水町	259	270 (100%)	21 (7.9%)	37 (13.8%)	134 (49.7%)	5 (2.0%)	72 (26.6%)	0 (0.0%)	0	100%	R7.11
七尾市	800	472 (100%)	35 (7.5%)	87 (18.4%)	155 (32.8%)	10 (2.2%)	184 (39.1%)	0 (0.0%)	243	84.7%	
志賀町	365	285 (100%)	11 (3.9%)	70 (24.5%)	119 (41.6%)	4 (1.3%)	81 (28.5%)	0 (0.1%)	43	100%	R8.1
上記以外の市町	316	287 (100%)	12 (4.3%)	52 (18.1%)	82 (28.8%)	5 (1.8%)	135 (46.9%)	0 (0.1%)	11	100%	
合計	4,195	3,503 (100%)	255 (7.3%)	615 (17.5%)	1,426 (40.7%)	69 (2.0%)	1,138 (32.5%)	1 (0.0%)	450	93.5%	

※ 令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など

\* 別管理建物分を除く。完了した市町は、100%と標記

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和8年1月末・暫定値）



・全ての市町で災害廃棄物の処理が完了

市町	災害廃棄物発生 推計量 A 【R7.7加速化プラン】	処理量 B	処理内容						別管理建 物分 C	処理率* B÷(A-C)	完了* 年月
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他			
中能登町	101	96 (100%)	6 (6.5%)	19 (19.3%)	35 (36.1%)	2 (1.6%)	35 (36.5%)	0 (0.0%)	1	100%	R8.1
羽咋市	76	60 (100%)	3 (5.6%)	11 (18.9%)	17 (27.5%)	1 (2.0%)	28 (46.0%)	0 (0.1%)	4	100%	R7.12
宝達志水町	18	16 (100%)	0 (2.6%)	3 (19.5%)	4 (26.5%)	0 (1.9%)	8 (49.6%)	0 (0.0%)	1	100%	R7.12
かほく市	20	19 (100%)	0 (1.6%)	4 (18.4%)	4 (22.3%)	0 (1.0%)	11 (56.5%)	0 (0.0%)	2	100%	R7.11
津幡町	6	6 (100%)	0 (1.3%)	1 (21.0%)	2 (34.9%)	0 (1.1%)	2 (40.8%)	0 (0.8%)	—	100%	R7.11
内灘町	59	61 (100%)	2 (2.7%)	9 (15.3%)	11 (18.9%)	1 (2.2%)	37 (61.0%)	0 (0.0%)	2	100%	R8.1
金沢市	22	16 (100%)	0 (0.9%)	3 (17.6%)	5 (33.3%)	0 (2.5%)	7 (45.7%)	0 (0.0%)	1	100%	R7.12
能美市	2	1 (100%)	0 (4.5%)	0 (7.1%)	1 (68.7%)	0 (1.0%)	0 (16.7%)	0 (2.0%)	—	100%	R7.5
小松市	8	8 (100%)	0 (1.1%)	1 (15.5%)	2 (29.2%)	0 (2.6%)	4 (51.5%)	0 (0.2%)	—	100%	R7.7
加賀市	3	3 (100%)	0 (2.7%)	1 (17.7%)	1 (21.2%)	0 (1.9%)	2 (56.5%)	0 (0.0%)	—	100%	R7.5
合計	316	287 (100%)	12 (4.3%)	52 (18.1%)	82 (28.8%)	5 (1.8%)	134 (46.9%)	0 (0.1%)	11	100%	

\* 別管理建物分を除く。  
完了した市町は、  
100%と標記  
(単位：千トン)
