

令和7年8月6日(水)
生活環境部資源循環推進課
担当者 岡 秀雄
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体加速化プランの進捗状況について

公費解体加速化プランに基づき、公費解体の進捗状況及び災害廃棄物の処理状況について、別紙のとおり公表します。なお、同様の内容を県ホームページでも掲載します。


公費解体の進捗状況（令和7年7月末）



- 解体見込棟数 43,488棟（別管理建物を除く）の 78.3%となる 34,041棟の解体が完了
- 7月単月 計画：2,449棟 実績：2,263棟 達成率：92.4%
- 7月末累計 計画：34,227棟 実績：34,041棟 達成率：99.5%

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1】					加速化プラン【R7.7】					別管理建物	解体見込棟数	
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10			
解体計画	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	2,449	2,584	3,323	3,354	1,465	44,953	
	②"（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	34,227	36,811	40,134	43,488			
	解体実施率（累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.0%	7.8%	12%	18%	23%	29%	38%	43%	49%	56%	63%	70%	79%	85%	92%	100%			
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118	2,263	解体見込棟数 （別管理建物を除く）					
	④"（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778	34,041						
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.0%	7.8%	11.7%	17.8%	25.3%	32.5%	39.3%	43.6%	51.7%	59.9%	65.9%	73.1%	78.3%						
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%	84.8%	104%	92.4%						
	計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	108%	114%	103%	102%	106%	107%	104%	104%	99.5%					

解体見込棟数
（別管理建物を除く）

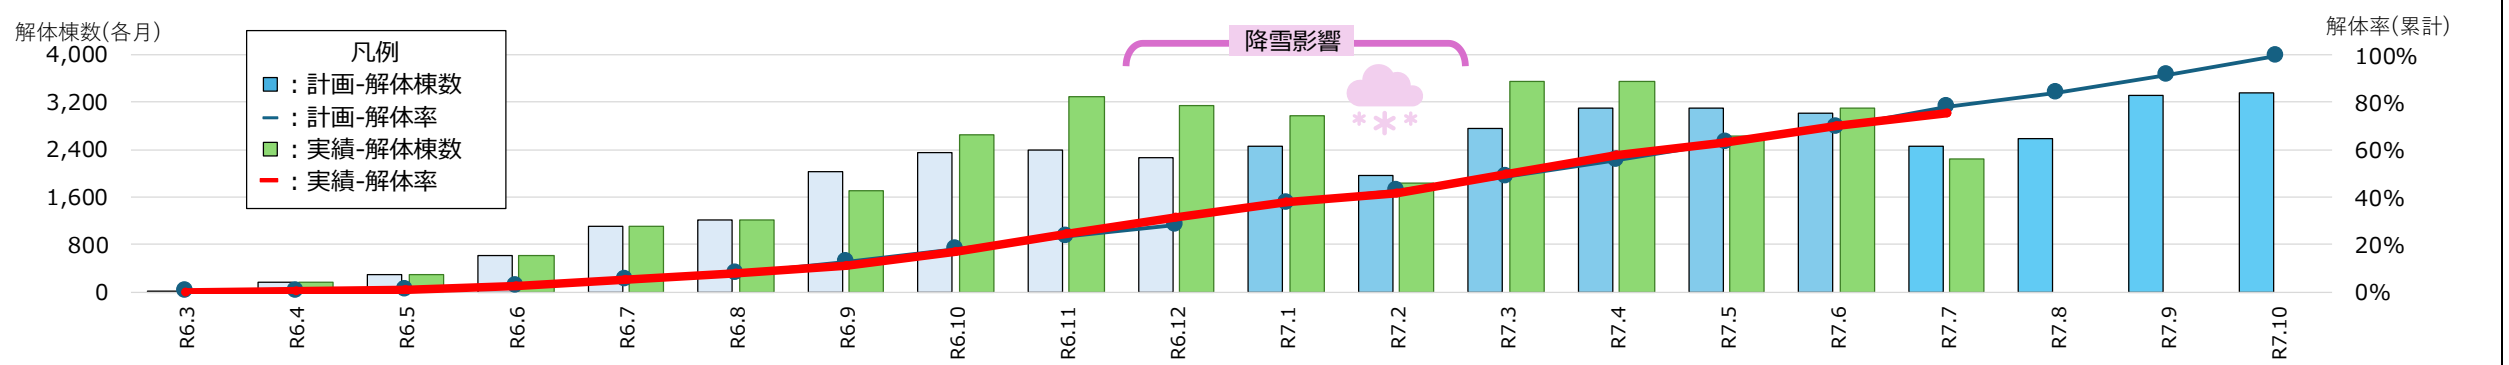

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の進捗状況（令和7年7月末）



・**珠洲市、穴水町の約9割、輪島市、志賀町の約8割**で公費解体が完了

市町	解体見込棟数 A	申請棟数 B	完了棟数 C	公費解体	緊急解体	自費解体	別管理建物 D	解体率 (見込棟数あたり) C÷(A-D)	解体率 (申請棟数あたり) C÷(B-D)
珠洲市	8,499 〔57〕	8,415 〔57〕	7,156 〔22〕	7,001 〔22〕	111 〔0〕	44 〔0〕	104 〔16〕	85.2% 〔53.7%〕	86.1% 〔53.7%〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,497 〔218〕	10,010 〔10〕	9,706 〔10〕	259 〔0〕	45 〔0〕	748 〔0〕	83.0% 〔4.6%〕	85.2% 〔4.6%〕
能登町	4,456 〔18〕	4,447 〔18〕	3,295 〔18〕	3,232 〔18〕	2 〔0〕	61 〔0〕	24 〔0〕	74.3% 〔100%〕	74.5% 〔100%〕
穴水町	2,819	2,808	2,591	2,553	0	38	69	94.2%	94.6%
七尾市	7,500	6,374	4,177	3,702	0	475	187	57.1%	67.5%
志賀町	5,104	4,946	4,021	3,626	9	386	225	82.4%	85.2%
上記以外の市町	3,767	3,734	2,791	2,391	4	396	108	76.3%	77.0%
計	44,953 〔292〕	43,221 〔293〕	34,041 〔50〕	32,211 〔50〕	385 〔0〕	1,445 〔0〕	1,465 〔16〕	78.3% 〔18.1%〕	81.5% 〔18.1%〕

※能美市、小松市、加賀市は、公費解体完了。能登町は、豪雨分の公費解体完了。公費解体は、13市町で実施中


※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数



災害廃棄物の処理状況（令和7年6月末・暫定値）

- 発生推計量（別管理建物を除く）379万トンの **66.6%**となる **252万トン**の処理が完了
- 6月単月 計画：25万トン 実績：19万トン 達成率：77%
- 6月末累計 計画：250万トン 実績：252万トン 達成率：101%

		加速化プラン【R7.1】												加速化プラン【R7.7】												別管理 建物	全発生推 計量			
処理 計画 ※	解体ごみの推計 発生量（単月）			1	17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	202	213	274	279						409	4,195
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	174	166	209	221	201	160	61	37	34		
	②　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,696	2,863	3,072	3,293	3,493	3,653	3,714	3,752	3,786		
	処理率（累計）	0.07%	0.44%	0.93%	1.5%	2.3%	3.4%	6.4%	9.5%	13%	18%	24%	30%	34%	39%	45%	52%	59%	66%	71%	76%	81%	87%	92%	96%	98%	99%	100%		
処理 実績	③処理実績（単月）	4	14	19	21	29	43	115	116	143	190	230	230	220	185	280	270	220	192											
	④　　（累計）	4	18	37	58	87	131	246	362	505	695	925	1,155	1,375	1,560	1,841	2,110	2,330	2,523											
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.46%	0.96%	1.5%	2.3%	3.5%	6.5%	9.6%	13.3%	18.4%	24.4%	30.5%	36.3%	41.2%	48.6%	55.7%	61.6%	66.6%											
	計画達成率（単月） （③÷①）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	137%	105%	113%	103%	80.7%	77.4%											
	計画達成率（累計） （④÷②）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	106%	106%	107%	107%	103%	101%											
		発生推計量 （別管理建物を除く）																												
		（単位：千トン）																												

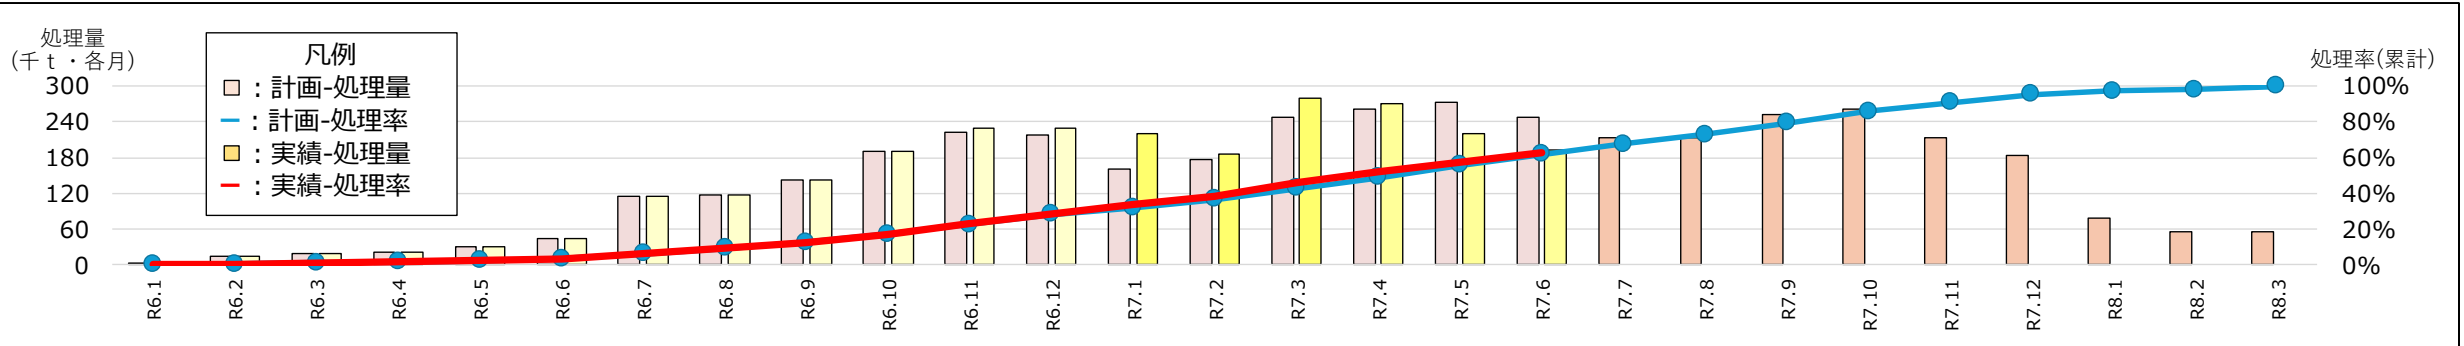

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計 ※処理実績は、自費解体分をまない



市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年6月末・暫定値）

（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B							別管理建物分 C	処理率 B÷(A-C)
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他		
珠洲市	831	623 (100%)	64 (10.3%)	94 (15.1%)	273 (43.9%)	10 (1.6%)	181 (29.1%)	0 (0.0%)	15	76.4%
輪島市	1,276	814 (100%)	70 (8.5%)	123 (15.1%)	352 (43.3%)	19 (2.4%)	250 (30.7%)	0 (0.0%)	96	69.0%
能登町	348	216 (100%)	14 (6.3%)	48 (22.4%)	72 (33.3%)	4 (2.1%)	77 (35.9%)	0 (0.0%)	38	69.6%
穴水町	259	222 (100%)	20 (9.0%)	33 (14.6%)	115 (51.6%)	4 (2.0%)	51 (22.8%)	0 (0.0%)	6	87.9%
七尾市	800	271 (100%)	25 (9.2%)	49 (18.2%)	97 (35.6%)	6 (2.1%)	94 (34.8%)	0 (0.0%)	203	45.4%
志賀町	365	201 (100%)	9 (4.3%)	48 (23.8%)	88 (43.7%)	3 (1.5%)	54 (26.7%)	0 (0.0%)	40	61.6%
上記以外の市 町	316	176 (100%)	9 (4.9%)	32 (17.9%)	50 (28.2%)	3 (1.9%)	83 (47.0%)	0 (0.1%)	11	57.8%
合 計	4,195	2,523 (100%)	210 (8.3%)	426 (16.9%)	1,046 (41.5%)	50 (2.0%)	790 (31.3%)	1 (0.0%)	409	66.6%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など
