

令和7年11月7日(金)
生活環境部資源循環推進課
担当者 岡 秀雄
内線 4240
外線 076-225-1470

公費解体加速化プランの進捗状況について

公費解体加速化プランに基づき、公費解体の進捗状況及び災害廃棄物の処理状況について、別紙のとおり公表します。なお、同様の内容を県ホームページでも掲載します。



公費解体の進捗状況（令和7年10月末）



- 10月末時点で、申請棟数42,162棟のうち **40,056棟**の解体が完了し、公費解体加速化プランで設定した **10月末での解体完了目標をおおむね達成（解体率95%）**
※ 進捗管理のために用いていた解体見込棟数に代えて、より実態に即した申請棟数ベースで解体率を算出
- 穴水町、宝達志水町、かほく市、能美市、小松市、加賀市は解体完了**

（注）いずれも別管理建物（修繕・利活用を申し出た建物、土砂崩れで解体できない建物、解体に時間を要する大規模建物など、市町がやむを得ないと判断した建物）を除く

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	別管理建物 を除く申請棟数
解体実績	①申請実績（累計）	3,087	10,557	17,119	21,767	25,212	28,198	30,040	31,865	33,411	34,839	36,304	37,188	38,825	40,029	41,674	42,854	43,221	43,990	44,069	44,146	42,162
	②解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546	2,629	3,118	2,263	1,535	2,008	2,472	
	③〃（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031	28,660	31,778	34,041	35,576	37,584	40,056	別管理建物
	④解体率（申請・累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.6%	5.2%	8.1%	12.1%	18.3%	26.1%	33.6%	40.6%	44.9%	53.3%	61.7%	68.0%	75.4%	80.7%	84.4%	89.1%	95.0%	1,984

（参考）公費解体加速化プランにおける解体計画

		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	別管理建物
解体計画	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	2,449	2,584	3,323	3,354	
	②〃（累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	34,227	36,811	40,134	43,488	1,465
	③解体率（累計）	0.0%	0.4%	1.1%	2.5%	5.0%	7.8%	12%	18%	25%	33%	39%	44%	52%	60%	66%	73%	79%	85%	92%	100%	

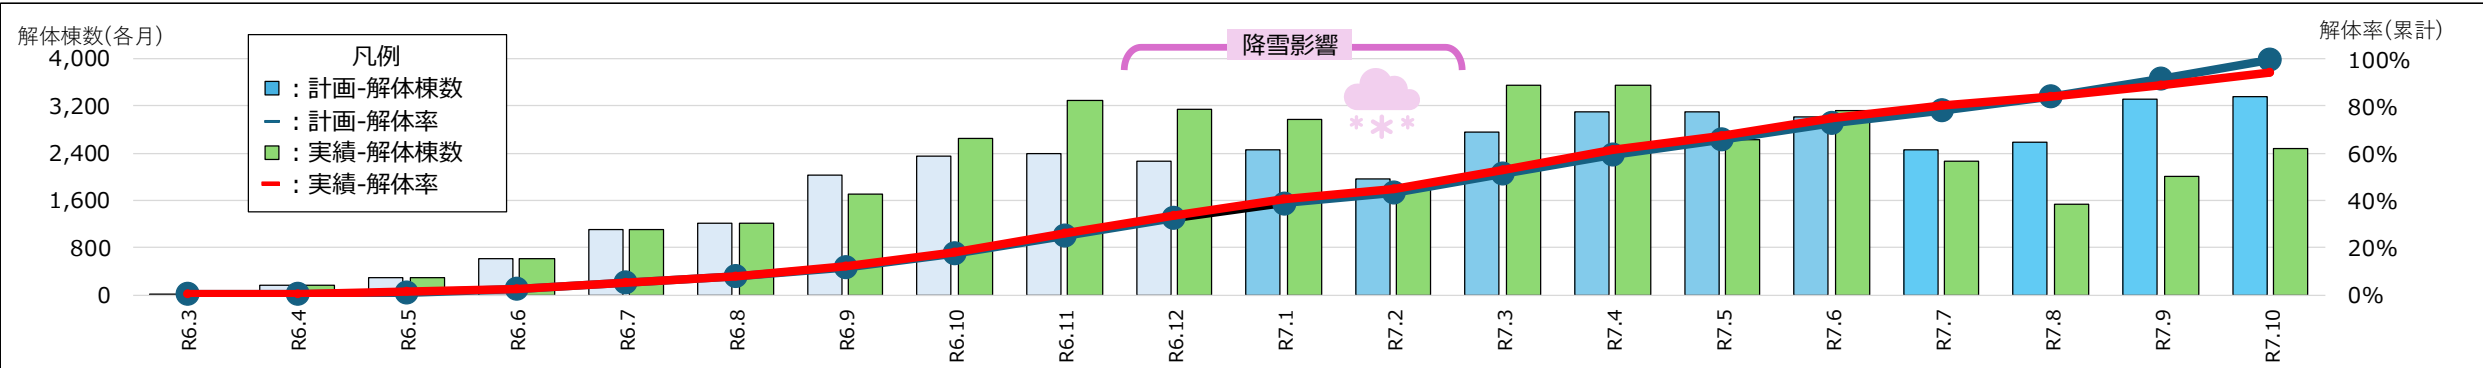

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

6市町の進捗状況（令和7年10月末）



・穴水町で解体完了、珠洲市で99%、志賀町で97%、輪島市で96%、能登町で95%の解体が完了

市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕	申請棟数 A	完了棟数 B				別管理建物 C	解体未完了	解体率 B÷（A-C）
				公費解体	緊急解体	自費解体			
珠洲市	8,499 〔57〕	8,449 〔57〕	8,160 〔48〕	7,986 〔48〕	111 〔0〕	63 〔0〕	180 〔5〕	109 〔4〕	98.7% 〔92%〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,523 〔215〕	11,415 〔149〕	11,088 〔147〕	259 〔0〕	68 〔2〕	608 〔24〕	500 〔42〕	95.8% 〔78.0%〕
能登町	4,456 〔18〕	4,535 〔18〕	4,311 〔18〕	4,153 〔18〕	2 〔0〕	156 〔0〕	14 〔0〕	210 〔0〕	95.4% 〔100%〕
穴水町	2,819	2,795	2,781	2,742	0	39	14	0	100%
七尾市	7,500	7,175	5,341	4,774	0	567	761	1,073	83.3%
志賀町	5,104	4,931	4,667	4,272	9	386	134	130	97.3%
上記以外の市町	3,767	3,738	3,381	2,977	4	400	273	84	97.6%
計	44,953 〔292〕	44,146 〔290〕	40,056 〔215〕	37,992 〔213〕	385 〔0〕	1,679 〔2〕	1,984 〔29〕	2,106	95.0% 〔82.4%〕

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

6 市町以外の進捗状況（令和 7 年10月末）



・宝達志水町、かほく市、能美市、小松市、加賀市で解体完了

市町	解体見込棟数 【R7.7加速化プラン】	申請棟数 A	完了棟数 B				別管理建物 C	解体未完了	解体率 B÷（A-C）
				公費解体	緊急解体	自費解体			
中能登町	1,310	1,313	1,193	1,070	0	123	90	30	97.5%
羽咋市	808	788	695	615	0	80	70	23	96.8%
宝達志水町	222	221	207	188	0	19	14	0	100%
かほく市	259	261	220	202	0	18	41	0	100%
津幡町	74	78	77	49	0	28	0	1	98.7%
内灘町	688	671	595	571	0	24	47	29	95.4%
金沢市	246	246	234	182	4	48	11	1	99.6%
能美市	20	20	20	7	0	13	0	0	100%
小松市	91	91	91	51	0	40	0	0	100%
加賀市	49	49	49	42	0	7	0	0	100%
小計	3,767	3,738	3,381	2,977	4	400	273	84	97.6%



災害廃棄物の処理状況（令和7年9月末・暫定値）


- 発生推計量（別管理建物を除く）373万トンの **81.9%**となる **305万トン**の処理が完了
- 9月単月 計画：21万トン 実績：17万トン 達成率：80%
- 9月末累計 計画：307万トン 実績：305万トン 達成率：99%

（単位：千トン）

		加速化プラン【R7.1】												加速化プラン【R7.7】												全発生 推計量	別管理 建物				
		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3			
処理計画※	解体ごみの推計発生量（単月）	1				17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	202	213	274	279						4,195	470
	①処理量（単月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	174	166	209	221	201	160	40	20	12			
	②　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,696	2,863	3,072	3,293	3,493	3,653	3,693	3,713	3,725			
	処理率（累計）	0.07%	0.44%	0.94%	1.5%	2.3%	3.5%	6.5%	9.7%	14%	19%	25%	30%	35%	39%	46%	53%	60%	67%	72%	77%	82%	88%	94%	98%	99%	99%	100%			
処理実績	③処理実績（単月）	4	14	20	24	32	48	122	121	152	196	235	235	224	190	286	273	225	198	164	120	167									
	④　　（累計）	4	18	37	61	94	142	264	385	537	733	968	1,203	1,428	1,618	1,903	2,176	2,401	2,599	2,763	2,884	3,050									
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.47%	1.00%	1.6%	2.5%	3.8%	7.1%	10.3%	14.4%	19.7%	26.0%	32.3%	38.3%	43.4%	51.1%	58.4%	64.5%	69.8%	74.2%	77.4%	81.9%									
	計画達成率（単月） （③÷①）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	140%	107%	115%	105%	82.6%	79.6%	94.6%	72.4%	79.6%									
	計画達成率（累計） （④÷②）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110%	110%	111%	110%	107%	104%	102%	101%	99.3%									

発生推計量
（別管理建物を除く）

発生推計量
（別管理建物を除く）

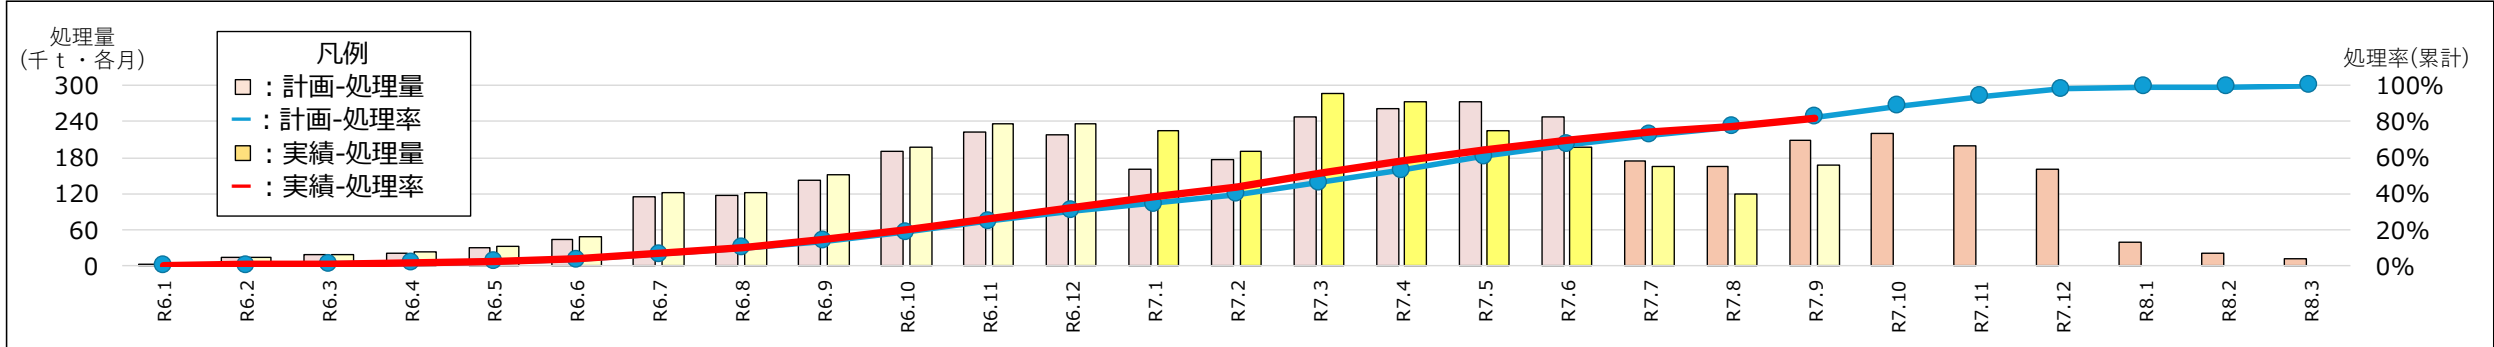

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計
※発生推計量は、加速化プラン【R7.7】の量。別管理建物分の解体ごみ推計発生量は、最新値

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年9月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	別管理建物分 C	処理率 B ÷ (A - C)
珠洲市	831	717 (100%)	70 (9.8%)	105 (14.7%)	323 (45.1%)	12 (1.6%)	206 (28.7%)	0 (0.0%)	26	89.0%
輪島市	1,276	956 (100%)	76 (8.0%)	155 (16.2%)	407 (42.6%)	22 (2.3%)	296 (30.9%)	0 (0.0%)	86	80.4%
能登町	348	278 (100%)	17 (6.0%)	62 (22.4%)	96 (34.5%)	5 (2.0%)	98 (35.1%)	0 (0.0%)	38	89.8%
穴水町	259	253 (100%)	21 (8.2%)	35 (13.8%)	128 (50.4%)	5 (2.0%)	65 (25.5%)	0 (0.0%)	1	98.4%
七尾市	800	357 (100%)	28 (7.9%)	65 (18.1%)	119 (33.3%)	8 (2.1%)	138 (38.6%)	0 (0.0%)	250	65.0%
志賀町	365	249 (100%)	10 (4.2%)	60 (23.9%)	103 (41.4%)	3 (1.4%)	73 (29.1%)	0 (0.1%)	41	77.0%
上記以外の市 町	316	239 (100%)	11 (4.4%)	44 (18.5%)	67 (28.2%)	4 (1.8%)	112 (47.0%)	0 (0.1%)	27	82.7%
合 計	4,195	3,050 (100%)	233 (7.7%)	526 (17.2%)	1,243 (40.8%)	59 (1.9%)	987 (32.4%)	1 (0.0%)	470	81.9%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計。（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など
