


# 富来漁港 施設の復旧の見通し（目標）

令和7年12月31日時点

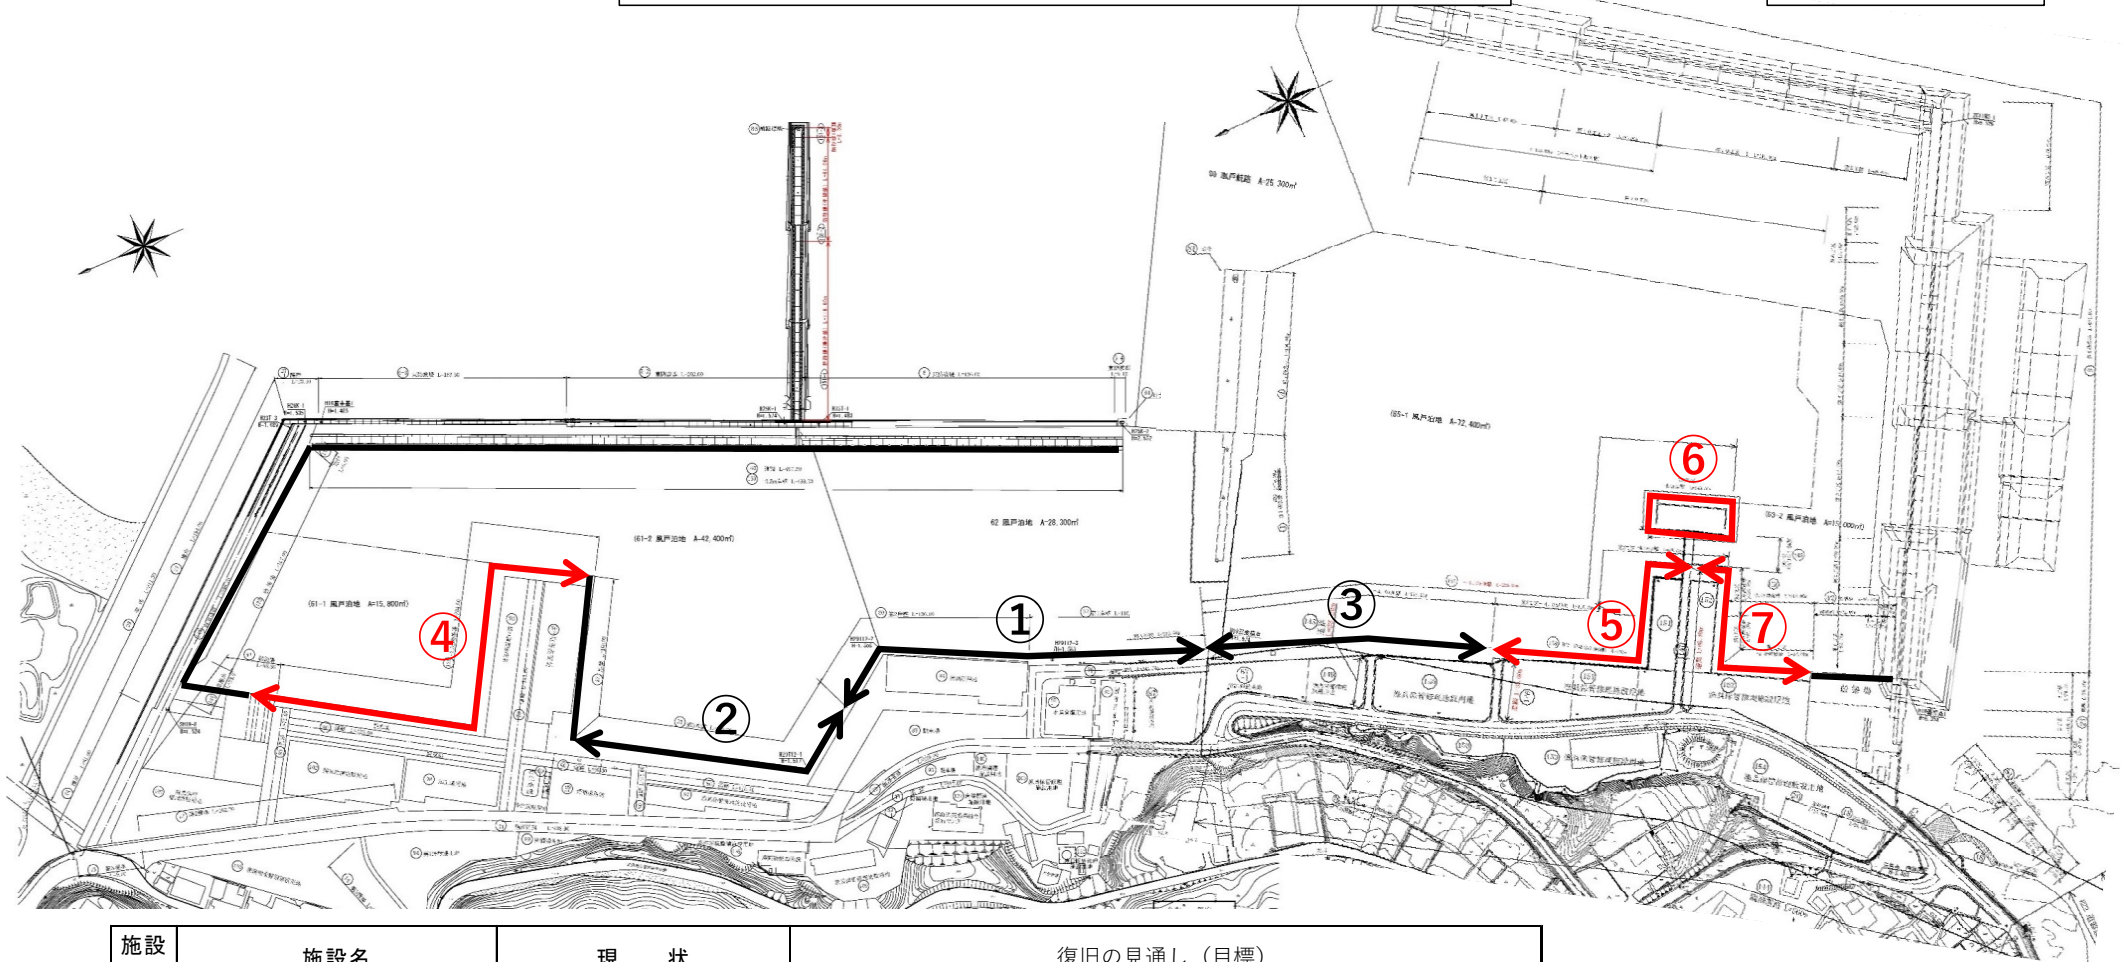

施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	32 第1岸壁 30 第2岸壁	復旧済み	（全延長供用）
②	31 第3岸壁	復旧済み	（全延長供用）
③	141 -4.0m岸壁 （1工区）	復旧済み	（全延長供用）
④	125 -2.5m物揚場 41 船揚場	暫定利用可（復旧中）	令和8年5月～7月頃（全延長供用）
⑤	141 -4.0m岸壁 （2～3工区）	暫定利用可	令和9年3月～5月頃（全延長供用）
⑥	141 -4.0m岸壁（3工区） 130 -2.0m物揚場	暫定利用可	令和10年3月～5月頃（全延長供用）
⑦	141 -4.0m岸壁（4工区）	暫定利用可	令和10年3月～5月頃（全延長供用）

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。
