


狼煙漁港（高屋地区） 施設の復旧の見通し（目標）

令和8年6月30日時点

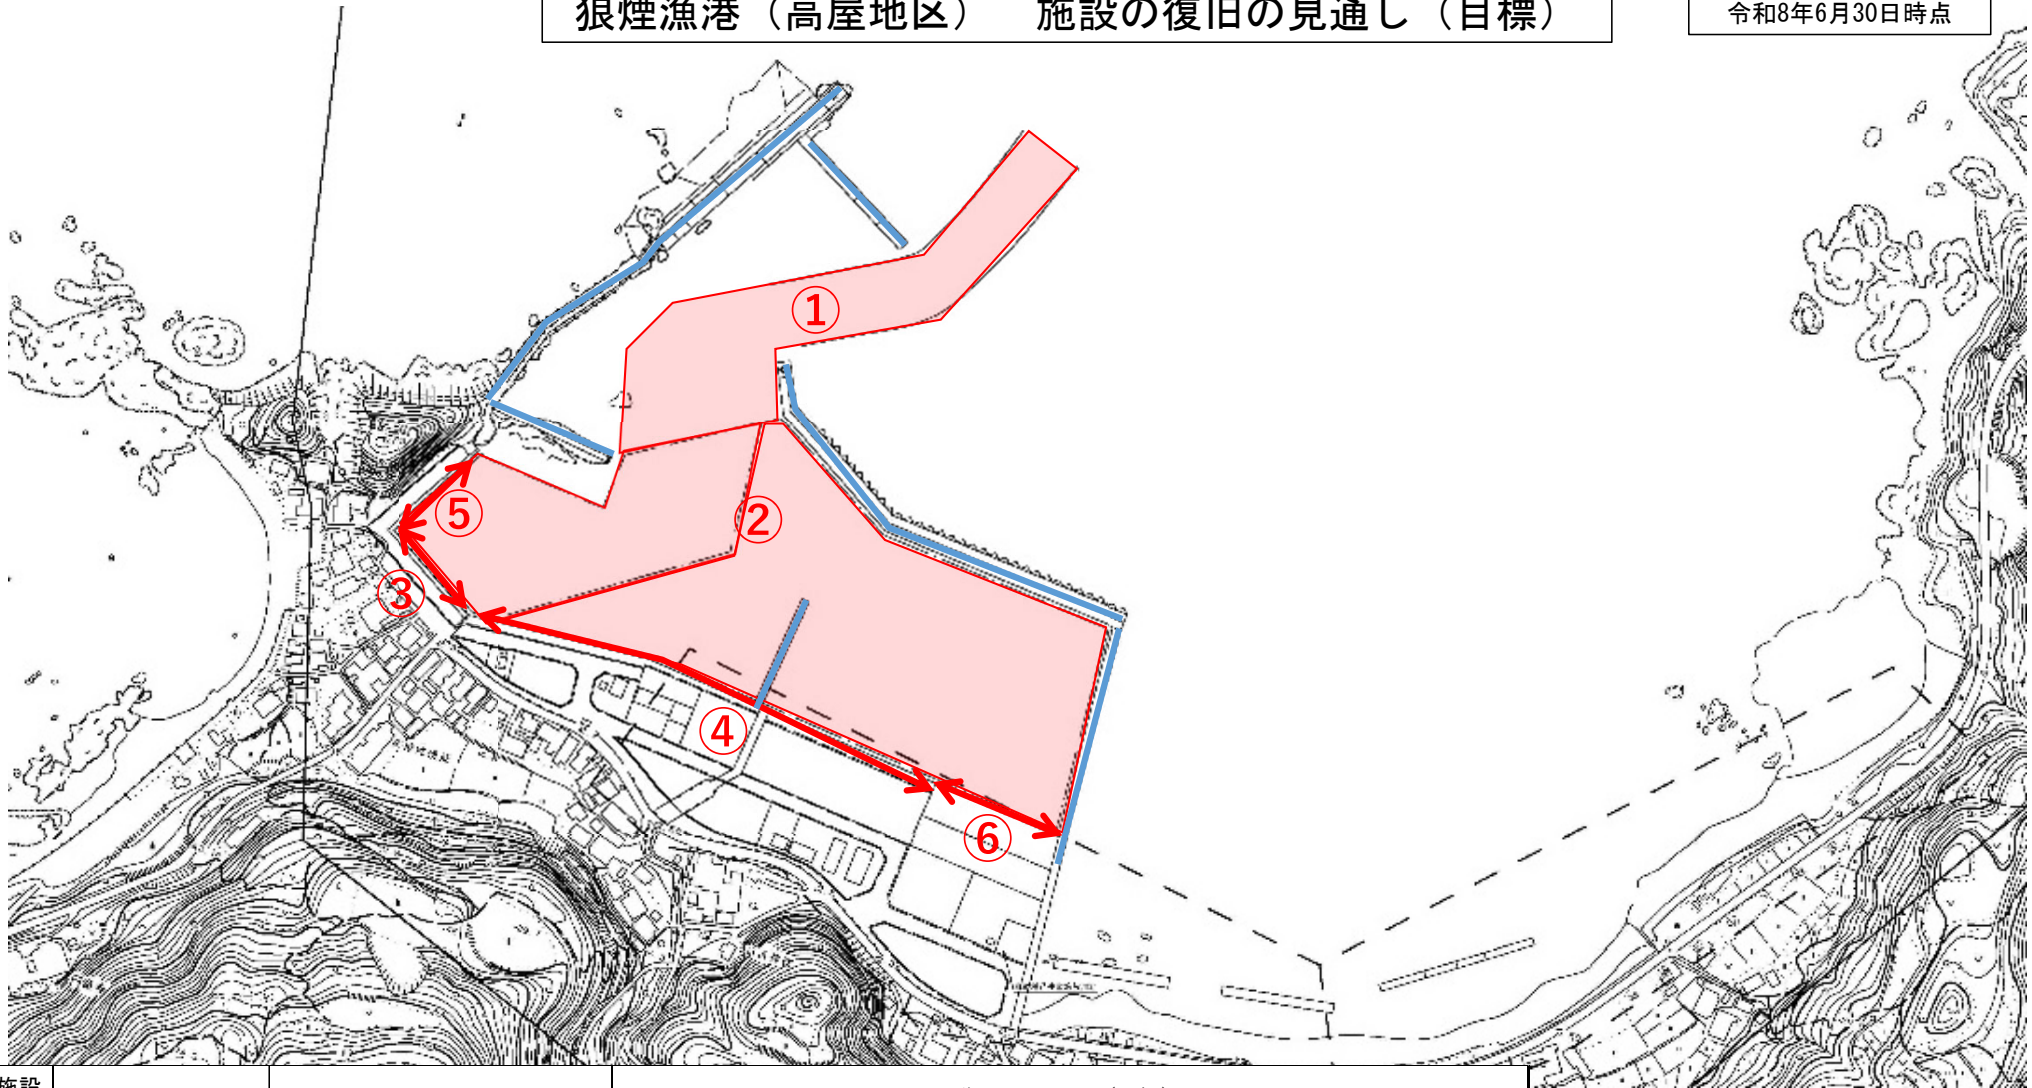

施設場所	施設名	現 状	復旧の見通し（目標）
①	13 中央航路	一部暫定利用可（仮復旧済）	令和11年3月～5月頃 供用
②	12 -3.5m泊地 18 -2.5m泊地	一部暫定利用可（仮復旧済）	令和11年3月～5月頃 供用
③	10 -3.5m岸壁	暫定利用可（仮復旧済）	令和7年5月より一部暫定利用可 令和11年3月～5月頃 供用
④	15 -2.5m物揚場	利用不可	令和10年9月～11月頃 供用
⑤	9 -3.5m岸壁	利用不可	令和11年3月～5月頃 供用
⑥	16 船揚場	利用不可	令和11年3月～5月頃 供用

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。
