

# 農免農道整備事業 北潟地区

## 事業目的


本地区には幹線農道がなく、受益者は農産物の輸送に交通量の多い国道や主要地方道を通行しなければならず、営農に支障を来している状況であった。

本農道の整備により、農産物搬入等の効率化、営農労力の省力化を促進し、農業経営の合理化を図るほか、地域住民の生活道路としての活用により生活環境の向上に資する。

## 地区概要

- 箇所名：石川県 鹿島郡中能登町金丸出（起点）～羽咋市東的場町（終点）
- 工事内容：農道工 L=7,315m
- 総事業費：2,436百万円
- 受益面積：788ha
- 事業期間：平成3年度～平成21年度

## 位置図

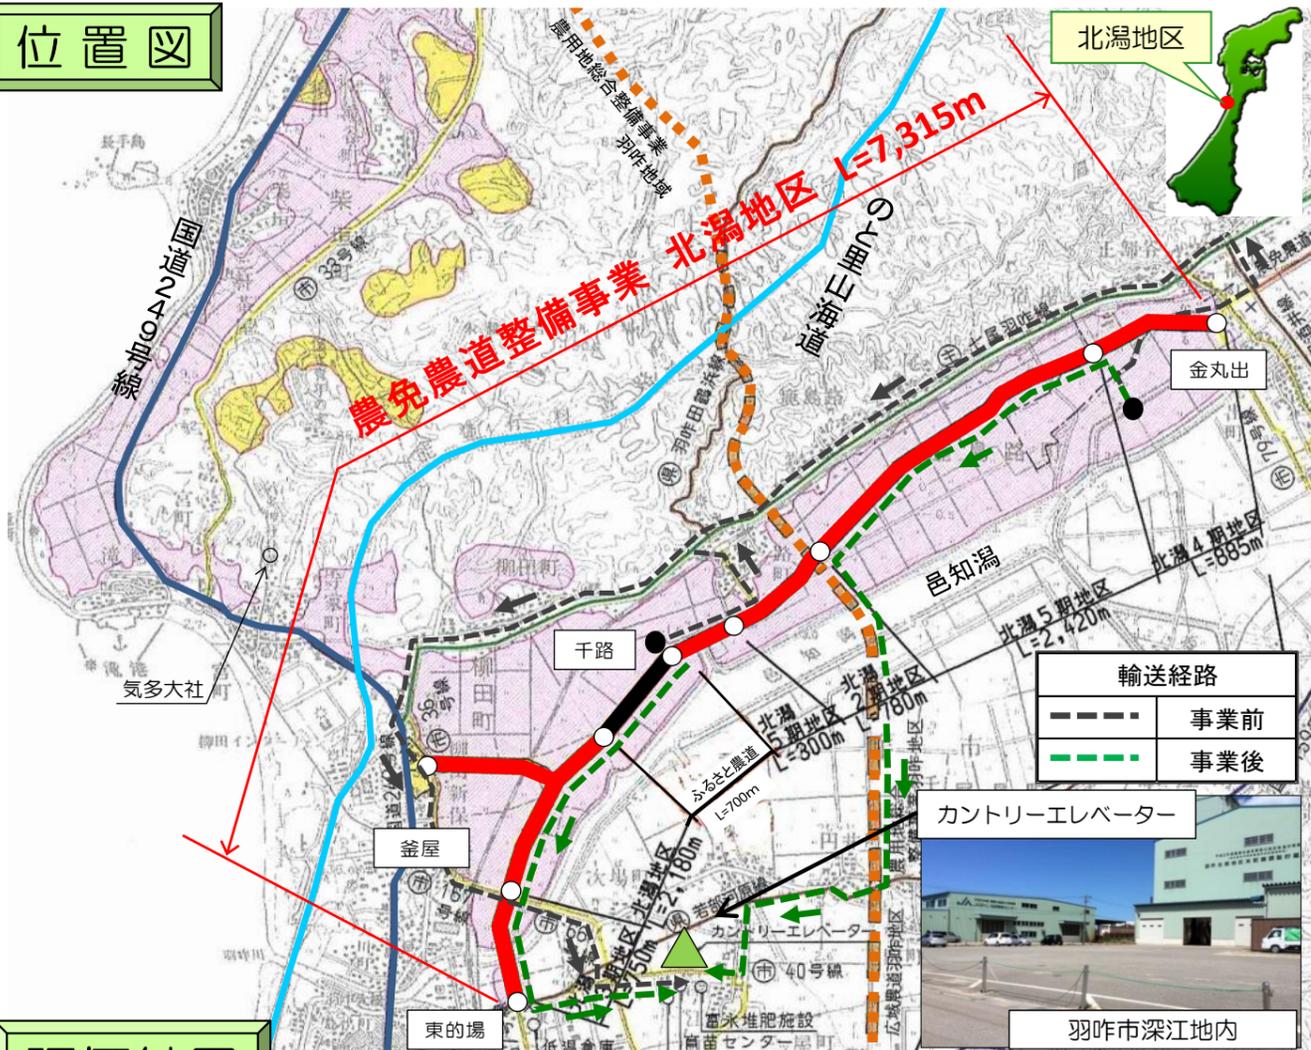

## 評価結果

本農道の整備により、米のカントリーエレベーターへの搬入時間等が短縮し、輸送の効率化が図られている。

地域住民の生活道路としても活用され、生活環境の向上が図られている。

## 写真で見る事業効果

農道の整備により、移動距離の短縮のほか、交通量の多い国道や主要地方道を通行せず、農産物搬入が可能になったことで輸送時間の短縮が図られた。

周辺道路の混雑状況



羽咋市釜屋地内

交通量の多い路線を回避



羽咋市千路地内

### ■自然環境への配慮

事業実施において、通行車両の影響から野鳥を保護するための遮光壁を設置している。

遮光壁の設置状況



羽咋市千路地内

白鳥の飛来状況 (邑知潟周辺)



羽咋市千路地内

## 数字で見る事業効果

### ■米のカントリーエレベーターへの搬入時間が最大15分短縮

金丸出：事業前：11.6km (28分) → 事業後：7.6km (13分) ▲15分  
 千路：事業前：6.9km (17分) → 事業後：3.9km (7分) ▲10分

### ■農道の利用台数

計画：1,453台/日

評価時 (H27)：2,869台/日


### ■地元の声

#### アンケート調査結果


対象：周辺住民（農道の沿線6集落）  
 配布：748世帯  
 回収：580世帯（回収率78%）

#### ～良かったと思う主な意見～


- ・農産物の輸送が楽になった
- ・農業機械が搬入しやすくなった
- ・通勤、通学、生活道路としても利用している

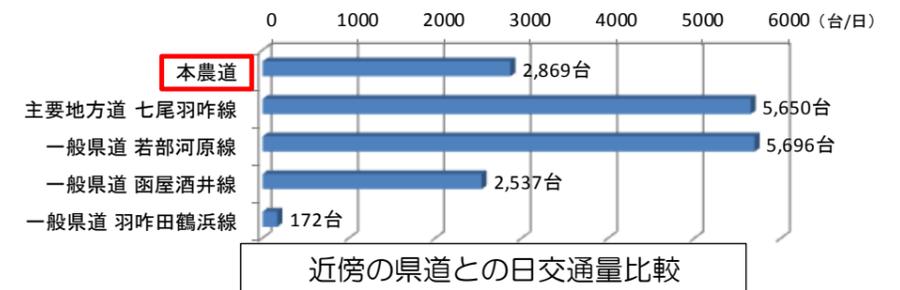

整備後の移動時間は  
どうなりましたか？



地域として農道整備されたことは  
良かったと思いますか？



## 今後の取組み

本農道は、農産物搬入等の効率化のみならず、地域住民の生活道路として活用されおり、生活環境の向上に寄与している。

この事業効果を持続させるため、軟弱地盤である邑知平野におけるアスファルト舗装の補修等、適切な維持管理が図られるよう管理者と連携しながら今後も取り組む。
