




公費解体の進捗状況（令和7年4月末）

- 解体見込棟数39,235棟の **66.3%**となる **26,031棟**の解体が完了
 - 4月単月 計画: 3,096棟 実績: 3,546棟 達成率:115%
 - 4月末累計 計画:24,403棟 実績:26,031棟 達成率:107%
- 4月における解体棟数は、計画を上回った

		加速化プラン【R6.8】										加速化プラン【R7.1改定】									
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数	8	56	120	247	601	661	982	1,120	1,211	1,256	973	1,021	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	800	482
	①解体棟数（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245
	② “ （累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235
	解体実施率（累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
解体実績	③解体実績（各月）	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832	3,541	3,546						
	④ “ （累計）	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944	22,485	26,031						
	解体率（見込・累計）	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%	57.3%	66.3%						
	計画達成率（各月） （③÷①）						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%	129%	115%						
	計画達成率（累計） （④÷②）	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%	106%	107%						

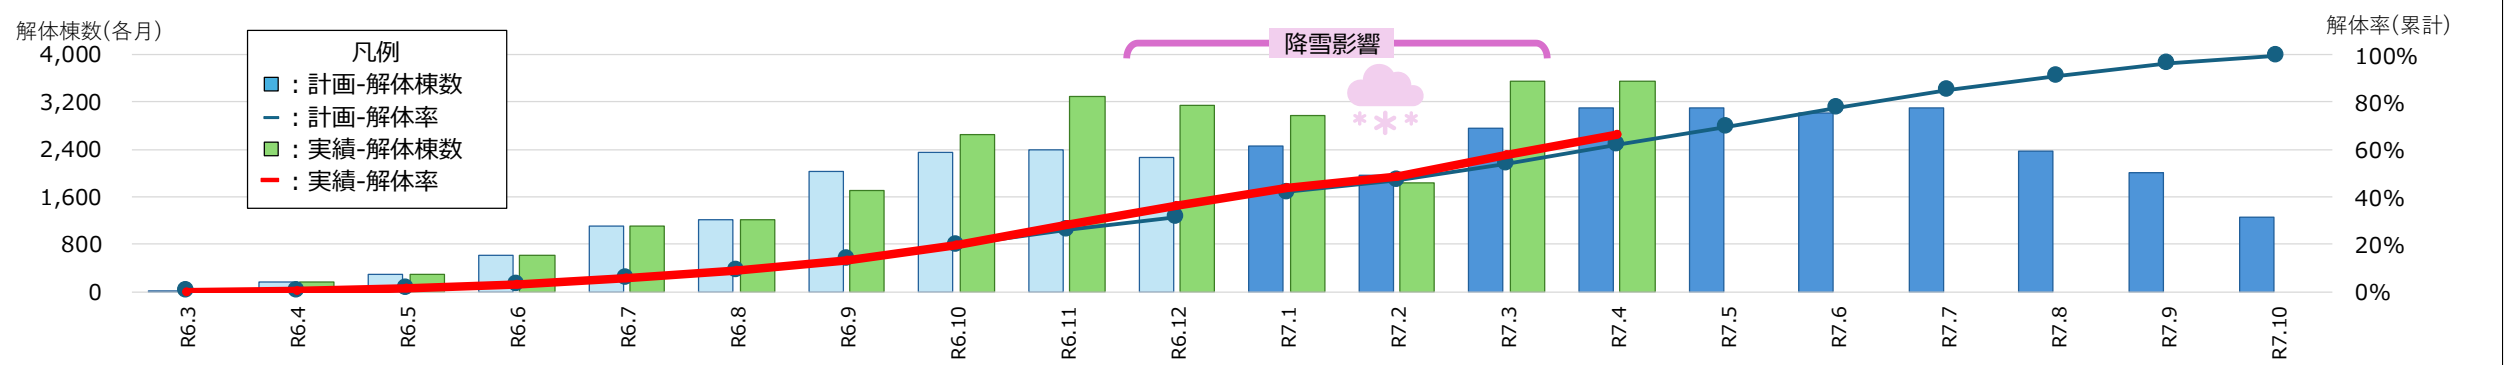

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の状況（令和 7 年 4 月末）



市町	解体見込棟数 【R7.1】A	申請棟数 B	完了棟数 C				見込棟数あたり 解体率 C ÷ A	申請棟数あたり 解体率 C ÷ B
				公費解体	緊急解体	自費解体		
珠州市	8,023 〔43〕	7,873 〔44〕	5,955 〔2〕	5,806 〔2〕	111 〔0〕	38 〔0〕	74.2% 〔4.7%〕	75.6% 〔4.5%〕
輪島市	11,267 〔276〕	11,699 〔167〕	7,713 〔0〕	7,446 〔0〕	229 〔0〕	38 〔0〕	68.5% 〔0.0%〕	65.9% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	4,014 〔14〕	2,415 〔3〕	2,363 〔3〕	2 〔0〕	50 〔0〕	61.1% 〔18.8%〕	60.2% 〔21.4%〕
穴水町	2,703	2,765	2,176	2,145	0	31	80.5%	78.7%
七尾市	5,900	5,517	2,840	2,451	0	389	48.1%	51.5%
志賀町	4,233	4,436	2,910	2,621	9	280	68.7%	65.6%
上記以外の市町	3,158	3,725	2,022	1,622	4	396	64.0%	54.3%
計	39,235 〔335〕	40,029 〔225〕	26,031 〔5〕	24,454 〔5〕	355 〔0〕	1,222 〔0〕	66.3% 〔1.5%〕	65.0% 〔2.2%〕

※令和 6 年能登半島地震及び令和 6 年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和 6 年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

災害廃棄物の処理状況（令和7年3月末・暫定値）




- 発生推計量410万トンの **44.6%**となる **183万トン**の処理が完了
- 3月単月 計画：25万トン 実績：23万トン 達成率：93%
- 3月末累計 計画:172万トン 実績:183万トン 達成率:106%

3月単月では、民間のコンクリートが
処理施設での受入抑制により、仮置
場からの搬出が滞り、計画を下回った。
累計では、計画を上回った。

(単位：千トン)

		R6.1	R6.2	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
処分計画※	解体ごみの推計発生量（各月）	2			17	31	64	116	126	178	278	344	327	256	205	291	328	328	318	327	251	212	132					
	①処理量（各月）	3	14	19	21	29	43	115	116	143	190	222	219	160	177	249	261	273	249	273	261	261	273	259	221	29	14	8
	②　　〃　　（累計）	3	17	35	56	85	129	244	360	503	693	914	1,133	1,293	1,470	1,719	1,980	2,252	2,501	2,773	3,034	3,294	3,567	3,826	4,047	4,076	4,090	4,098
	処理率（累計）	0.07%	0.40%	0.86%	1.4%	2.1%	3.1%	6.0%	8.8%	12%	17%	22%	28%	32%	36%	42%	48%	55%	61%	68%	74%	80%	87%	93%	99%	99%	99%	100%
処分実績	③処理実績（各月）	4	14	19	22	29	44	118	120	149	197	236	234	223	186	232												
	④　　〃　　（累計）	4	18	37	58	88	131	249	369	519	716	952	1,186	1,408	1,594	1,826												
	処理率（発生推計量あたり）	0.09%	0.43%	0.89%	1.4%	2.1%	3.2%	6.1%	9.0%	12.7%	17.5%	23.2%	28.9%	34.4%	38.9%	44.6%												
	計画達成率（各月） （③÷①）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	139%	105%	93%												
	計画達成率（累計） （④÷②）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	109%	108%	106%												

※ 加速化プラン【R7.1改定】

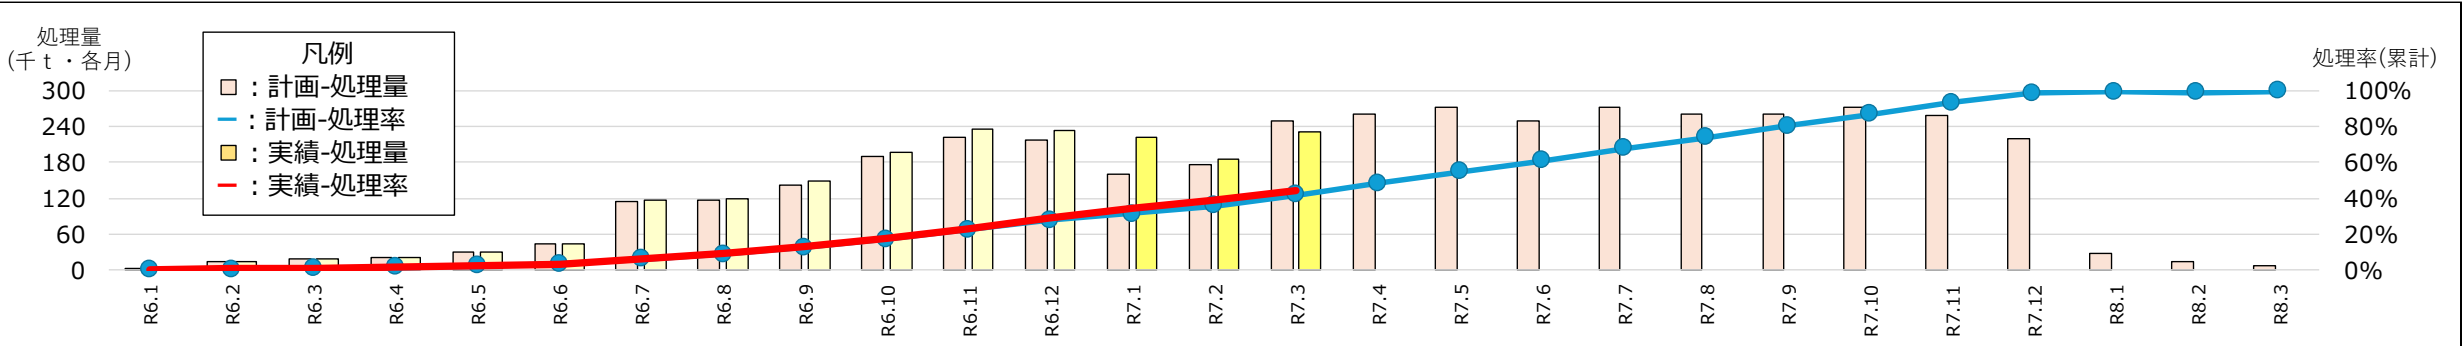

※ 令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計 ※ 処分実績は、最新の集計値を使用

市町別の災害廃棄物の処理状況（令和7年3月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 A	処理量 B	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	処理率 B ÷ A
珠洲市	858	474 (100%)	54 (11.3%)	59 (12.4%)	209 (44.0%)	8 (1.6%)	145 (30.6%)	0 (0.0%)	55.2%
輪島市	1,132	550 (100%)	53 (9.6%)	72 (13.2%)	231 (42.1%)	14 (2.5%)	180 (32.7%)	0 (0.0%)	48.6%
能登町	411	165 (100%)	12 (7.2%)	36 (21.9%)	54 (32.6%)	4 (2.2%)	60 (36.1%)	0 (0.0%)	40.1%
穴水町	278	172 (100%)	18 (10.6%)	23 (13.6%)	90 (52.2%)	3 (1.9%)	37 (21.6%)	0 (0.0%)	61.8%
七尾市	632	193 (100%)	20 (10.2%)	36 (18.6%)	70 (36.4%)	4 (2.1%)	63 (32.8%)	0 (0.0%)	30.6%
志賀町	502	150 (100%)	7 (4.6%)	33 (21.6%)	71 (47.2%)	2 (1.5%)	38 (25.0%)	0 (0.0%)	29.9%
上記以外の市 町	283.7	121.7 (100%)	6.1 (5.0%)	22.0 (18.1%)	35.0 (28.7%)	2.4 (2.0%)	56.1 (46.1%)	0.1 (0.1%)	42.9%
合 計	4,098	1,826 (100%)	169 (9.3%)	281 (15.4%)	760 (41.6%)	37 (2.0%)	579 (31.7%)	0 (0.0%)	44.6%

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計で処理量に自費解体分は含まない、（ ）内は、種類ごとの割合、「その他」は、蛍光灯など
