


石川県における断水の解消見込み

(2月29日時点)

- : 断水が4月以降に解消する見込みの地域
- : 断水が3月末までに解消する見込みの地域
- : 断水が3月中旬までに解消する見込みの地域

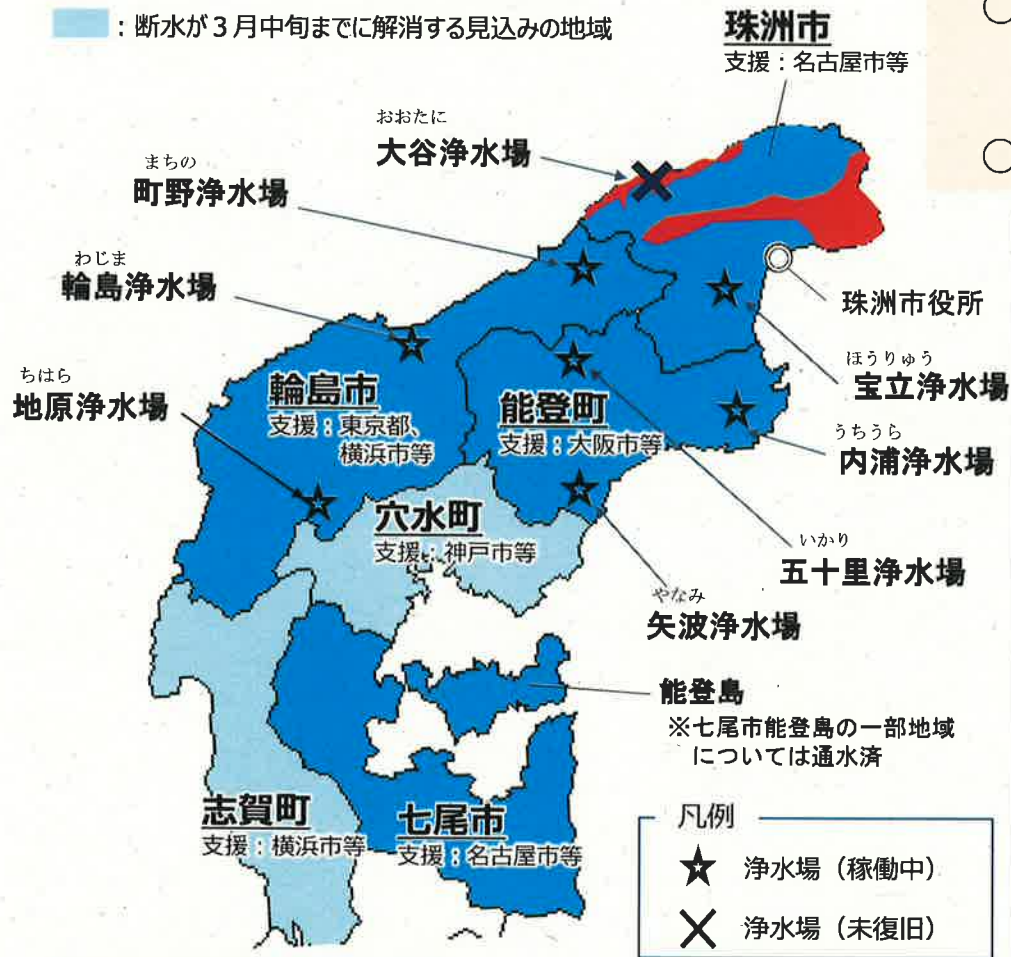

断水状況については、

○ 2月末で約8割 (83.2%) が解消済

断水解消戸数/最大断水戸数
= 約94,020戸/約113,020戸=83.2%

○ 3月末には、ほぼ全域で解消が見込まれる。

※1 輪島市	2月末～3月末
※1 珠洲市	2月末以降順次 (一部地域は4月以降)
※2 穴水町	2月中旬～3月上旬
※3 能登町	2月中旬～3月下旬
※4 七尾市	2月末～3月末
※5 志賀町	2月末 (一部地域は3月上旬)

※1 : 石川県公表資料 (1月27日) ※2 : 穴水町公表資料 (2月28日)
 ※3 : 能登町公表資料 (2月27日) ※4 : 七尾市公表資料 (2月27日)
 ※5 : 石川県からの聞き取り (2月28日)

前回からの修正点

- 能登町 : 漏水調査の結果、新たに基幹管路等の断裂・損壊が確認されたため、「3月中旬」⇒「3月下旬」
- 七尾市 : 水道の復旧が進んだ結果、「一部地域は4月以降」⇒「3月末」
- 志賀町 : 水道の復旧が進んだ結果、「一部地域は3月末」⇒「一部地域は3月上旬」

※ 断水解消率は、第1回復旧・復興支援本部 (2月1日) : 63.4%、第2回復旧・復興支援本部 (2月16日) : 73.6% 17
