


公費解体の進捗状況（令和6年8月末）

R6.9.6

➤解体見込み棟数32,410棟の約1割である3,396棟の解体が完了した。
 ➤令和6年8月末までの解体計画 3,396棟に対し、達成率は100.0%であった。

| | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | R6.10 | R6.11 | R6.12 | R7.1 | R7.2 | R7.3 | R7.4 | R7.5 | R7.6 | R7.7 | R7.8 | R7.9 | R7.10 | |
|------|--------------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 解体計画 | 解体班数※ | 8 | 56 | 120 | 291 | 601 | 650 | 950 | 1,060 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,000 | 1,000 | 750 | 486 |
| | 解体棟数（各月）※ | 15 | 163 | 288 | 610 | 1,112 | 1,208 | 2,036 | 2,348 | 2,400 | 2,265 | 1,969 | 1,841 | 2,315 | 2,392 | 2,392 | 2,315 | 2,213 | 1,859 | 1,593 | 1,076 |
| | 〃（累計）※ | 15 | 178 | 466 | 1,076 | 2,188 | 3,396 | 5,432 | 7,780 | 10,180 | 12,445 | 14,414 | 16,255 | 18,570 | 20,962 | 23,354 | 25,669 | 27,882 | 29,741 | 31,334 | 32,410 |
| | 解体率（累計）※ | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 3.3% | 6.8% | 10.5% | 16.8% | 24.0% | 31.4% | 38.4% | 44.5% | 50.2% | 57.3% | 64.7% | 72.1% | 79.2% | 86.0% | 91.8% | 96.7% | 100% |
| 解体実績 | 解体棟数（各月） | 15 | 163 | 288 | 610 | 1,112 | 1,208 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 〃（累計） | 15 | 178 | 466 | 1,076 | 2,188 | 3,396 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 解体率（計画棟数あたり） | 0.0% | 0.5% | 1.4% | 3.3% | 6.8% | 10.5% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画達成率 | — | — | — | — | — | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | |

※R6.3～R6.7は実績を記載。自費解体・緊急解体の棟数を含む

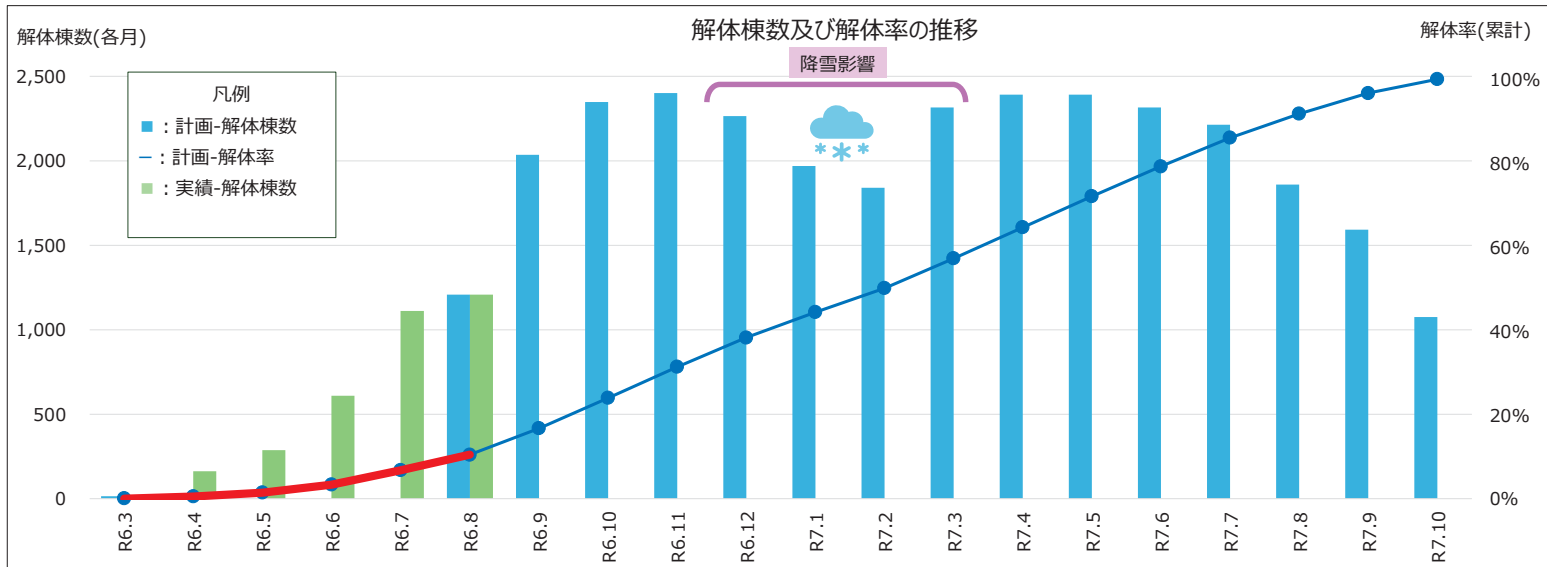

市町別公費解体の状況（令和6年8月末）について

| 市町 | 解体見込棟数※ (R6.8) A | 申請棟数※ | 着手棟数※ | 完了棟数 B | 公費解体 | | | 解体率 B÷A |
|-----|---------------------|--------|--------|-----------|-------|------|------|------------|
| | | | | | 公費解体 | 緊急解体 | 自費解体 | |
| 珠洲市 | 7,195 | 5,981 | 2,036 | 1,203 | 1,090 | 106 | 7 | 16.7% |
| 輪島市 | 9,685 | 8,736 | 2,906 | 552 | 331 | 204 | 17 | 5.7% |
| 能登町 | 2,759 | 2,442 | 985 | 260 | 249 | 2 | 9 | 9.4% |
| 穴水町 | 2,451 | 2,314 | 895 | 450 | 440 | 0 | 10 | 18.4% |
| 七尾市 | 3,500 | 3,276 | 1,184 | 252 | 121 | 0 | 131 | 7.2% |
| 志賀町 | 4,012 | 3,259 | 1,236 | 286 | 153 | 9 | 124 | 7.1% |
| その他 | 2,808 | 2,192 | 907 | 393 | 216 | 4 | 173 | 14.0% |
| 合計 | 32,410 | 28,200 | 10,149 | 3,396 | 2,600 | 325 | 471 | 10.5% |

解体完了は、家屋等の解体が終了したものを示す。

ただし、珠洲市、能登町及び七尾市は、解体完了後の所有者との立会を終えた棟数を示す。

※ 緊急解体・自費解体を含む
