令和６年能登半島地震・奥能登豪雨災害復旧工事

第５回情報連絡会議

日時：令和８年１０月１６日（金）１４：３０～１６：００
場所：ＷＥＢ会議

次　　第

１　開　会

２　挨拶

３　議事

（議題１）復旧復興の工事の進捗状況について
- 国土交通省北陸地方整備局
- 農林水産省北陸農政局
- 林野庁石川森林管理署
- 水産庁漁港漁場整備部
- 石川県土木部
- 石川県農林水産部
- 関係市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町）

（議題２）円滑な施工確保対策について
- 国土交通省北陸地方整備局
- 石川県土木部

（議題３）建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題について
- 国土交通省北陸地方整備局

（議題４）関係機関が抱える課題について
- （一社）石川県建設業協会

４　閉会

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害復旧工事　（別紙）
第5回情報連絡会議　出席者名簿

機関名	所属名	役職	氏名	備考
北陸地方整備局	企画部	部長	越智　英人	
北陸地方整備局	企画部	技術調整管理官	澤山　雅則	
北陸地方整備局	企画部	技術開発調整官	山路　広明	
北陸地方整備局	港湾空港部	部長	福元　正武	(代理)港湾空港企画官　庄司　義明
北陸地方整備局	港湾空港部	事業計画官	廣木　智秀	
北陸地方整備局	金沢河川国道事務所	所長	五十川　泰史	
北陸地方整備局	能登復興事務所	所長	北出　一雅	
北陸地方整備局	金沢港湾・空港整備事務所	所長	渡邉　理之	
北陸地方整備局	能登港湾空港復興推進室	室長	谷 拓歩	
北陸農政局	農村振興部	部長	糸賀　信之	
北陸農政局	農村振興部	地方参事官	小林　孝至	
北陸農政局	土地改良技術事務所	所長	佐々木　一郎	
近畿中国森林管理局	石川森林管理署 奥能登地区山地災害復旧対策室	室長	立澤　和実	(代理)石川森林管理署 次長　吉岡　亨
水産庁	漁港漁場整備部事業課	課長	中村　克彦	
石川県	土木部	部長	木村　康博	
石川県	土木部	次長(土木担当)	小寺　基	
石川県	土木部監理課技術管理室	室長	大井　秀紀	
石川県	土木部道路建設課	担当課長	福村　宗宏	
石川県	土木部道路整備課	担当課長	石川　敏充	
石川県	土木部河川課	担当課長	村本　信夫	
石川県	土木部砂防課	課参事	塚本　賢明	
石川県	土木部港湾課	課参事	岡田　卓馬	
石川県	中能登土木総合事務所	所長	高橋　雅憲	欠席
石川県	中能登土木総合事務所	次長	南野　延男	
石川県	中能登土木総合事務所	次長	高田　充伯	
石川県	中能登土木総合事務所羽咋土木事務所	地域調整担当次長	村上　正浩	
石川県	奥能登土木総合事務所	所長	能登　茂和	
石川県	奥能登土木総合事務所	輪島事業調整室長	前田　輝也	
石川県	奥能登土木総合事務所	鳳輪事業調整室長	田中　清二	
石川県	奥能登土木総合事務所	珠洲事業調整室長	向　厚臣	
石川県	七尾港湾事務所	次長	野口　真	
石川県	農林水産部	部長	松本　博樹	(代理)参事　由谷　倫也
石川県	農林水産部農業経営戦略課技術管理室	室長	小坂　昇弘	
石川県	中能登農林総合事務所	所長	池田　俊文	(代理)工事管理担当課長　和田克彦
石川県	奥能登農林総合事務所	所長	葛城　正浩	(代理)工事管理担当課長　片平 兼久 工事管理担当課長　中橋 晃博
七尾市	土木課	課長	横山　暁史	
七尾市	農林水産課	課長	佐々木　公酉	
輪島市	土木課	課長	登岸　浩	
輪島市	農林水産課	参事	宮腰　誠一郎	
珠洲市	環境建設課	課長	大宮　準司	(代理)参事　川角　正幸
珠洲市	産業振興課 農林水産復旧推進室	室長	川口　宗平	
志賀町	まち整備課	参事	茶畑　勝昭	
志賀町	農林水産課	課長	細川　直樹	
穴水町	地域整備課	課長	橋本　樹慶	
能登町	建設水道課	課長補佐	大平　哲也	
能登町	農林水産課	課長補佐	二又　敏晴	
建設産業団体	(一社)石川県建設業協会	副会長	中市　勝也	
建設産業団体	(一社)鳳輪建設業協会	会長	池崎　義典	(代理)専務理事　長坂　幸喜
建設産業団体	(一社)珠洲建設業協会	副会長	山下　寿成	
建設産業団体	(一社)七尾鹿島建設業協会	会長	田村　行利	欠席
建設産業団体	(一社)羽咋郡市建設業協会	会長	南　哲郎	
建設産業団体	(一社)石川県舗装業協会	会長	北川　隆明	欠席
建設産業団体	(一社)石川県造園緑化建設協会法面部会	部会長	谷口　和男	
建設産業団体	石川県管工事業協同組合連合会	事務局長	木越　龍雄	
建設産業団体	石川県港湾漁港建設協会	会長	鶴山　雄一	
建設産業団体	石川県森林土木協会	専務理事	米田　保宏	
事務局	石川県土木部監理課技術管理室	技術指導GL	神崎　充徳	
事務局	農林水産部農業経営戦略課技術管理室	担当課長	井関　忠則	
事務局	農林水産部農業経営戦略課技術管理室	主幹	吉野　礼志	
会議出席者　計			59　人	

令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨災害復旧工事

情報連絡会議　規約

（設　置）
第１条　令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨により被災した公共土木施設などの災害復旧工事を円滑に進めるため、関係者間において情報共有を図ることを目的とする。

（業　務）
第２条　会議では、次に掲げることについての情報共有等を行う。
（１）災害復旧工事に関する発注計画の共有
（２）建設産業の課題の共有
（３）被災地域における建設資機材や労働力の確保に関する現状の課題共有
（４）その他、当該会議で必要と認める事項

（組　織）
第３条　会議は、国土交通省北陸地方整備局及び石川県で主催する。
２　構成員は別表に掲げるとおりとする。

（役　員）
第４条　本会議に、次の役員を置く。
議　長　１名
副議長　１名

（役員の選任）
第５条　議長は、石川県土木部長をもって充てる。
２　副議長は、国土交通省北陸地方整備局企画部長をもって充てる。

（役員の職務）
第６条　議長は、本会議の会務を統括する。
２　副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるといはその職務を代行する。

（会議の開催）
第７条　会議は、必要に応じ開催する。

（事務局）
第８条　会議の事務局は、石川県土木部監理課技術管理室、農林水産部農業経営戦略課技術管理室に置く。

（雑　則）
第９条　この規約に定めるほか、会議の運営に必要な事項は、会議において定める。

附　則
この規約は、令和６年６月２６日から施行する。
令和７年５月２７日に一部改正する

別表　令和６年能登半島地震・奥能登豪雨災害復旧工事情報連絡会議（案）

構成	構成機関名		役職
構成員	国土交通省	北陸地方整備局　企画部	部長
			技術調整管理官
			技術開発調整官
		北陸地方整備局　港湾空港部	部長
			事業計画官
		金沢河川国道事務所	所長
		能登復興事務所	所長
		金沢港湾・空港整備事務所	所長
		能登港湾空港復興推進室	室長
	農林水産省	北陸農政局　農村振興部	部長
			地方参事官
		北陸農政局土地改良技術事務所	所長
		近畿中国森林管理局石川森林管理署 奥能登地区山地災害復旧対策室	室長
		水産庁漁港漁場整備部事業課	課長
	石川県	土木部	部長 復旧復興戦略監 次長（土木担当）
		監理課技術管理室	室長
		農林水産部	部長
		農業経営戦略課技術管理室	室長
		中能登土木総合事務所	所長
		奥能登土木総合事務所	所長
		七尾港湾事務所	所長
		中能登農林総合事務所	所長
		奥能登農林総合事務所	所長
	関係市町	七尾市	土木課長 農林水産課長
		輪島市	土木課長 農林水産課長
		珠洲市	環境建設課長
		志賀町	まち整備課長 農林水産課長
		穴水町	地域整備課長
		能登町	建設水道課長 農林水産課長
	建設産業団体	(一社)石川県建設業協会 (一社)鳳輪建設業協会 (一社)珠洲建設業協会 (一社)七尾鹿島建設業協会 (一社)羽咋郡市建設業協会 (一社)石川県舗装業協会 (一社)石川県造園緑化建設協会　法面部会 石川県管工事業協同組合連合会 石川県港湾漁港建設協会 石川県森林土木協会	会長 会長 会長 会長 会長 会長 部会長 会長 会長
事務局	石川県	土木部監理課技術管理室	
		農林水産部農業経営戦略課技術管理室	

※今後、構成員は必要に応じて追加されることもあり得る。

【議題１】

「復旧復興の工事の進捗状況について」

・北陸地方整備局
・北陸農政局
・石川森林管理署
・水産庁漁港漁場整備部
・石川県

北陸地方整備局

Press Release

国土交通省 北陸地方整備局
能登復興事務所
Noto reconstruction office

記者発表資料
令和8年5月28日
配布:石川県記者クラブ
扱い:配布後解禁

令和6年能登半島地震に伴う
河原田川の復旧工事が完了
～国・県・市による現地立会を実施します～

能登半島地震に伴う土砂崩落により河道埋塞が発生し、上流部で家屋や道路が浸水する被害が発生した河原田川(輪島市熊野町地先)では、権限代行等により、国が河川の災害復旧工事や土砂崩落箇所の法面対策工事を進めてきました。

この度、**河川の災害復旧工事が完成**※したことから、石川県への引き継ぎを行います。併せて、**国、県、市の3者による現地立会を実施**します。

なお、能登復興事務所が災害復旧を実施しているなかでは、当箇所が**最初の完了箇所**となります。

※法面対策工事については引き続き実施中



被災直後の様子（令和6年1月撮影）



復旧状況（令和8年4月撮影）

【問い合わせ先】 ※現地取材をご希望の場合は、当日11:00までに別紙の集合場所にご参集ください。

国土交通省　北陸地方整備局　能登復興事務所
調査課長　江渕(えぶち)　直嗣(なおつぐ)

住所　石川県七尾市神明町ロ12番地2　電話番号　0767-58-3104

能登復興事務所の各種情報はこちらから！

復旧・復興の今を発信	若手職員による現場紹介	現場から見える奥能登の魅力
X	YouTube	Instagram

河原田川(河川)の復旧工事が完了

能登半島地震に伴う土砂崩落により河道埋塞、家屋等の浸水被害が発生した河原田川（輪島市熊野町地先）では、権限代行等により、国が河川の災害復旧工事や崩落箇所の法面対策工事を進めてきました。

この度、**河川の災害復旧工事が完成**※したことから、**5月29日（金）に石川県への引き継ぎを行いました**。

また、**6月2日（火）に、国、県、市の３者による現地立会を実施**しました。

なお、能登復興事務所が災害復旧を実施しているなかで当箇所が**最初の完了箇所**です。

※法面対策工事については引き続き実施中



被災直後の様子（令和6年1月撮影）



復旧状況（令和8年4月撮影）

河原田川(熊野地区)災害復旧工事完了に伴う現地立会

日　時：令和８年６月２日（火）　１１時～１１時３０分
場　所：輪島市熊野町地先　河原田川護岸復旧工事現場
立会者：輪島市長、　県：奥能登土木事務所長、　国：能登復興事務所長


完成写真（R8.5.26撮影）

【県:奥能登土木事務所長】
関係機関でしっかりと連携して進めてまいりたい。

【輪島市長】
河原田川の本復旧第１号は非常にうれしい。
近隣住民は豪雨心配していたので、出水期までに完成できて市民の安全・安心に繋がった。
引き続き国、県の力を借りながら市民の皆さんが安心して暮らせるように工事を進めてまいりたい。

【国:能登復興事務所長】
まだ復旧工事は残っていますので、市民の皆さんが心から安心安全にすごせるように、復興を進めていく決意を新たにしたところ。


左から、能登事務所長、坂口市長、北出事務所長



災害復旧工事の経緯説明

石川県 IshikawaPrefecture

国土交通省 北陸地方整備局
能登復興事務所
Noto reconstruction office

記者発表資料
令和８年９月１１日
配布：石川県記者クラブ
扱い：配布後解禁

震災から約3年、逢坂（ほうさか）トンネルが待望の再開通

○ 令和６年能登半島地震で被災した逢坂トンネルについて、令和８年９月１８日（金）１３時に通行が可能になります。
○ 現在利用している海岸部の緊急復旧道路は、交通切り替え後に通行止めにします。
○ なお、令和９年春以降、工事状況により再び逢坂トンネルを一時通行止めにして、緊急復旧道路に交通切り替えを行う可能性があります。

【問い合わせ先】

○道路管理について
石川県土木部　道路整備課長　吉田（よした）　直司（ただし）
住所　石川県金沢市鞍月1丁目1番地
電話番号　076-225-1726

石川県の情報はこちらから！

○復旧工事について
国土交通省　北陸地方整備局　能登復興事務所　副所長　水道（すいどう）　剣（けん）
住所　石川県七尾市神明町ロ12番地2　NTT七尾ビル3階
電話番号　0767-52-4511（代表）

能登復興事務所の各種情報はこちらから！

復旧・復興の今を発信	若手職員による現場紹介	現場から見える奥能登の魅力
X	YouTube	Instagram

国道249号　逢坂トンネル復旧状況

輪島市側坑口付近

○令和6年能登半島地震により輪島市側坑口上部の斜面崩落が発生しトンネル坑口が完全に閉塞
○大規模崩落した輪島側坑口については、アンカー工等による法面対策を実施









逢坂トンネル内

○トンネル内部は、一部の覆工コンクリートにひび割れ、舗装版のせり上がり等が発生
○内巻補強等により補修・補強を実施






北陸地方整備局（港湾空港部）
（議題１）
復旧復興の工事の進捗状況について

令和6年能登半島地震発生から復旧・復興への取組（和倉港）

- ○ 和倉温泉の護岸等の復旧工事について、延長約2,250mのうち1,283m（**営業再開もしくは予定の旅館の前面の護岸の790m**を含む）が**令和8年6月25日**に完成。引き続き、旅館の再建と歩調を合わせつつ、令和8年度中の可能な限り早期の工事完了を目指す。
- ○ 被災した和倉温泉旅館20軒について、**令和8年7月時点で11軒が営業を再開**。

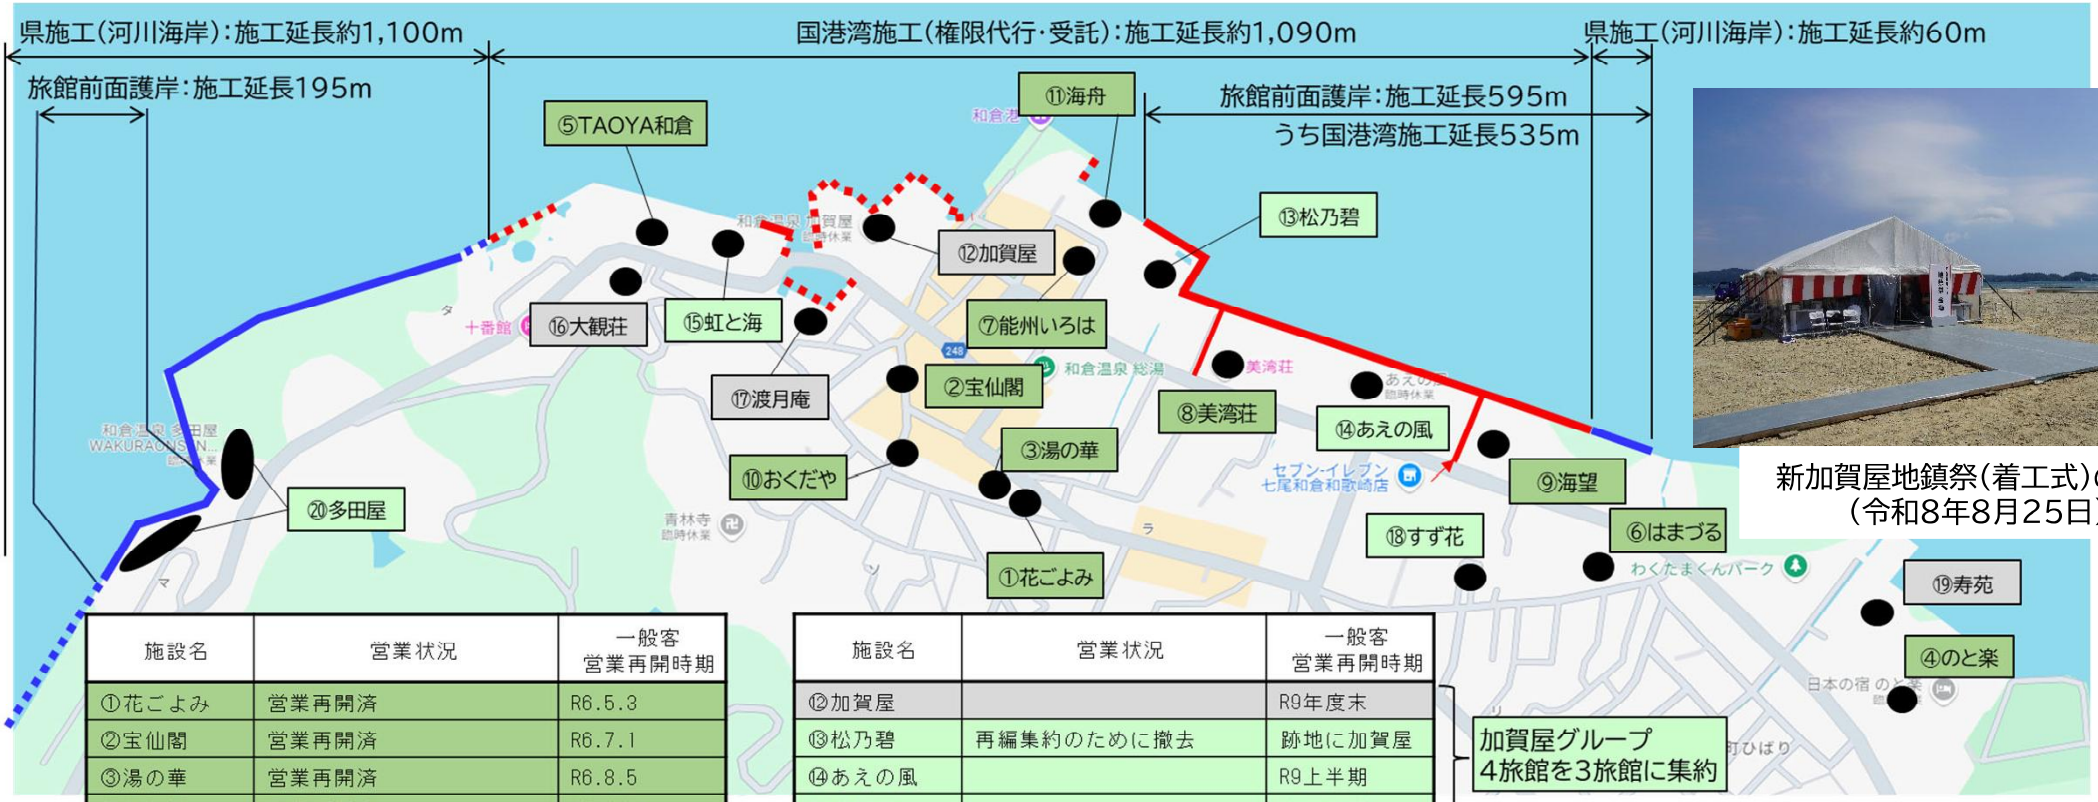

新加賀屋地鎮祭（着工式）の様子
（令和8年8月25日）

施設名	営業状況	一般客営業再開時期
①花ごよみ	営業再開済	R6.5.3
②宝仙閣	営業再開済	R6.7.1
③湯の華	営業再開済	R6.8.5
④のと楽	営業再開済	R6.11.1
⑤TAOYA和倉	営業再開済	R7.4.12
⑥はまづる	営業再開済	R7.8.9
⑦能州いろは	営業再開済	R7.10.1
⑧美湾荘	営業再開済（一部客室のみ）	R7.11.11
⑨海望	営業再開済（一部客室のみ）	R7.12.1
⑩おくだや	営業再開済	R8.7.9
⑪海舟	営業再開済	R8.7.16

施設名	営業状況	一般客営業再開時期
⑫加賀屋		R9年度末
⑬松乃碧	再編集約のために撤去	跡地に加賀屋
⑭あえの風		R9上半期
⑮虹と海		R8下半期
⑯大観荘		未定
⑰渡月庵		未定
⑱すず花		R9上半期
⑲寿苑		未定
⑳多田屋		R10上半期

加賀屋グループ
4旅館を3旅館に集約

※和倉温泉旅館協同組合加盟旅館のみ
※旅館の工事との関係で護岸背後の一部に未施工の箇所あり

凡 例
- ：国港湾施工（権限代行・受託）
- ：県施工（河川海岸）
- ：完成
- ：事業中

※令和8年7月16日時点

令和6年能登半島地震発生から復旧・復興への取組（和倉港）














港湾・海岸・空港の復旧工事で対応頂いている企業

R8.10.1現在

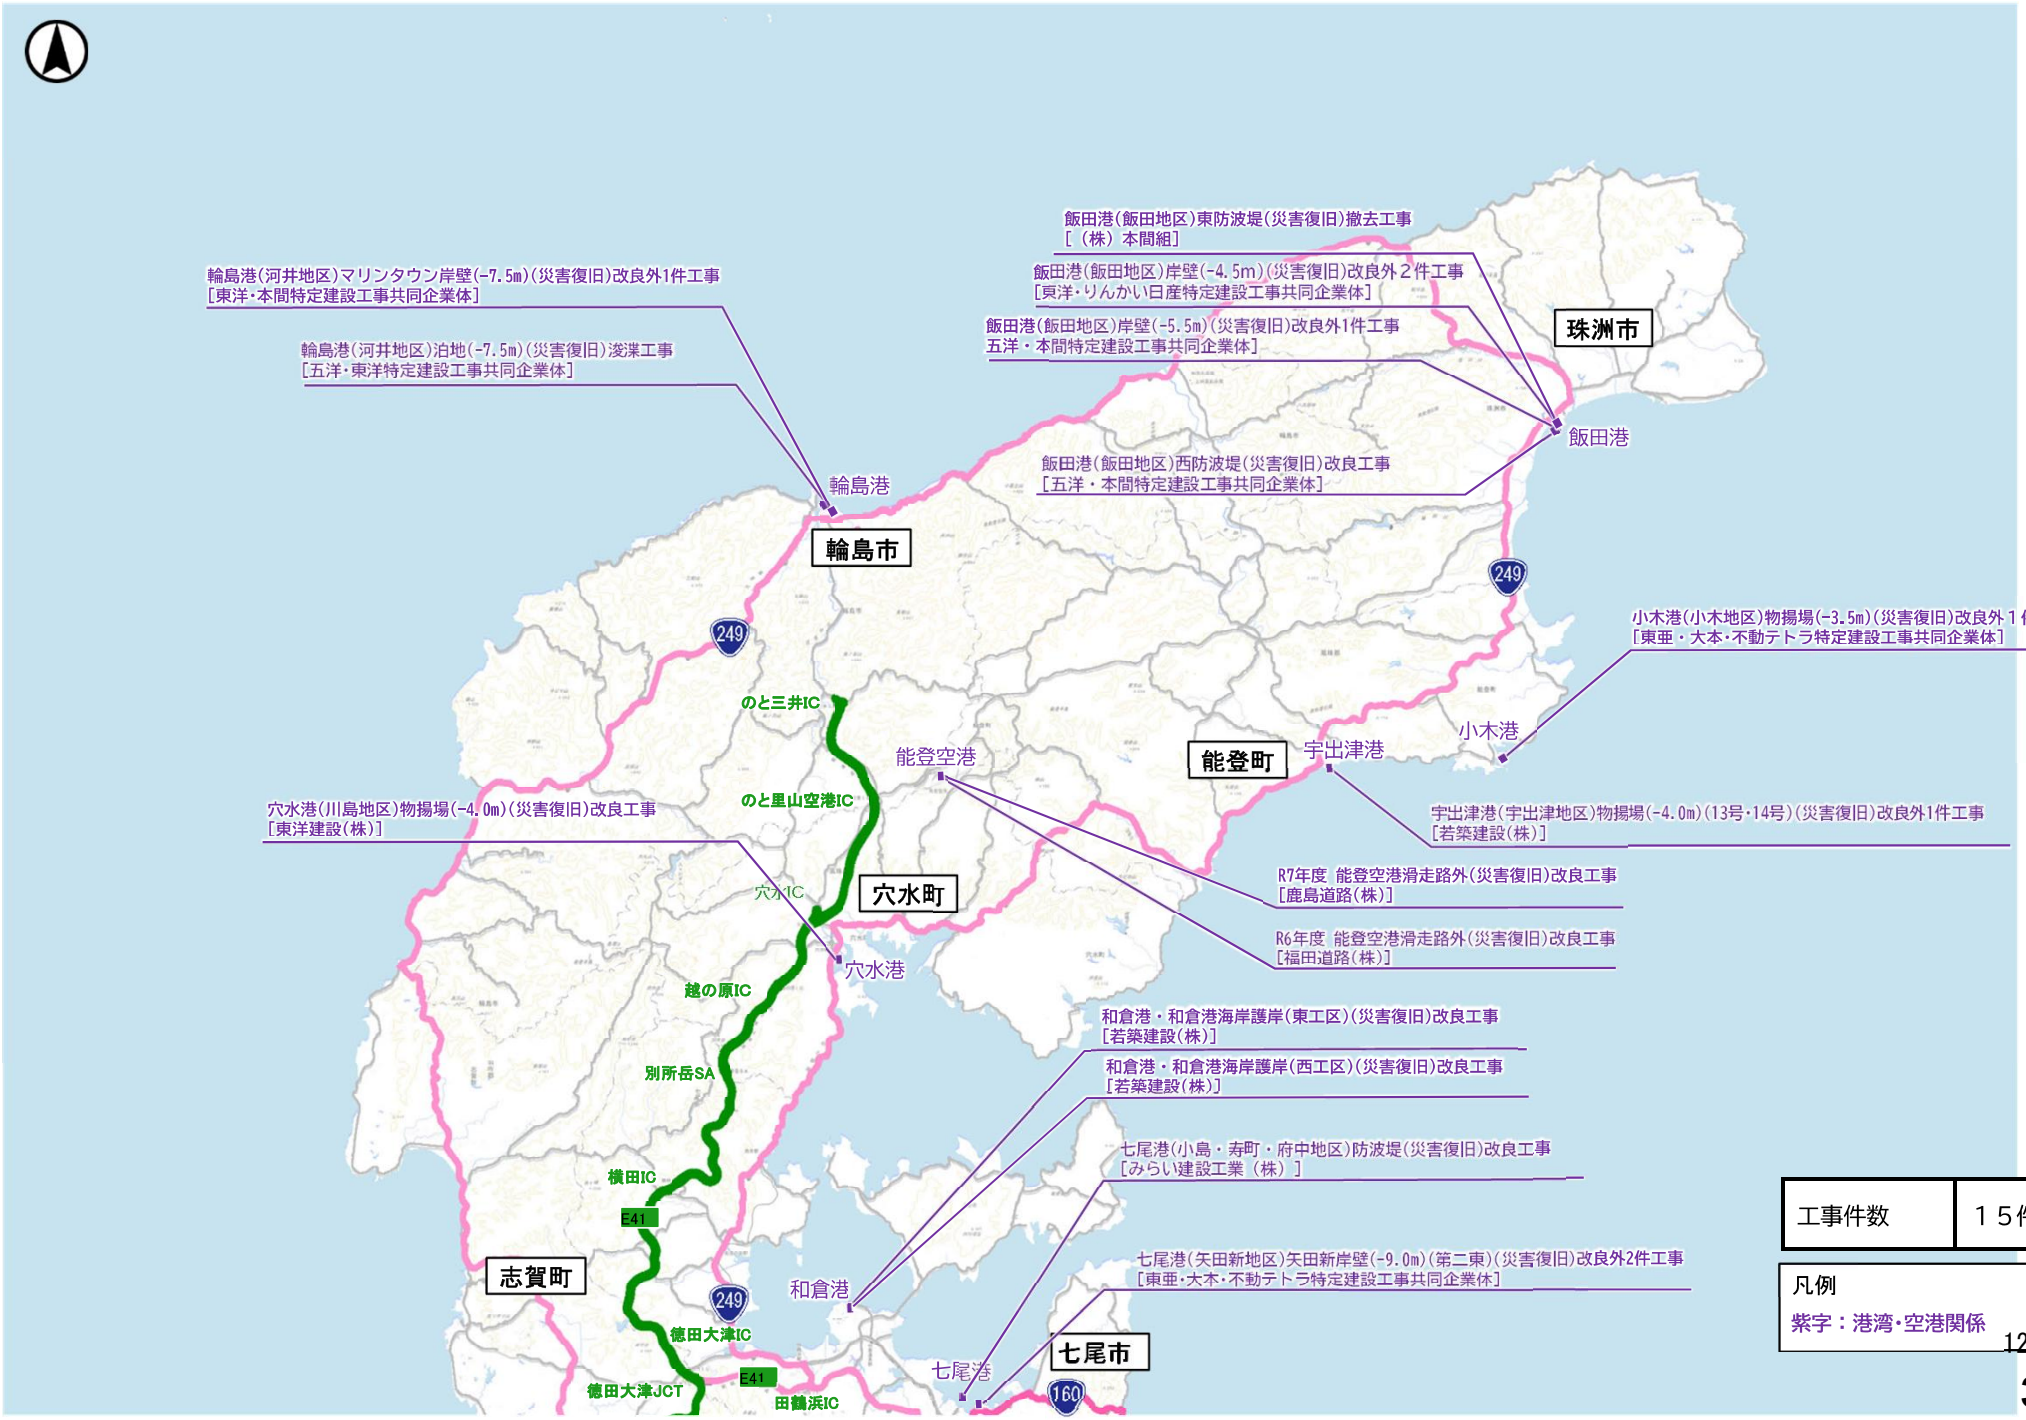

工事件数	１５件

凡例
紫字：港湾・空港関係

令和６年能登半島地震災害復旧工事
第５回情報連絡会議

（議題１）復旧復興の工事の進捗状況

令和８年10月16日

農林水産省　北陸農政局

1　災害状況等

令和６年１月１日に発生した能登半島地震により、石川県内の土地改良施設や農地海岸及び地すべり防止区域に被害が発生いたしました。

北陸農政局は、国営土地改良事業として造成した珠洲第二地区の農業用ダムを直轄災害復旧事業として、また石川県知事からの要請を受けて石川農地海岸地区の７海岸及び輪島市稲舟地区の地すべり防止区域１地区を国が権限代行して災害復旧事業を実施しています。




出典：地理院地図（電子国土Web）を加工して作成


写真①　ダム堤体の亀裂（石川県珠洲市）


写真②　海岸護岸の倒伏（石川県輪島市）



写真③　海岸護岸の倒伏（石川県七尾市）

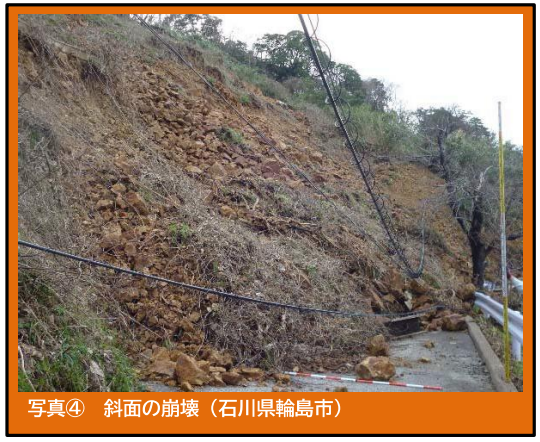
写真④　斜面の崩壊（石川県輪島市）

2　直轄代行　特定災害復旧事業「石川農地海岸地区」（海岸）

農林水産省
北陸農政局

【位置図】

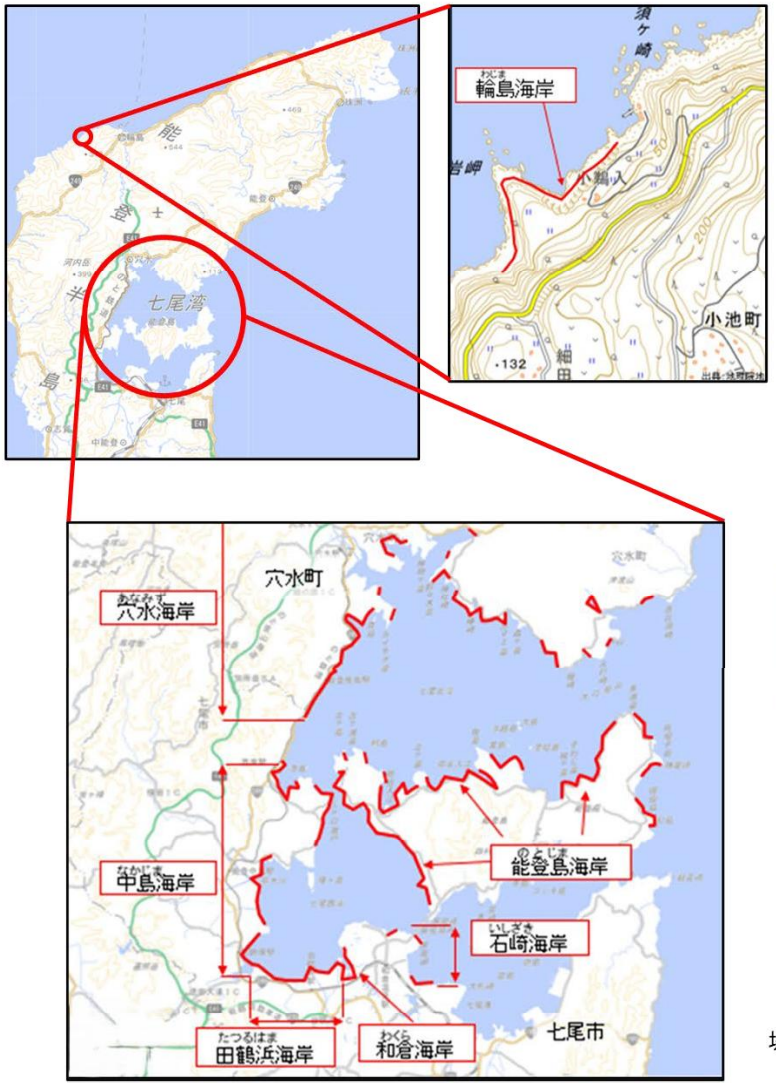

【被災状況写真】



【石崎海岸】
天端の沈下



【和倉海岸】
堤防の傾斜



【田鶴浜海岸】
天端の沈下



【中島海岸】
堤防目地の開き



【能登島海岸】
堤防の倒伏



【穴水海岸】
消波工の沈下



【輪島海岸】
堤防の倒壊及び背後法面の崩壊




法枠復旧工（イメージ）

【復旧概要】

復旧場所	復　旧　工　法　（工種及び数量）	
石崎海岸　（七尾市）	堤防復旧工　L=1,914m	天端復旧工　L=1,607m
和倉海岸　（七尾市）	堤防復旧工　L= 262m	天端復旧工　L= 751m
田鶴浜海岸（七尾市）	堤防復旧工　L=1,866m	天端復旧工　L=2,100m
中島海岸　（七尾市）	堤防復旧工　L=3,581m	天端復旧工　L=3,893m
能登島海岸（七尾市）	堤防復旧工　L=5,277m	天端復旧工　L=9,655m
穴水海岸　（穴水町）	堤防復旧工　L=2,965m	天端復旧工　L=3,001m
輪島海岸　（輪島市）	堤防復旧工　L= 250m	法枠復旧工　A=17,369㎡

【復旧工法（概略図）】

＜施設の被災状況及び復旧工法＞




復旧工法
（全面打ち替え）

復旧工法
（目地補修、コンクリート嵩上げ）

３　直轄代行　特定災害復旧事業「稲舟地区」（地すべり対策）


農林水産省
北陸農政局

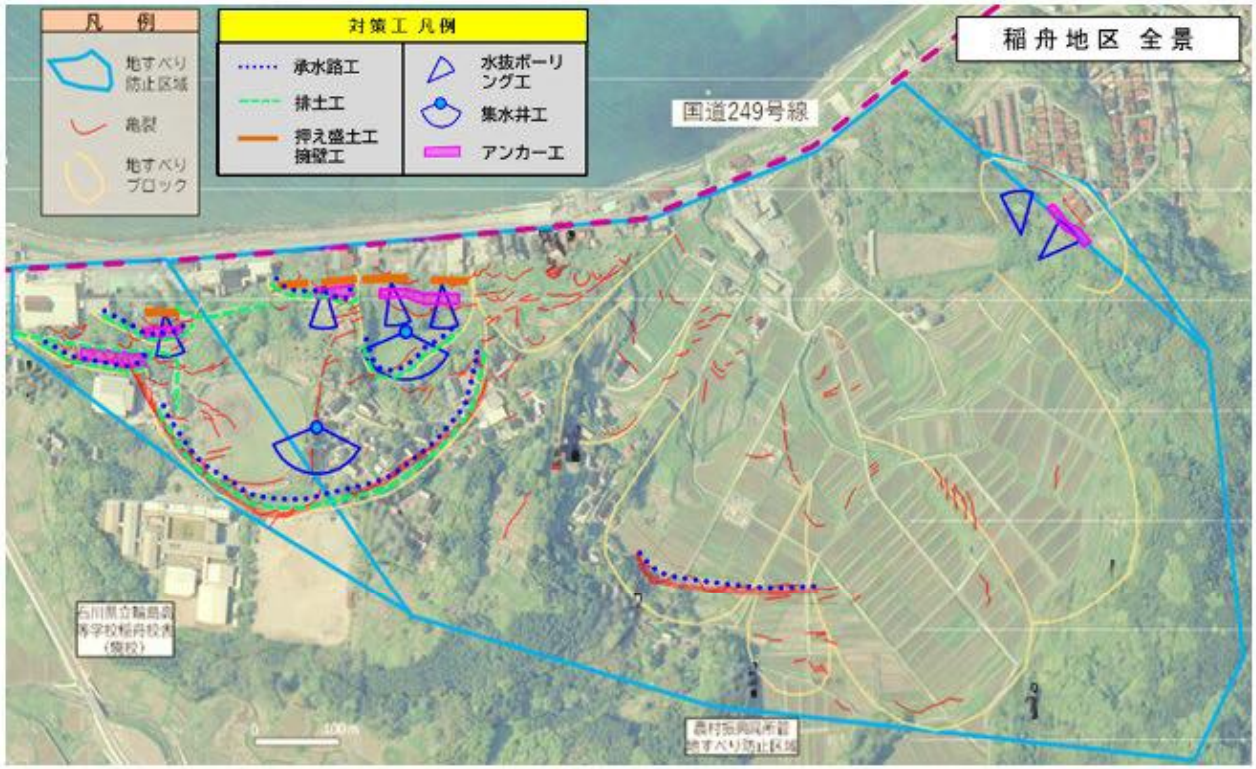



対策概要（想定）

工種		規格	単位	数量
承水路工	抑制工	U-300	m	1,470
排土工	抑制工	掘削・運搬	㎥	1,400
水抜きボーリング	抑制工	φ40, L=50m	本	30
抑え盛土工	抑制工	盛土・転圧	㎥	1,260
集水井工	抑制工	H=40m	基	2
擁壁工	抑止工	フトン籠3段	m	160
アンカー工	抑止工	φ90, L=15m	本	240

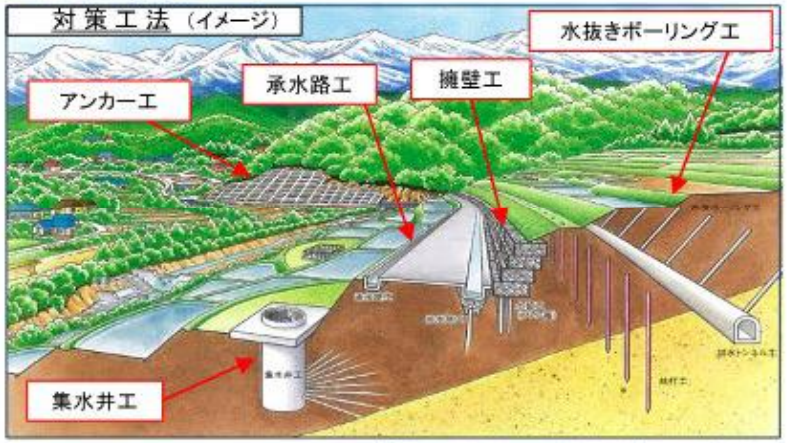

被災状況


農地の亀裂


農地の段差


道路法面崩壊


民家裏斜面崩壊


地盤伸縮計

※令和９年度より
直轄地すべり対策事業に着手予定

４　工事実施計画（完了工事）

【令和６年度完了工事】

工事名	施工場所	工事概要	工期
直轄災害復旧事業　珠洲第二地区 寺家ダム災害復旧工事	珠洲市三崎町地内	堤頂復旧工 　舗装版復旧工　A＝403m2 防護柵復旧工　L＝176m	令和６年８月19日 ～令和７年３月25日
特定災害復旧事業　石川農地海岸地区 能登島海岸（半浦地区）その１堤防復旧工事	七尾市能登島半浦町地内	構造物撤去工　１式 基礎工（資材調達）　１式 仮設工　１式	令和６年12月23日 ～令和７年３月24日

【令和７年度完了工事】

工事名	施工場所	工事概要	工期
特定災害復旧事業　稲舟地区 歌波工区集水井工事	輪島市稲舟町地内	集水井　H=38.5m 　Φ3,500mm　１基 排水ボーリングL-120.0m 　配水管用亜鉛めっき鋼管　Φ100mm 仮設工　１式	令和６年９月10日 ～令和７年11月28日

【令和８年度完了工事】

工事名	施工場所	工事概要	工期
特定災害復旧事業　稲舟地区 地すべり対策その１工事	輪島市稲舟町地内	集水井工 　集水井　H=24.0m、φ3,500mm　１基 　排水ボーリング　φ100mm　L=100.2m 　集水ボーリング　φ40mm　L=250.0m 地表水抜きボーリング工 　VPφ40mm　L=485.0m 仮設工　１式	令和７年７月24日 ～令和８年９月30日

４　工事実施計画（実施中（石川農地海岸地区））

【令和７年度発注～実施中の工事】

工事名	施工場所	工事概要	工期
特定災害復旧事業　石川農地海岸地区 石崎海岸（石崎地区）堤防復旧工事	七尾市石崎町地内	堤防復旧工　Ｌ＝1,108.5m 天端復旧工　L=1,074.4m 目地補修工　1式 仮設工　１式	令和６年12月26日 ～令和９年３月19日
特定災害復旧事業　石川農地海岸地区 能登島海岸（半浦・祖母ケ浦地区）堤防復旧工事	七尾市能登島半浦町及び能登島祖母ケ浦町地内	堤防復旧工　L=1,598.3m 天端復旧工　L=2,261.6m 目地補修工　１式 ひび割れ補修工　１式 仮設工　１式	令和７年９月12日 ～令和９年３月16日
特定災害復旧事業　石川農地海岸地区 穴水海岸（志ケ浦・甲地区）堤防復旧工事	鳳珠郡穴水町志ケ浦及び甲地内	堤防復旧工　L=390.7m 天端復旧工　L=298.6m 仮設工　１式	令和７年９月12日 ～令和９年３月18日
特定災害復旧事業　石川農地海岸地区 田鶴浜海岸（田鶴浜地区）他堤防復旧工事	七尾市田鶴浜町地内、川尻町地内、舟尾町地内、中島町地内及び能登島鰀目町地内	堤防復旧工　L=3,465.8m 天端復旧工　L=2,017.3m 目地補修工　１式 ひび割れ補修工　１式 ひび割れ復旧工　１式 仮設工　１式	令和７年７月24日 ～令和９年３月19日
特定災害復旧事業　石川農地海岸地区 輪島海岸（鵜入地区）復旧その１工事	輪島市輪島市小池町元大屋村鵜入地先	法面復旧工　5,220.2㎡ 仮設工　１式	令和７年12月17日 ～令和９年３月18日


４　工事実施計画（実施中（稲舟地区））

【令和７年度発注～実施中の工事】

工事名	施工場所	工事概要	工期
特定災害復旧事業　稲舟地区 地すべり対策その２工事	輪島市稲舟町地内	アンカーエ　120本 水抜きボーリングエ　L=390m 仮設工　１式	令和７年12月３日 ～令和９年１月29日
特定災害復旧事業　稲舟地区 地すべり対策その３工事	輪島市稲舟町地内	アンカーエ　269本 仮設工　１式	令和７年11月11日 ～令和９年２月26日
特定災害復旧事業　稲舟地区 地すべり対策その４工事	輪島市稲舟町地内	アンカーエ　56本 水抜きボーリングエ　L=270m 地表水抜きボーリングエ　L=650m 仮設工　１式	令和７年12月３日 ～令和９年２月26日
特定災害復旧事業　稲舟地区 地すべり対策その５工事	輪島市稲舟町地内	アンカーエ　26本 土工　500m3	令和７年10月14日 ～令和９年２月26日

4　工事実施計画（４）


【施工位置図：石川農地海岸地区】

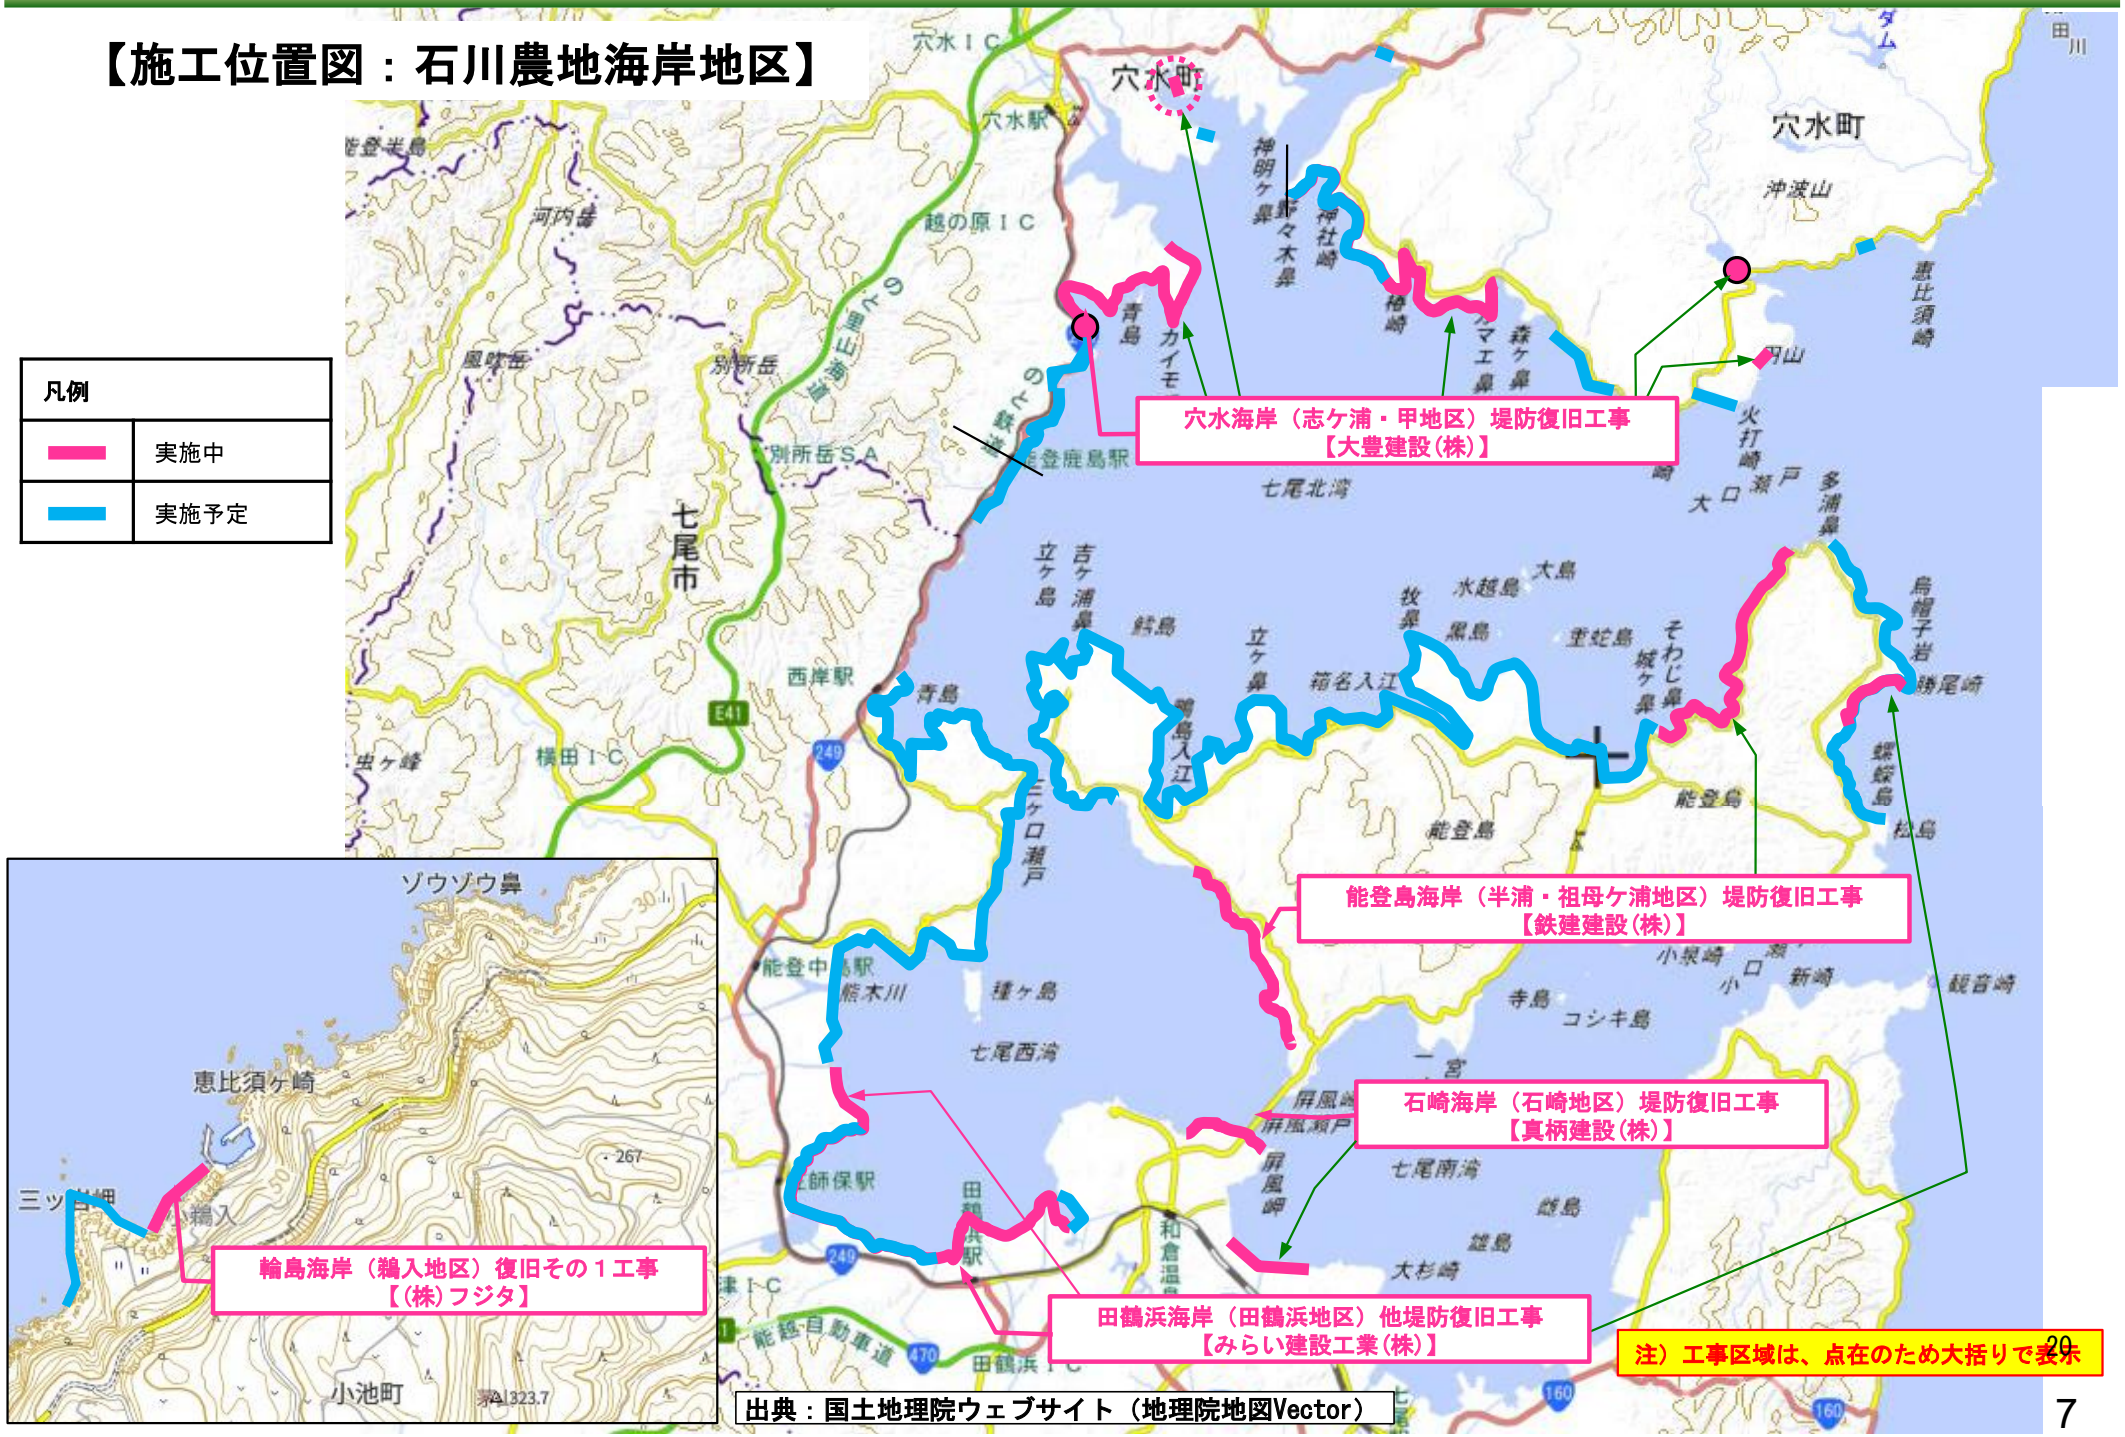

出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図Vector）

５　工事実施計画（５）

【施工位置図：稲舟地区】

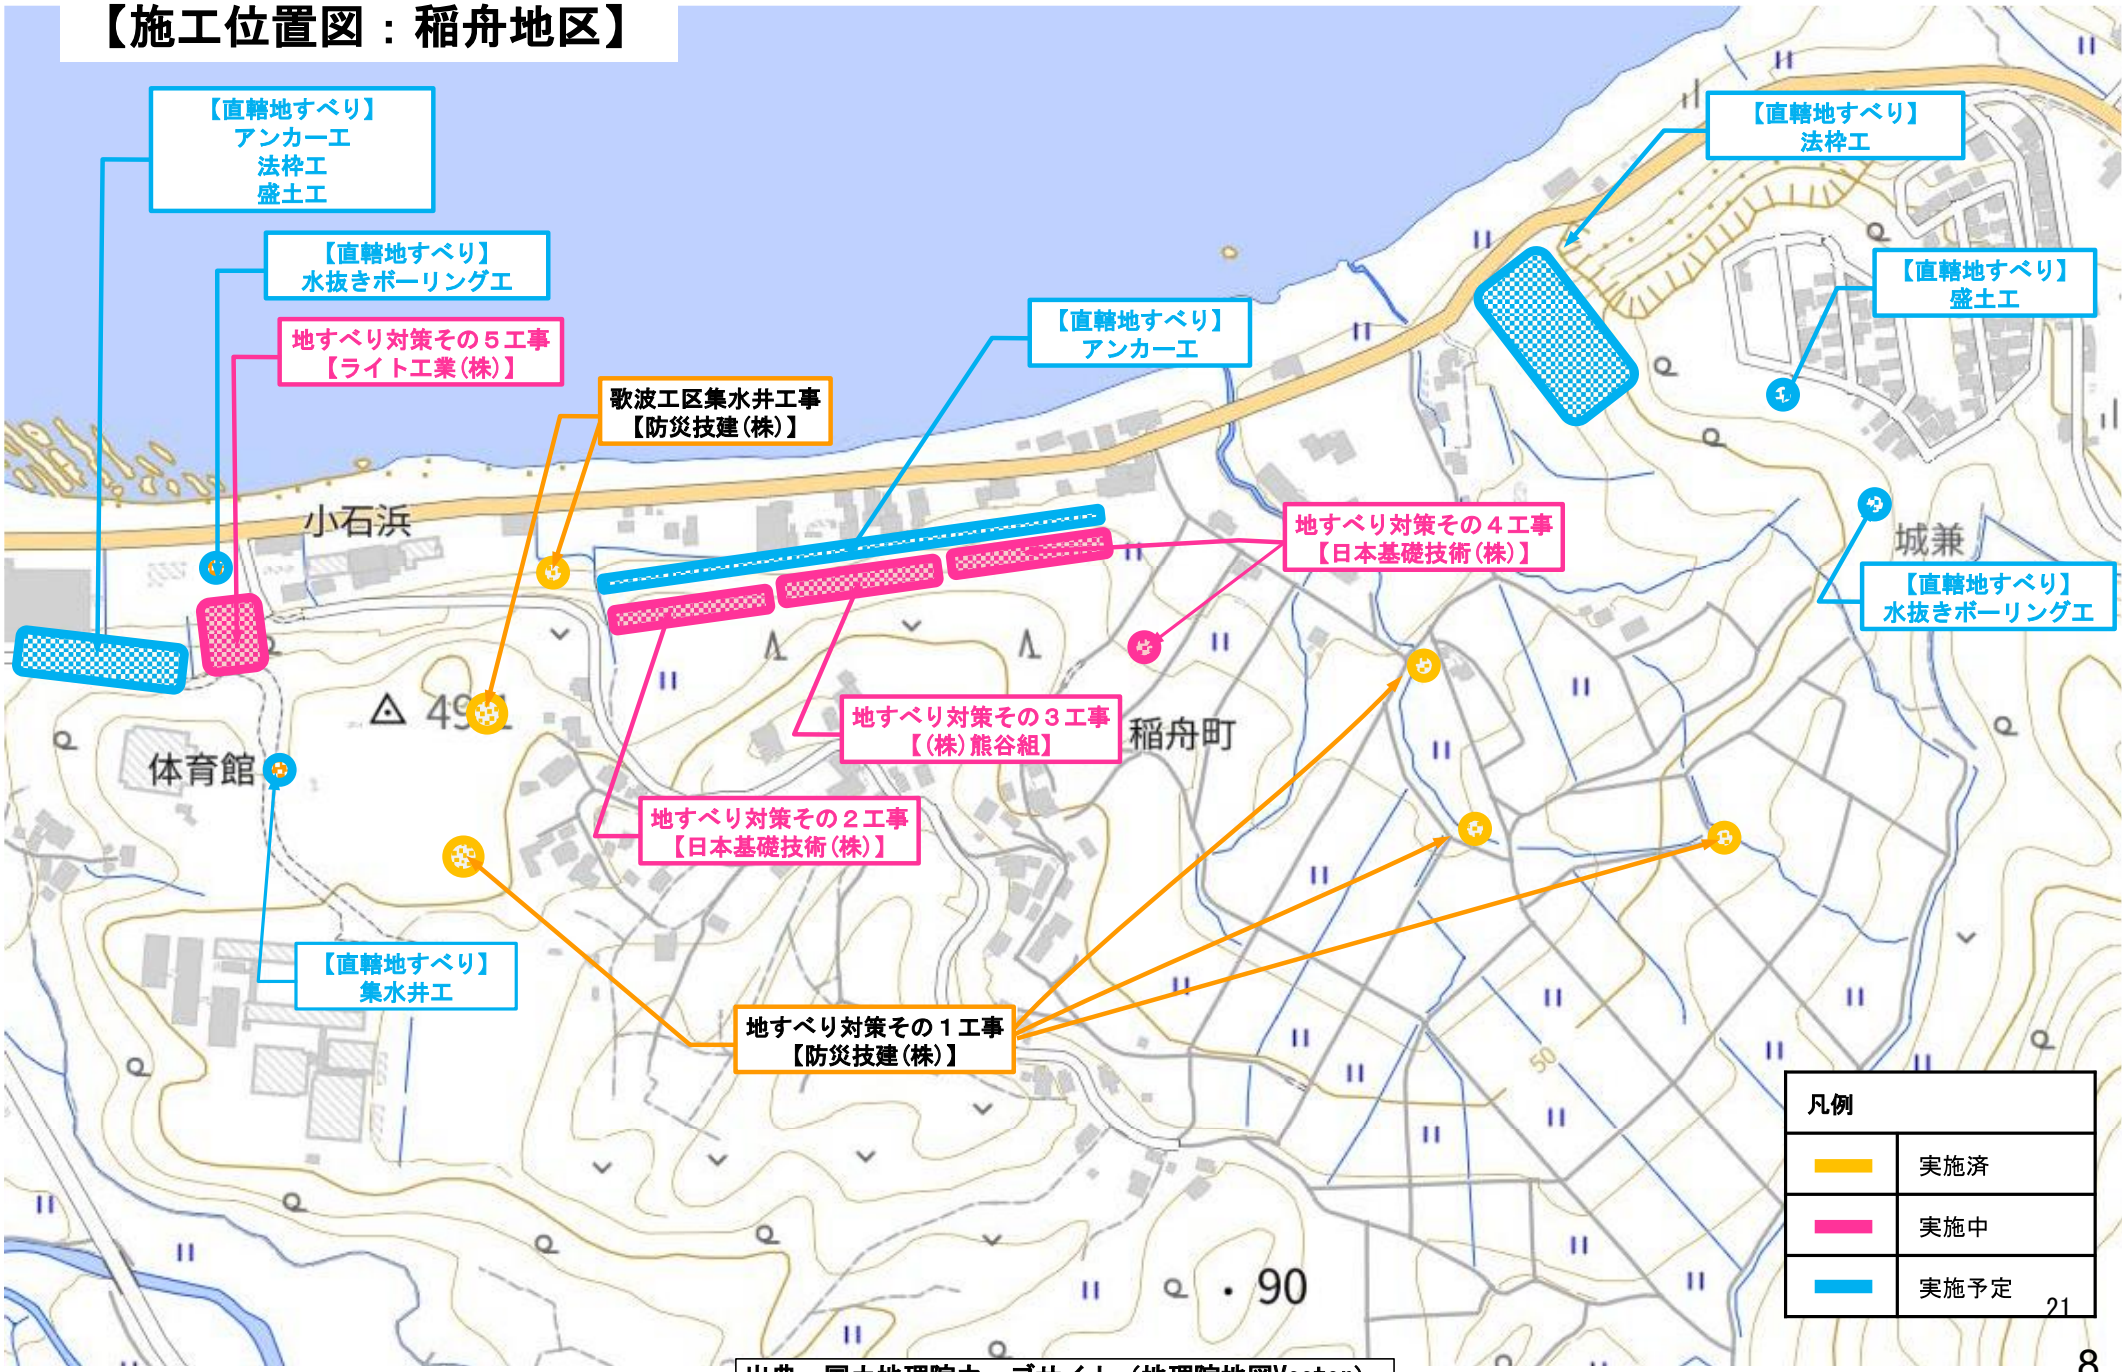

出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図Vector）

（令和8年9月30日現在）


白米千枚田（輪島市白米町）


高市総理大臣現場視察
（令和7年12月7日：珠洲市 大谷区域）


ゴジラ岩（珠洲市馬緤町）


令和6年能登半島地震・奥能登豪雨
民有林直轄治山事業 実施状況
（令和8年度）


輪島市のキリコ祭り


鈴木農林水産大臣現場視察
（令和7年11月1日：輪島市 興徳寺区域）


大谷町鯉のぼりフェス（珠洲市大谷町）

民有林直轄治山事業箇所位置図

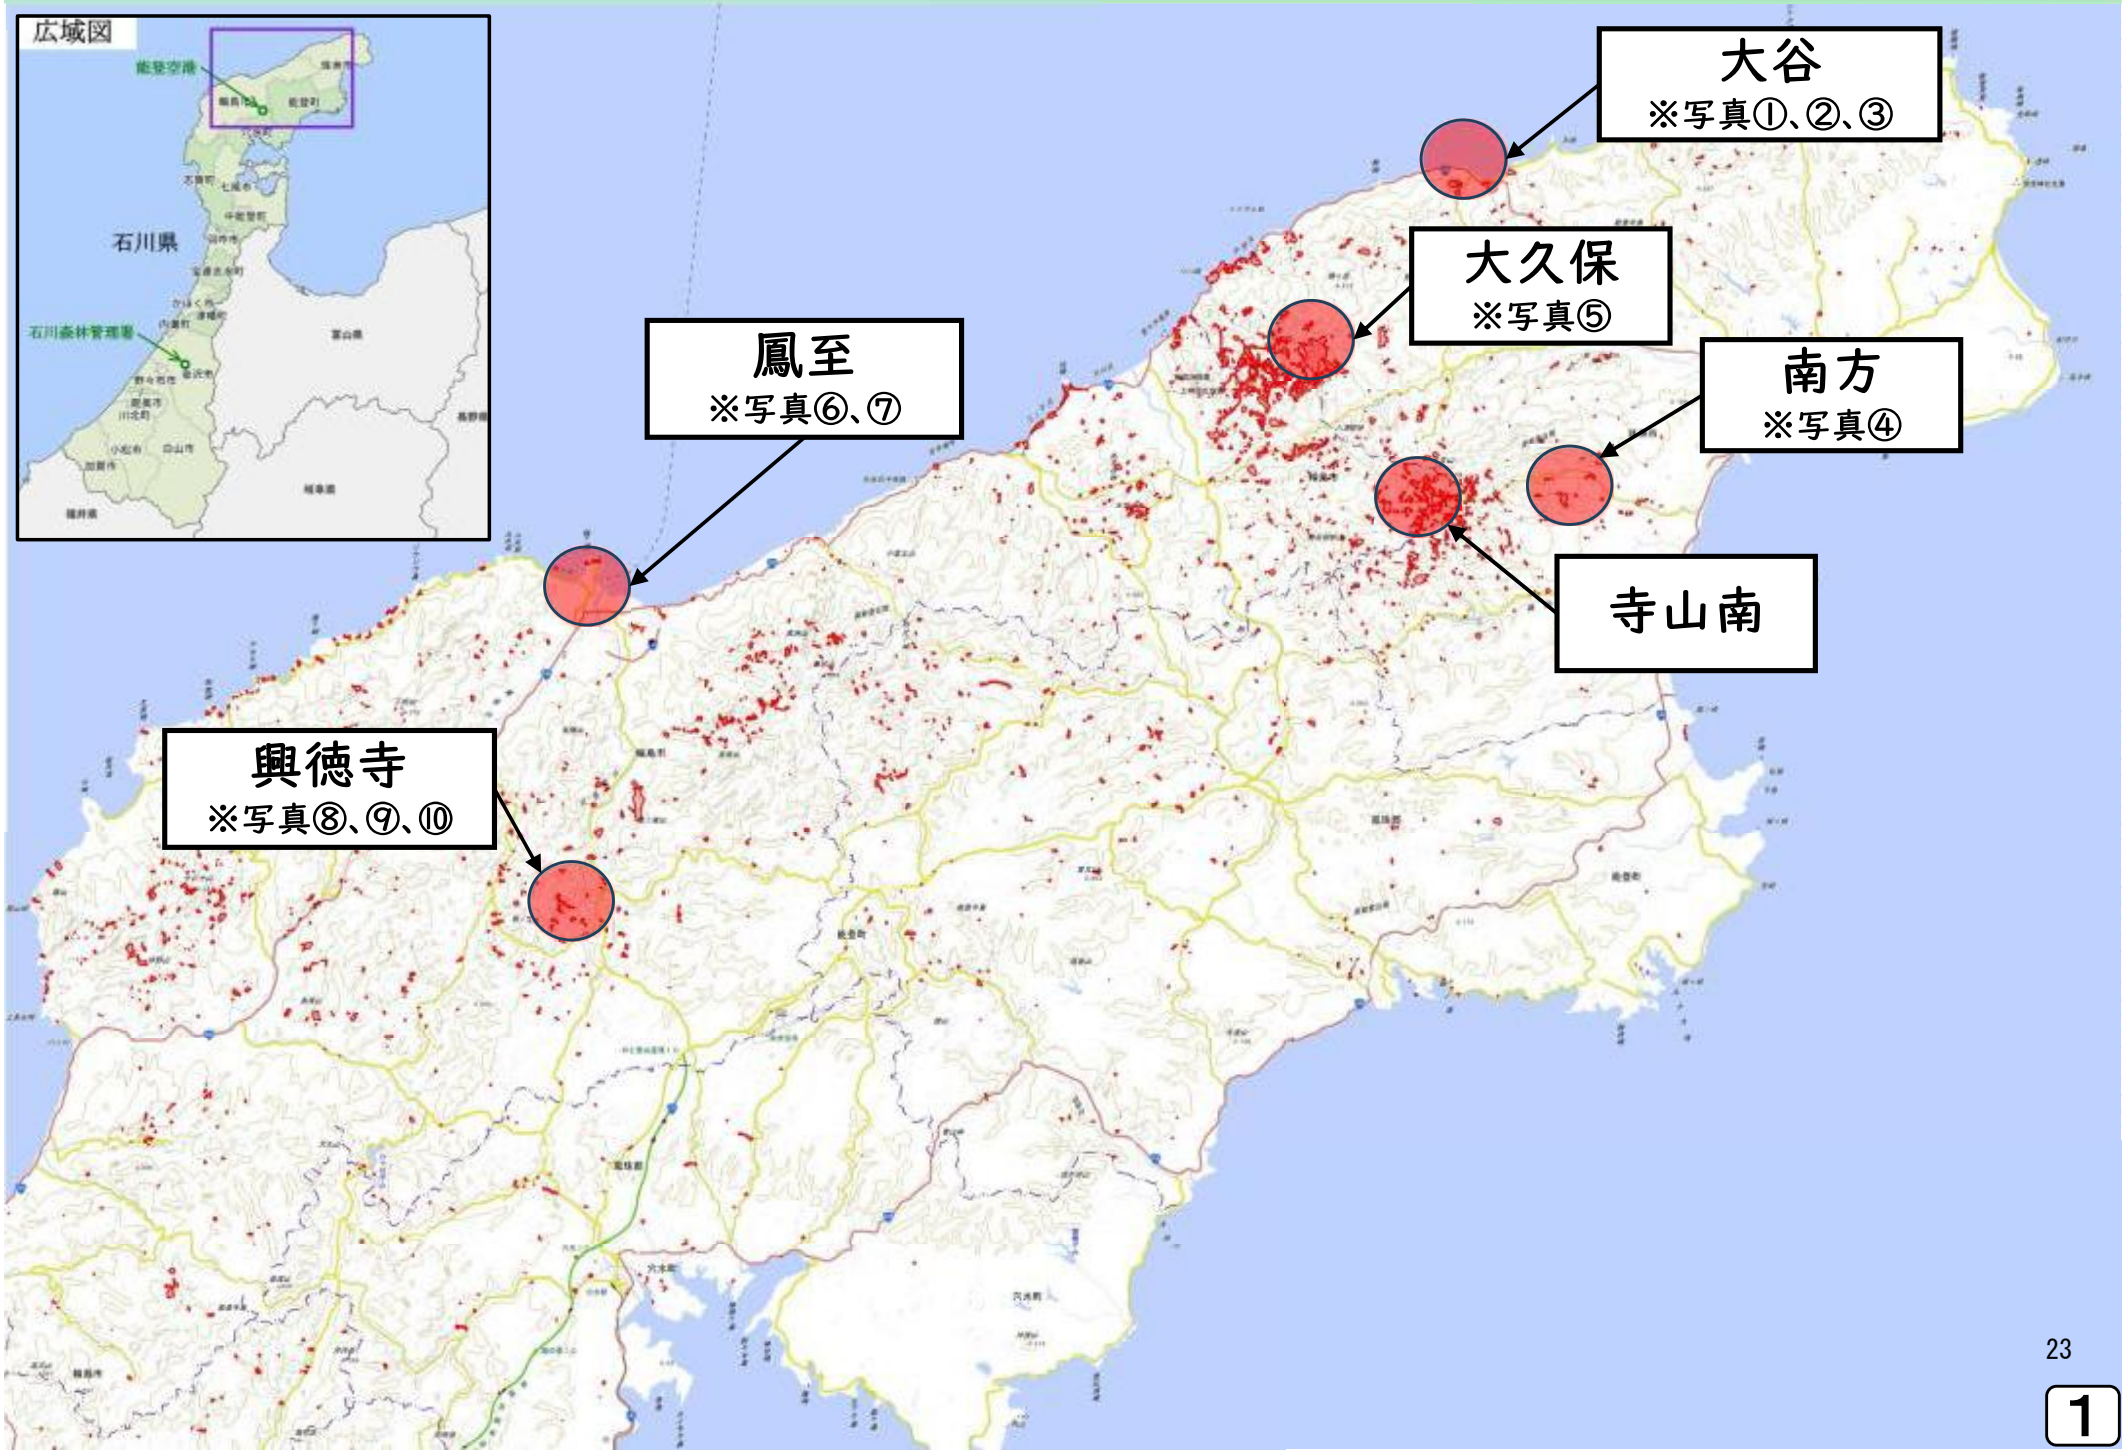

①_大谷(ケ-1ほか)渓間工事（工事期間：R8.3.17～R9.2.5）

R8.9.30現在の施工内容：コンクリート谷止工(掘削作業ほか)

令和7年度（完了）
コンクリート谷止工

令和8年度（予定）
流路工

令和8年度（予定）
コンクリート谷止工

令和7年度（完了）
鋼製谷止工

令和8年度（予定）
流路工


令和8年度（予定）
土砂等撤去整理



コンクリート谷止工施工状況（R7完了）
令和8年1月27日現在



鋼製谷止工施工状況（R7完了）
令和8年3月16日現在

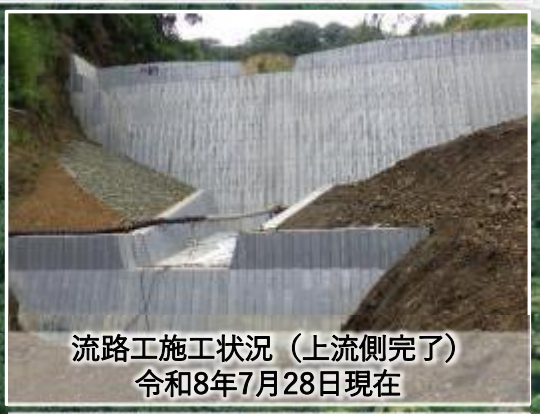

流路工施工状況（上流側完了）
令和8年7月28日現在



流路工施工状況（下流側埋戻作業）
令和8年9月28日現在



流路工施工状況（床固工設置完了）
令和8年8月24日現在

工事施工箇所遠景　令和8年7月31日現在

②_大谷(ホ-3)山腹工事（工事期間：R8.6.3～R9.3.12）

R8.9.30現在の施工内容：土砂等撤去整理作業ほか



暗渠排水管施工状況（山腹工上部）
令和8年8月20日現在



仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年9月18日現在



土砂等撤去整理作業状況
令和8年9月24日現在

令和7年度（完了）
山腹工（鋼製土留工ほか）



山腹工 施工状況（R7完了）
令和8年2月20日現在

令和8年度（予定）
山腹工（水路工、筋工ほか）

令和8年度（予定）
鋼製土留工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理、流末処理工

工事施工箇所遠景　令和8年7月31日現在

③_大谷(ホ-5)治山工事（工事期間：R8.6.9～R9.3.12）

R8.9.30現在の施工内容：鋼製谷止工(掘削作業ほか)



山腹工施工状況(斜面整地完了)
令和8年8月20日現在



山腹工施工状況(土留工床掘完了)
令和8年8月28日現在



山腹工施工状況(土留工完了・伏工作業中)
令和8年9月24日現在

令和7年度（完了）
山腹工（法枠工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工

令和8年度（予定）
鋼製谷止工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理、流末処理工



山腹工施工状況（R7完了）
令和8年3月5日現在



資材運搬状況（鋼製谷止工）
令和8年6月29日現在

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在

④_南方(ケ-1)渓間工事（工事期間：R8.3.17～R9.2.5）

R8.9.30現在の施工内容：流路工(鋼材組立設置作業ほか)



流路工施工状況（掘削作業）
令和8年6月9日現在

流路工施工状況（鋼材組立設置作業）
令和8年6月23日現在

鋼製谷止工施工状況（R7完了）
令和8年3月16日現在

流路工施工状況（鋼材組立設置作業）
令和8年7月23日現在

流路工施工状況（鋼材組立設置作業）
令和8年9月24日現在

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在

⑤_大久保治山工事（工事期間：R8.9.2～R9.3.19）

R8.9.30現在の施工内容：仮設工（作業ヤード整備ほか）



約42haの大規模崩壊地
令和6年5月29日現在



鋼製谷止工施工状況（R7完了：1/2）
令和8年3月18日現在



令和8年度（予定）
航空実播工


令和8年度（予定：1/2）
鋼製谷止工

令和7年度（完了：1/2）
鋼製谷止工


工事施工箇所遠景　令和7年10月24日現在

⑥_鳳至（地ホ-1）山腹工事（工事期間：R8.3.24～R9.2.19）

R8.9.30現在の施工内容：法枠工(鉄筋挿入工)

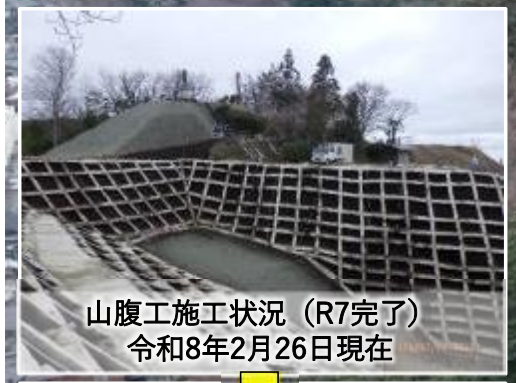
山腹工施工状況（R7完了）
令和8年2月26日現在


山腹工施工状況
令和8年5月19日現在

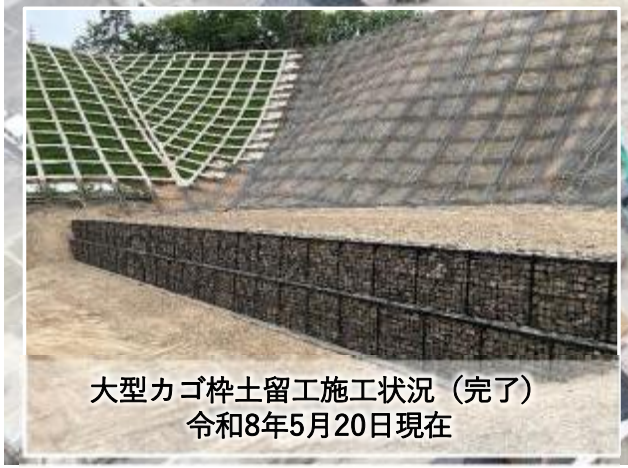
大型カゴ枠土留工施工状況（完了）
令和8年5月20日現在


山腹工施工状況（鉄筋挿入工）
令和8年9月16日現在


山腹工施工状況（法枠工）
令和8年8月10日現在


山腹工施工状況（法枠工）
令和8年6月25日現在

令和7年度（完了）
山腹工（法枠工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工（法枠工）

令和8年度（予定）
大型カゴ枠土留工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理

工事施工箇所遠景　令和8年3月25日現在

⑦_鳳至（ホ-1）施設災害対策工事（工事期間：R8.4.28～R9.3.12）

R8.9.30現在の施工内容：土砂撤去整理作業



土砂撤去整理作業状況
令和8年7月23日現在



土砂撤去整理作業状況
令和8年8月10日現在



山腹工施工状況（R7完了）令和8年3月11日現在

土砂撤去整理作業状況
令和8年7月21日現在

土砂撤去整理作業状況
令和8年9月17日現在

工事施工箇所遠景　令和8年3月25日現在

⑧_興徳寺（ケ-6）渓間工事（工事期間：R8.3.3～R9.1.22）

R8.9.30現在の施工内容：垂直壁工(鋼材組立設置作業ほか)



谷止工(掘削)施工状況（完了）
令和8年7月13日現在



谷止工(鋼製枠組立設置)施工状況
令和8年7月16日現在



谷止工施工状況（完了）
令和8年8月25日現在

鋼製谷止工施工状況（R7完了）
令和7年12月1日現在

工事支障木等整理状況
令和8年4月22日現在

谷止工下流(垂直壁工掘削)施工状況
令和8年9月25日現在

工事施工箇所遠景　令和7年12月1日現在

⑨_興徳寺（ホ-4）山腹工事（工事期間：R8.6.13～R9.3.12）

R8.9.30現在の施工内容：大型カゴ枠土留工(掘削作業ほか)


被災状況　令和6年7月19日現在

令和7年度（完了）
山腹工（鋼製土留工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工（筋工、伏工）

令和8年度（予定）
大型カゴ枠土留工


山腹工施工状況（R7完了）
令和8年3月24日現在


山腹工施工状況
令和8年6月2日現在


仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年7月31日現在


仮設工（仮設橋設置状況）
令和8年8月31日現在


仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年9月16日現在

32

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在

⑩_興徳寺渓間工事（工事期間：R8.6.13～R9.1.8）

R8.9.30現在の施工内容：流路工(掘削作業ほか)



仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年8月26日現在



流路工（掘削作業状況）
令和8年9月25日現在



コンクリート谷止工施工状況（R7完了）
令和8年3月16日現在

令和7年度（完了）
コンクリート谷止工

令和8年度（予定）
流路工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理

33

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在

水産庁漁港漁場整備部

（議題１）復旧復興の工事の進捗状況について

国代行による災害復旧（狼煙漁港（狼煙地区））

水産庁漁港漁場整備部

○　県内外の漁船が**避難港としても利用する狼煙（のろし）漁港（第４種漁港）**は、令和６年能登半島地震により、漁港全体の**地盤隆起を含む多くの漁港施設が被災。**

○　大規模災害復興法に基づき、**石川県知事からの要請を受け、国が災害復旧事業の代行工事を実施**（R6.2.8決定）。

○　泊地の浚渫により水深を確保し令和６年９月に**避難機能の一部回復**、令和７年３月に一部**岸壁の仮復旧を完了し、陸揚機能一部回復。**令和８年３月には、**新たに-3.0m岸壁の一部を供用開始、外郭施設（南防砂堤、波除堤）の復旧**により港内の静穏性が回復。令和８年９月に**-3.0m岸壁と船揚場の一部を供用開始。**引き続き、岸壁や防波堤等の**復旧工事を実施。**




狼煙漁港（狼煙地区）

管理者：石川県
港種：第4種漁港
利用漁船数：104隻（R2）
主要漁業：いか釣り・刺網
主要魚種：いか類、ぶり類等





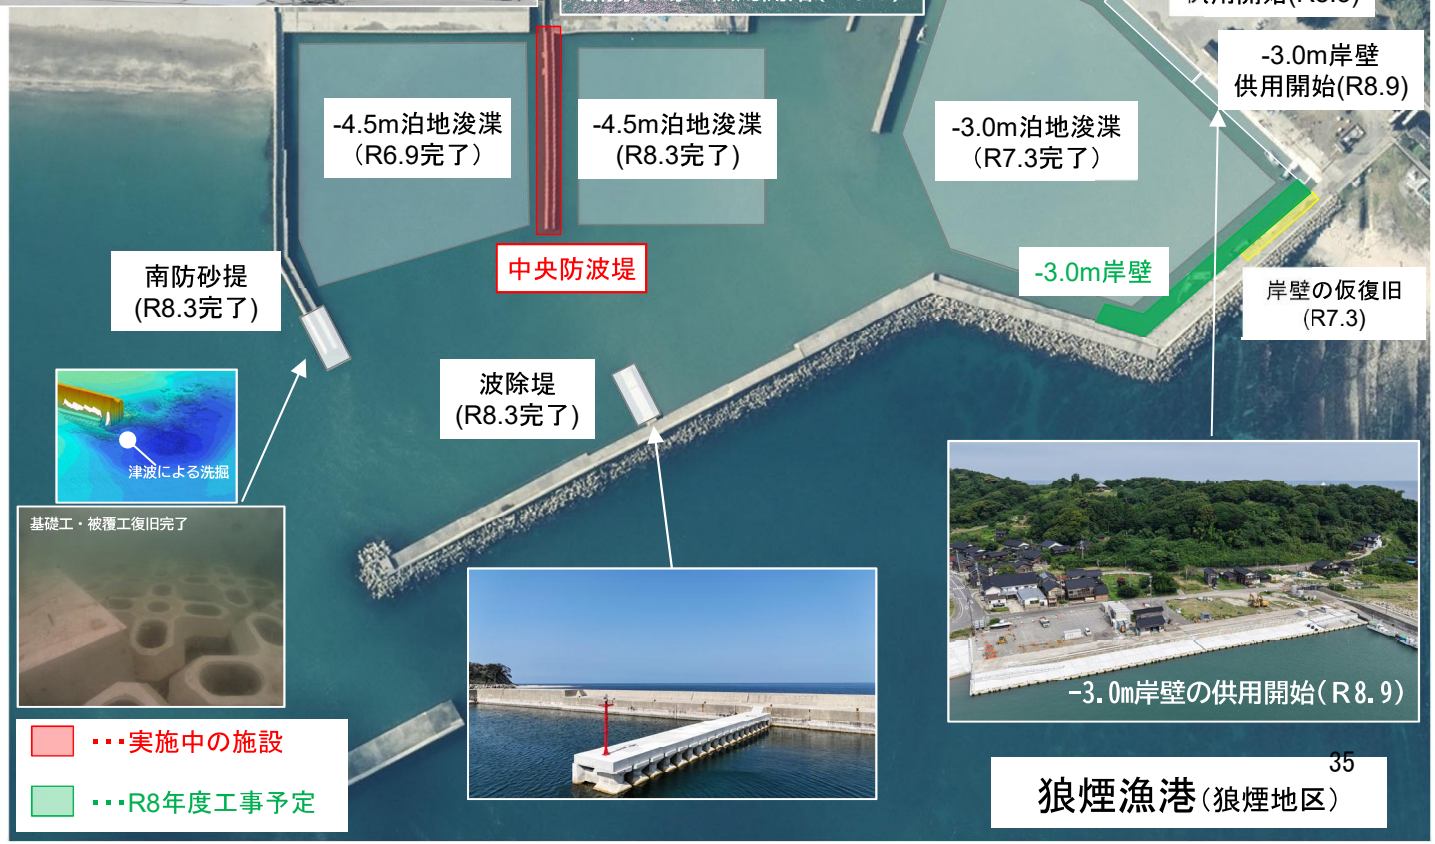

代行工事の動き

R6.2.8	代行工事の決定
R6.2.27	現地調査開始
R6.5.20	浚渫工事開始
R6.9.11	避難機能一部回復
R7.3.28	陸揚機能一部回復
R7.5.20	構造物工事（本復旧）開始
R8.3.31	外郭施設（南防砂堤、波除堤）完成及び-3.0m岸壁の一部供用開始
R8.9.3	-3.0m岸壁と船揚場の一部供用開始
現　在	岸壁や防波堤等の工事を実施

狼煙漁港（狼煙地区）

国代行による災害復旧（鵜飼漁港海岸）

水産庁漁港漁場整備部

○鵜飼（うかい）漁港海岸は、令和６年能登半島地震による護岸の倒壊など、海岸保全施設が被災。
○大規模災害復興法に基づき、珠洲市長からの要請を受け、国が災害復旧事業の代行工事を実施（R6.2.1決定）。
○令和６年２月末からドローンや測量船を利用した調査を開始し、水中部を含めた被災状況の詳細を把握。
○現在、珠洲市の復興まちづくりとも連携し復旧を進め、現在は工事の実施に向け最後の区間の調査や設計を実施しており、設計済の区間の工事は発注手続き中。



管理者：珠洲市長
海岸延長：1,686m
主要施設：護岸、人工リーフ、消波堤

代行工事の動き	
R6.1下旬	MAFFーSATによる現地確認
R6.1.30	珠洲市長から代行工事の要請
R6.2.1	代行工事の決定
R6.2.29	現地調査開始 関係機関との調整
R6.3中旬	調査結果とりまとめ
R7.5.27	復旧箇所の設計業務開始
R7.7.15	珠洲市長から無堤区間の春日野地区における堤防整備要望
現在	無堤区間を含め工事の実施に向けた設計を実施




石　川　県

土木部


公共土木施設等の復旧状況（道路）


道路の復旧状況

- 県管理道路では、地震で最大４２路線８７箇所、豪雨で最大２５路線４８箇所が通行止め
- **現時点**（R8.９月末）では、地すべりやトンネル崩落などの大規模な被害が発生した**５路線８箇所を除きすべて解消**
- 本復旧については、**今年度中に奥能登２市２町へのアクセスルートや主要な緊急輸送道路などの工事発注を概ね完了**
- **のと里山海道**では、昨年末までにカーブや勾配を緩やかにする工事を行い、**走行環境が改善、引き続き、本復旧工事を促進**
- 創造的復興の取組として、沿岸部を周遊する国道２４９号などについて、**「能登半島絶景海道」**として整備

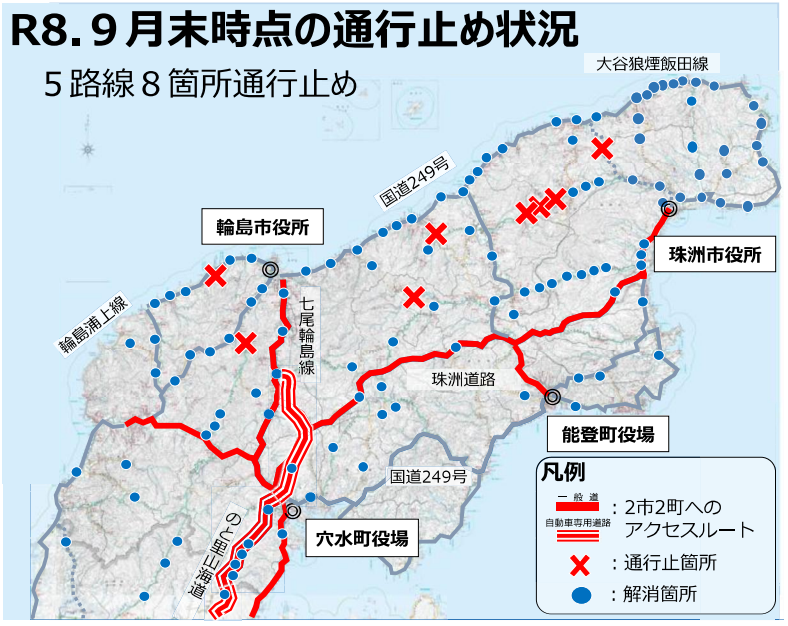

県道輪島浦上線
（輪島市下山町～大沢町）





県道七尾輪島線
（輪島市三井町長沢）



県道珠洲穴水線
（珠洲市宝立町柏原）



県道五十里深見線
（輪島市深見町）





県道柏木穴水線
（穴水町北七海）



県道宇出津町野線
（能登町宇出津山分）



1

公共土木施設等の復旧状況（河川・砂防）

河川の復旧状況

- **奥能登２市２町４５河川**のうち優先度の高い箇所から**本復旧に順次着手**しており、**現在２２河川で工事を促進**
- **輪島市の河原田川の約１．１ｋｍ**については、**出水期までに護岸工事を完了**
- **能登地域の２６河川**において、**出水期までに土砂の除去工事を完了**


河原田川（輪島市熊野町）



若山川（珠洲市若山町延武）



真名井川（穴水町大島～川島）

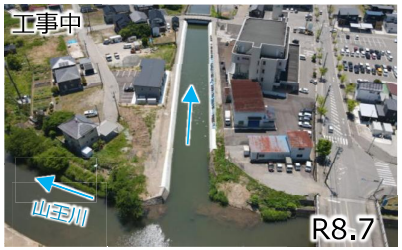

熊渕川（七尾市黒崎町～花園町）

堆積土砂除去完了



土砂災害発生箇所の復旧状況

- 地すべり防止などの恒久的な対策や、被災した砂防施設の**本復旧に順次着手**しており、**現在６９箇所で工事を促進**
- **輪島市**の**鹿磯１号**において、**５月までに法面工事を完了**
- **珠洲市の飯塚**においては、**９月までにがけ崩れ対策工事を完了**

長沢３号（輪島市三井町長沢）



弥生町（輪島市河井町）



鹿磯１号（輪島市門前町鹿磯）



飯塚（珠洲市正院町飯塚）



公共土木施設等の復旧状況（港湾）

港湾の復旧状況

・本復旧については、塩屋港、福浦港の２港湾で完了しており、残る８港湾の工事を進めている
（優先度の高い岸壁・物揚場の復旧）
七尾港：**Ｒ８年３月完了**　金沢港・輪島港・飯田港・小木港・宇出津港・穴水港：**Ｒ９年３月完了を目指す**

各港湾での創造的復興の取組

輪島港

輪島港復旧・復興プラン(R7.6策定)に基づく、
・**緑地の護岸復旧に合わせて、新たな広場空間を整備**
・**共同利用施設の移転・集約**に必要な**埋立地を造成中**

飯田港

・公費解体などで発生した**コンクリート殻を活用した砕石による埋立地造成に着手**
・賑わい創出につながる活用策を地元で検討

宇出津港

・荷捌所などの共同利用施設の集約に向け、**埠頭用地の拡大を推進**

七尾港

・マリンパーク広場で**防災機能を備えたイベントステージの整備を推進**

金沢港

・ 無量寺埠頭は、復旧に併せて、国が**耐震強化岸壁の延伸事業に着手**
・ 金沢港港湾計画(R7.3改定)の実現に向け、事業を順次展開

輪島港





飯田港



宇出津港



七尾港



金沢港



能登半島絶景海道の整備・魅力向上


○ 道路の災害復旧にあわせた
幅広な路肩の整備などの強靱化

○ 絶景を望む**新たな眺望ポイントの整備**

眺望ポイント整備候補箇所（２箇所）





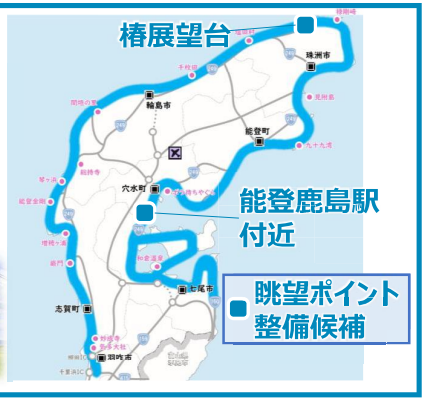

ブランド化の推進

R7の検討を踏まえた整備に着手

✓ ロゴ入り標識・案内看板の設置




※イメージ

情報発信力の強化

デジタルサイネージの設置に着手

✓ 沿道の道の駅等に設置（2箇所）

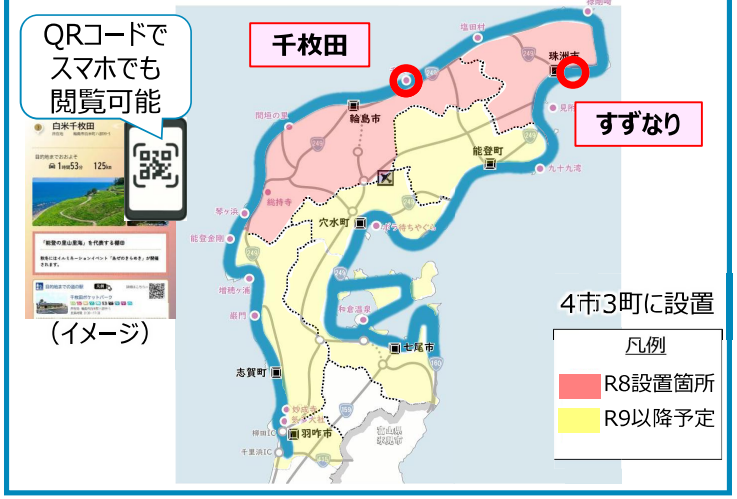

（イメージ）

サイクルツーリズムの推進

サイクリングの受入環境整備に着手

✓ 景観・走行性の向上（樹木の剪定等）
✓ サイクルラック等の設置（道の駅等）



サイクルラックの設置

石川県土木部（被災６市町）災害復旧工事及び通常工事のR8発注見通し

（建築工事除く）

（件）

工種	区分	発注件数										合計
		発注済					第3四半期以降					
		～1億円	1～3億円	3～15億円	15億円～	計	～1億円	1～3億円	3～15億円	15億円～	計	
土木一式	災害復旧	75	34	16	16	141	96	49	38	11	194	335
	通常工事	45	12	1		58	25	7	-	-	32	90
	小計	120	46	17	16	199	121	56	38	11	226	425
舗装	災害復旧	36	10	-	-	46	37	32	-	-	69	115
	通常工事	7	-	-	-	7	4	-	-	-	4	11
	小計	43	10	-	-	53	41	32	-	-	73	126
とび・土工・コンクリート	災害復旧	24	6	-	-	30	48	16	3	-	67	97
	通常工事	10	-	-	-	10	4	-	-	-	4	14
	小計	34	6	-	-	40	52	16	3	-	71	111
その他	災害復旧	4	1	-	-	5	2	1	-	-	3	8
	通常工事	8	-	-	-	8	10	-	-	-	10	18
	小計	12	1	-	-	13	12	1	-	-	13	26
合計		209	63	17	16	305	226	105	41	11	383	688

※これは発注見通し上の数値であり、数値は変動する場合があります。

石　川　県

農林水産部

復旧・復興工事の進捗状況について

石川県農林水産部
（農業基盤課）


農地・農業用施設の復旧状況

県では、一定規模以上の施設について、事業主体である市町から、災害査定から復旧工事までの一連の業務を受託している。

４月にはツインブリッジのとの交通規制を全面解除したほか、白米千枚田や農地、農業用ため池の復旧工事にも順次着手している。

また、各種支援制度や「奥能登営農復旧・復興センター」による伴走支援により、奥能登地域における令和８年の営農再開面積は、昨年より200ha多い2,200haになる見込みである。

奥能登の営農再開面積（水稲）

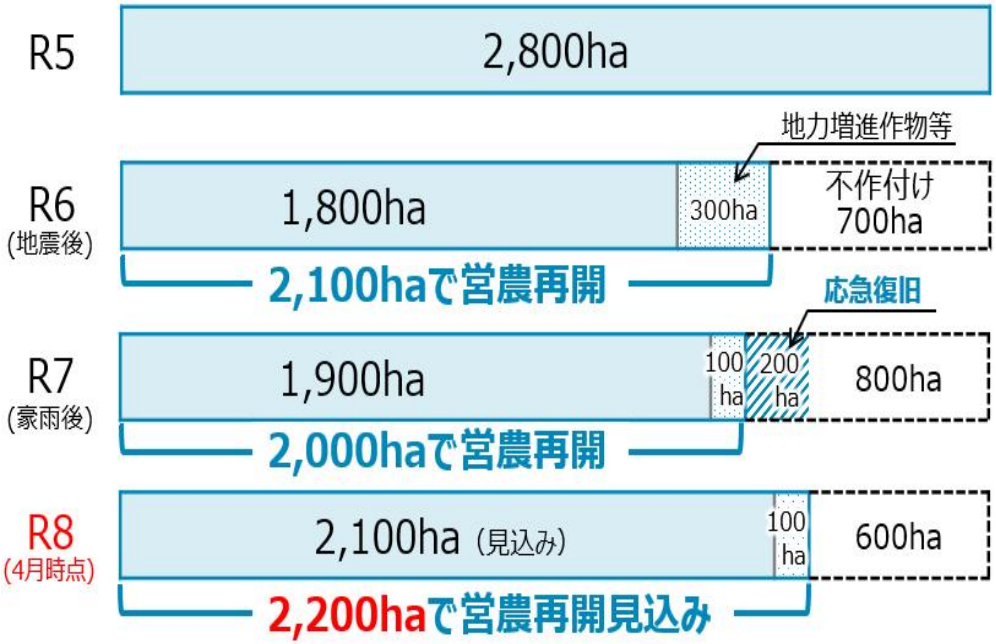

ツインブリッジのと

（七尾市中島町～能登島）





白米千枚田

（輪島市白米町 地内）





ため池の復旧

（七尾市能登島町百万石 地内）





復旧・復興工事の進捗状況について

石川県農林水産部
（森林管理課）


林地及び治山施設、林道の復旧状況

令和6年能登半島地震により340箇所で林地及び治山施設、294路線で林道が被災し、その後、奥能登豪雨において38箇所で林地及び治山施設、143路線で林道が被災した。

（林地及び治山施設）
人家や避難所、公共施設周辺などの優先度の高い箇所から調査設計や本復旧工事に着手している。

（林道）
林業活動に重要な幹線林道や生活道路となる林道から優先して調査設計や本復旧工事に着手している。

位置図

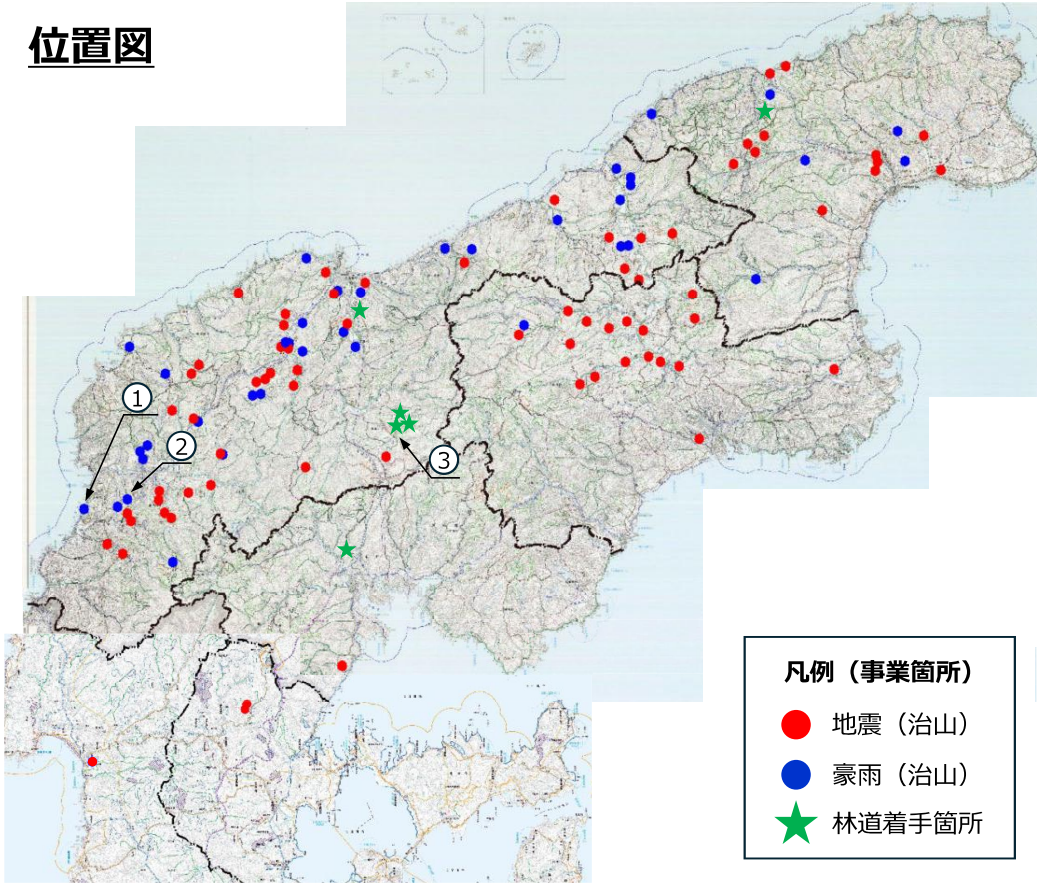

山腹崩壊の復旧状況





①輪島市門前町千代　地内





②輪島市門前町清水　地内

林道の復旧状況





③輪島市三井町洲衛（林道洲衛線）

復旧・復興工事の進捗状況について

石川県農林水産部
（水産課）


漁港の復旧状況

県管理漁港は地震により**７漁港が被災した**ものの、順次、**応急復旧等を行い、すべての漁港で利用が可能。**

本復旧工事については、漁業者の意見を踏まえ、**主要な係留施設**について、**操業を継続しながら計画的**に進めている。

能登６市町全体における令和８年上半期（１月～６月）の漁獲実績は、陸揚げ時間の調整など利用制限がある中、イワシやサバの豊漁により、**漁獲量・漁獲金額ともに、地震前を上回った。**

位置図

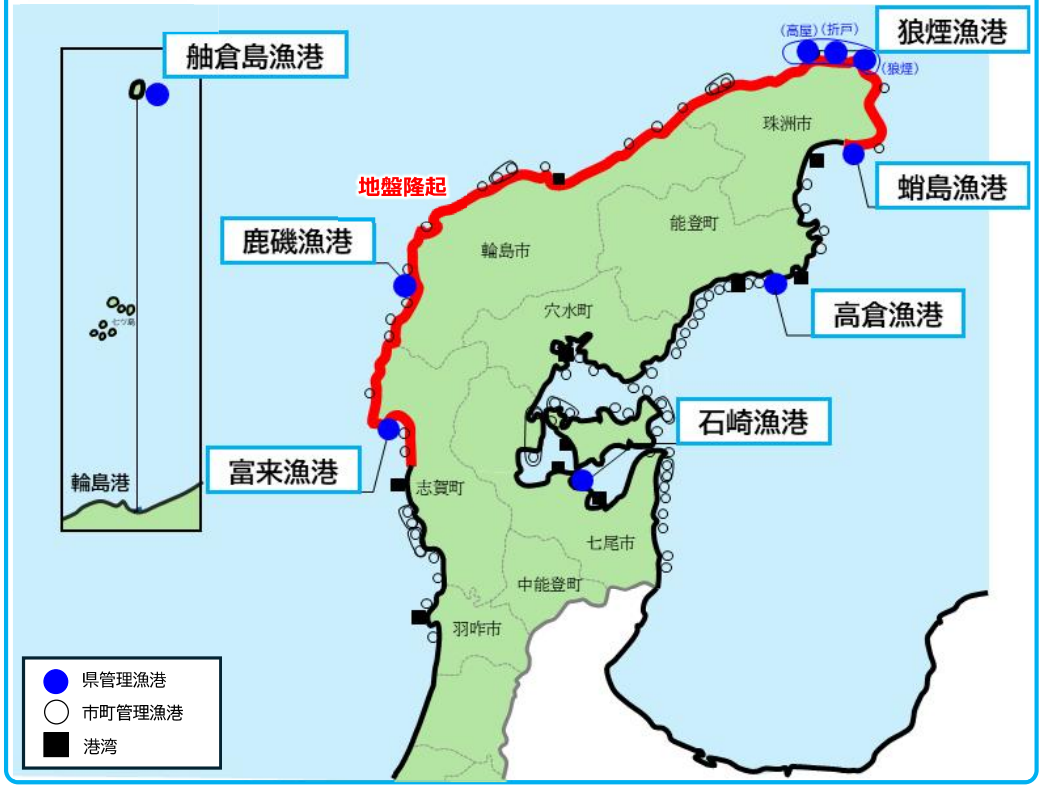

復旧工事の状況

高倉漁港（能登町姫地内）





蛸島漁港（珠洲市蛸島町地内）





石崎漁港（七尾市石崎町地内）





石川県農林水産部（被災6市町）　災害復旧工事及び通常工事のＲ８発注見通し

（単位：件）

工　種	区分	発注件数											合計
		発注済み	第３四半期					第４四半期					
			～1億円	1～3億円	3～15億円	15億円～	計	～1億円	1～3億円	3～15億円	15億円～	計	
土木一式	災害	31	18	12	3	1	34	13	7	15	0	35	100
	通常	23	11	0	0	0	11	2	0	0	0	2	36
	小計	**54**	**29**	**12**	**3**	**1**	**45**	**15**	**7**	**15**	**0**	**37**	**136**
舗装	災害	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4
	通常	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	小計	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**5**
とび・土工・コンクリート	災害	17	4	1	0	0	5	2	1	1	0	4	26
	通常	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	小計	**17**	**7**	**1**	**0**	**0**	**8**	**2**	**1**	**1**	**0**	**4**	**29**
その他	災害	3	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	6
	通常	2	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	7
	小計	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**13**
合計		**78**	**42**	**14**	**3**	**1**	**60**	**20**	**9**	**16**	**0**	**45**	**183**

※建築工事除く

※これは発注見通し上の数値であり、数値は変動する場合があります。

【議題２】

「円滑な施工確保対策について」

・北陸地方整備局
・石川県

北陸地方整備局

復旧・復興事業の施工確保対策一覧＜工事発注手続の各段階別＞

国土交通省
北陸地方整備局

○ 本格化する復旧工事を円滑に進めるため、入札契約、積算、監督に係る様々な取り組みを実施。

発注準備、積算 >>> 入札公告 >>> 着工準備期間 >>> 工事中

【対策１】
発注ロットの拡大

【対策２】
ＥＣＩ方式の導入

【対策８】
復興歩掛の導入

【対策９】
施工箇所が点在する工事の積算

【対策３】
復旧・復興ＪＶ、地域維持型ＪＶ制度の活用

【対策４】
競争参加資格要件の緩和

【対策５】
受注機会の拡大
・自治体実績評価型
・企業能力評価型

【対策６】
事務手続きの負担軽減
・一括審査、フレームワーク
・段階選抜の見直し
・技術提案テーマ運用の見直し

【対策１０】
余裕期間制度の活用

【対策１１】
スライド条項の適用

【対策１３】
建設資材調達困難に係る設計変更

【対策１５】
地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更（奥能登・中能登地域における技術者にかかる間接費の設計変更）

【対策７】
特例監理技術者による２つの工事現場の管理

【対策１２】
実態反映型積算の活用

【対策１４】
直轄工事様式と自治体様式の相互乗り入れ

＜対応策の目的＞
入札参加者、技術者等の確保
予定価格・工期の適切な設定
宿泊費、価格高騰等に伴う契約変更

石　川　県

土木部

復旧・復興ＰＲの取り組み


○ 地震・豪雨からの復旧・復興の進捗について、**「Ｘへの投稿」**や、**「復旧・復興ＰＲポスター」**を県庁等に掲出するなど、**見える化を進め、復興への理解と安心感を醸成**

Ｘへの投稿（奥能登土木）

石川県奥能登土木総合事務所 @Okunoto_Infra · 6月12日

番組翻訳

【#災害復旧】#能登半島地震によりがけ崩れが発生した#珠洲市飯塚地区の法面の復旧工事が完了しました。(#災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業)
付近には、人家のほか指定避難所や仮設住宅が立地しており、今後の災害防止や#住宅再建に向け、引き続き、擁壁工事を進めていきます。

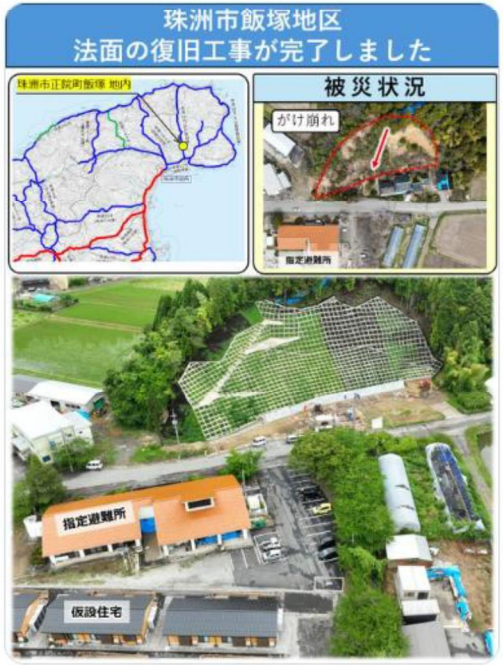

Ｘへの投稿（中能登土木）

石川県 中能登土木総合事... · 2026/04/10

【和倉温泉の復旧が前進】
能登半島地震で被災した
和倉温泉の
海岸護岸について、
旅館が立ち並ぶ区間の
護岸工事が完成しました。

和倉温泉のなりわい再建に向け、
引き続き、整備を進めていきます。
📷写真1:完成
📷写真2:被災状況

#和倉温泉
#能登半島地震
#災害復旧 #復興
#七尾市
#石川県



復旧・復興ＰＲポスター



令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨
復旧・復興のあゆみ

R8.9.30


◇復旧・復興の状況

能登半島地震から２年９ヶ月、奥能登豪雨から２年が経過しました。
本県では、本復旧に向け工事を促進しております。
現在の各施設の復旧状況について、ご紹介いたします。

＜県管理の公共土木施設の現状（R8.8末）＞

施設名	施設数	着手数	0% 20% 40% 60% 80% 100%
本復旧に着手した道路の路線数	127	83	約65%
うち、奥能登２市２町へのアクセスルート路線数	8	8	100%
本復旧に着手した河川数	102	66	約65%
うち、水位周知河川数	17	15	約88%
本復旧に着手した港湾施設数	328	121	約37%
うち、生業・民業に不可欠な施設、人家に被害が及ぶ施設	25	21	約84%
本復旧に着手した土砂災害箇所	200	101	約51%
うち、人家密集地、仮設住宅に影響する箇所、保全人家、住宅再建、地すべりに影響する箇所	107	74	約69%

◇本復旧工事の着手状況

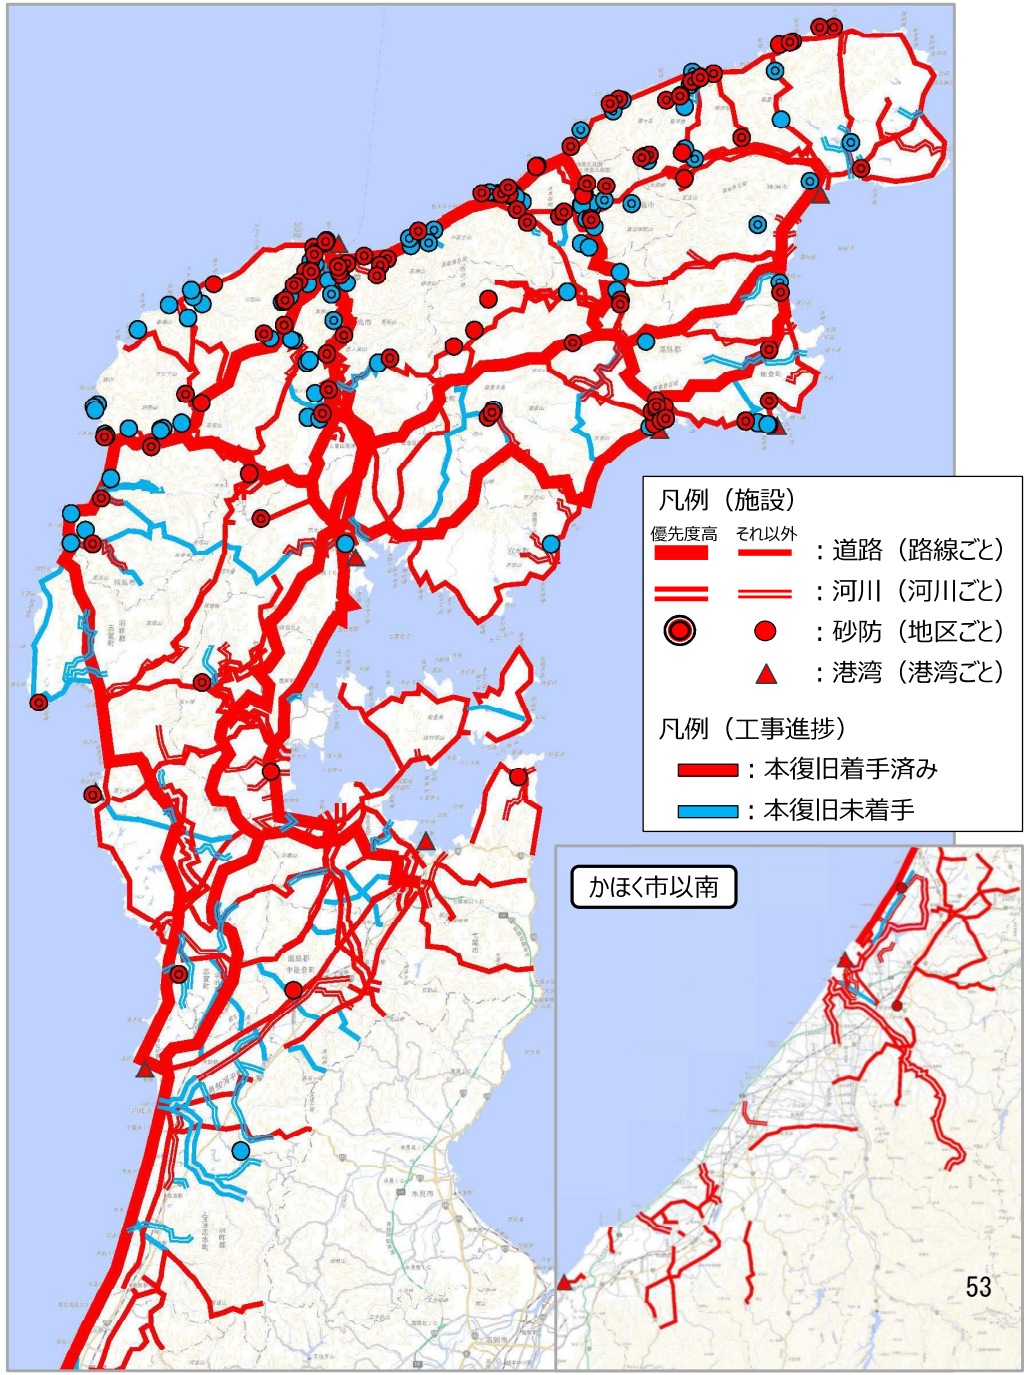

石川県における遠隔施工の事例

セーフティークライマー工法

旧　<ロッククライマー工法>



2災9号 主要地方道押水福岡線 道路災害復旧工事(改良工)

斜面上部にアンカーを設置し、そのアンカーと高所法面掘削機をワイヤーロープで固定して斜面の掘削を行います。

従来の掘削機による高所作業や人力作業により、時間やコストを低く抑えることができ、効率的な施工方法です。

転石や崩壊など、特に災害のおそれのある現場では、危険を伴う作業となりました。

新　<セーフティークライマー工法>



6災11645号-3工区 主要地方道宇出津町野線 道路災害復旧工事

ロッククライマー工法を遠隔施工を可能としました。

リモコン式掘削機械を使用することで、オペレーターは法面の下から、送信機を遠隔操作する工法です。

急斜面でも、危険を伴う搭乗操作の必要性がなく、安全に工事を行うことができます。

石川県における遠隔施工の事例

汎用遠隔操縦装置「K-DIVE®」を活用した遠隔施工



輪島市鵜入町（県道　輪島浦上線）の全景_R6.1



工事用道路の施工状況_R8.7



遠隔ショベルの作業状況



遠隔操縦室（コックピット）



遠隔操縦状況

K-DIVE®（遠隔操作システム＋稼働データ活用）| コベルコ建機 日本サイト
https://www.kobelco-kenki.co.jp/dx/kdive.html

石川県における遠隔施工の事例

自動ステアリング・スクリード伸縮装置付き　アスファルトフィニッシャー

従来手法



アスファルトフィニッシャーは、舗装工事においてアスファルト混合物を所定の厚さと幅に敷きならし、路面を均一に仕上げる建設機械です。施工品質の確保や作業効率の向上に重要な役割を担っています。

一方で、従来の施工では<u>オペレータの熟練度や現場での手動調整に依存する部分が大きく</u>、出来形や平坦性にばらつきが生じる場合があり、品質確保や施工管理に一定の負担を要する工法です。

自動アスファルトフィニッシャー





作業員が横から確認
施工幅の微調整が可能

自動アスファルトフィニッシャーは、各種センサや制御システムにより敷きならし厚や高さを自動調整し、均一で高品質な舗装面を形成する建設機械です。

従来工法で課題となる<u>オペレータの技能差による出来形のばらつきを低減</u>し、平坦性の向上、品質の安定化、施工管理の効率化および生産性の向上を実現します。

【議題３】

「建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題について」

・北陸地方整備局

建設資機材の需給状況に関する情報

【令和８年９月１５日現在】

資材名	地区名	供給者側			
		県建協	日建連	道建協	
生コンクリート	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	ややひっ迫	ひっ迫
	加賀	均衡	やや緩和～均衡	均衡	均衡
アスファルト合材	能登	ややひっ迫	ややひっ迫～ひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫
	加賀	ややひっ迫	均衡～ややひっ迫	ややひっ迫	均衡
敷鉄板（リース）	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	ひっ迫	ひっ迫
	加賀	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	ひっ迫	
鋼矢板（リース）	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫
	加賀	ややひっ迫	均衡～ややひっ迫	ややひっ迫	
H形鋼（リース）	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	均衡	均衡
	加賀	ややひっ迫	均衡～ややひっ迫	均衡	
バックホウ	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	ややひっ迫	均衡
	加賀	ややひっ迫	ややひっ迫～ひっ迫	ややひっ迫	
ブルドーザ	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	均衡	均衡
	加賀	均衡	均衡～ひっ迫	緩和	
ダンプ	能登	ややひっ迫	ややひっ迫～ひっ迫	ややひっ迫	－
	加賀	ややひっ迫	ややひっ迫～ひっ迫	ややひっ迫	－
捨石	能登	ややひっ迫	ひっ迫	－	－
	加賀	ひっ迫	ややひっ迫	－	－
砂・砂利・砕石・割栗石等	能登	ややひっ迫	ややひっ迫～ひっ迫	－	－
	加賀	ややひっ迫	ややひっ迫	－	ひっ迫：割栗石 均衡：砂・砂利
ヒューム管全般	能登	－	－	－	緩和
	加賀	－	－	－	緩和
コンクリートパイル・ポール全般	能登	－	－	－	緩和
	加賀	－	－	－	緩和
コンクリート製品全般	能登	－	－	－	ややひっ迫
	加賀	－	－	－	均衡
交通誘導員	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	ややひっ迫	－
	加賀	均衡	均衡～ややひっ迫	ややひっ迫	－
トラッククレーン	能登	ややひっ迫	均衡～ひっ迫	－	－
	加賀	ややひっ迫	均衡～ややひっ迫	－	－
コンクリートポンプ車	能登	－	ひっ迫	－	－
	加賀	ややひっ迫	ややひっ迫	－	－

【議題４】

「関係機関が抱える課題について」

・(一社)石川県建設業協会
