工事名	穴水町上水道給水台帳					本管	DCIP VCPW ACP φ 100 (NS) 耗

課長		課長補佐		係長		係		合議	

設備場所	石川県輪島市三井町洲衛地内　番地	口径	50φ
使用者		住所	( ) −
代理人		住所	

着手　年　月　日　完成　年　月　日　　開閉栓　　立米　　耗

使用材料

品名（形状寸法）	数量	単価	金額
φ50 耗　式分水栓			
φ50 耗　伸縮止水栓	1		123,080
φ50 耗　甲　〃	1		74,020
φ50 耗　量水器	1		貸付
φ50 耗　PEW　管	2	880	1,960
φ　耗　量水器筐	1		460,000
仕切弁筐	1		3,800
φ50ナット付ユニオンHI	1		13,130
φ50 耗　KMPオスアダ	1		15,860
φ50 耗分止水用ジョイント	1		15,860
φ50 耗メーター用　〃	1		22,000
φ50 耗　FJ-500L　〃	2	63,190	126,380
φ50 耗エルボ　〃	2	34,610	69,220
φ　耗ソケット　〃			
計			925,310

使用材料

品名（形状寸法）	数量	単価	金額
計			
合計			

写真

穴水町　上下水道課　　指定工事店 [redacted]

平面図

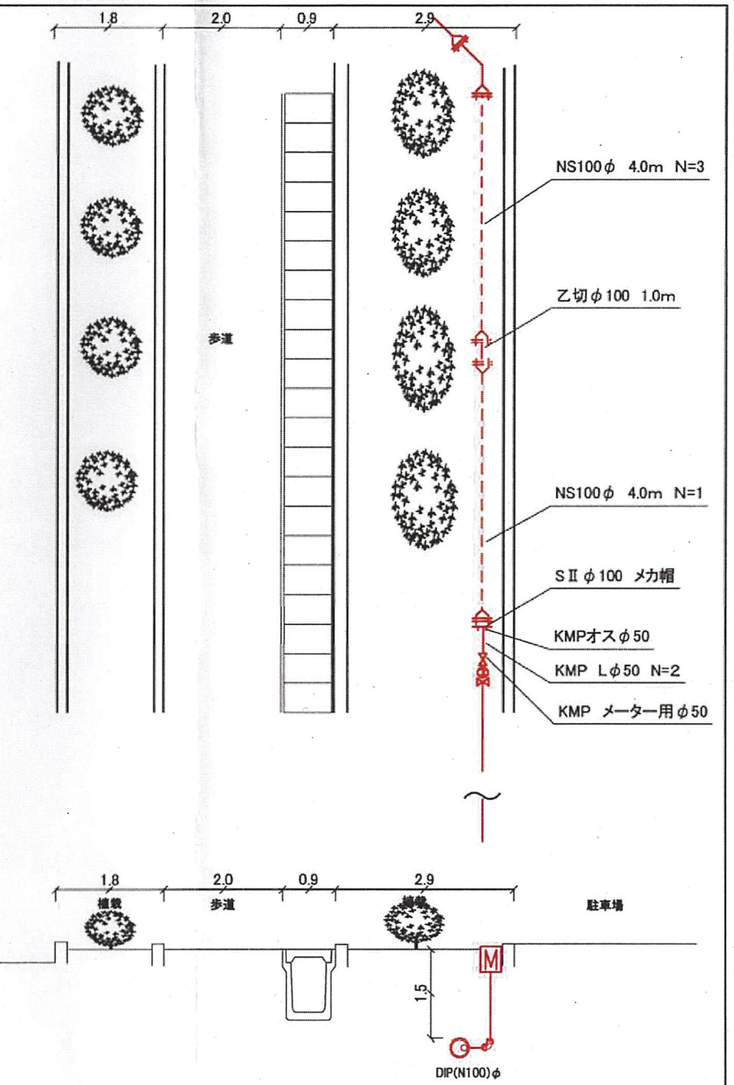

断面図

水

決裁	課長	課長補佐	主幹	係長	主任	係
合議						

給水装置（新設・改造・修繕・撤去）申込書

所有者住所氏名	TEL（　　）　－		
給水装置設置場所	輪島市三井町洲衛地内		
土地家屋所有者名	土地　　家屋		
施工業者名	（認定業者）[redacted]		
用途		口径	φ 50 mm
手数料	1，000円	加入分担金	660,000(税込)円

上記のとおり給水を受けたいので申請手数料及び加入金

円を添えて申請します。

令和　　年　　月　　日

穴水町長　　吉村　光輝　様

申請者　住所 石川県金沢市鞍月1丁目1番地

氏名 石川県知事 馳浩　　㊞

代理者　氏名 [redacted]　　㊞

付近見取図

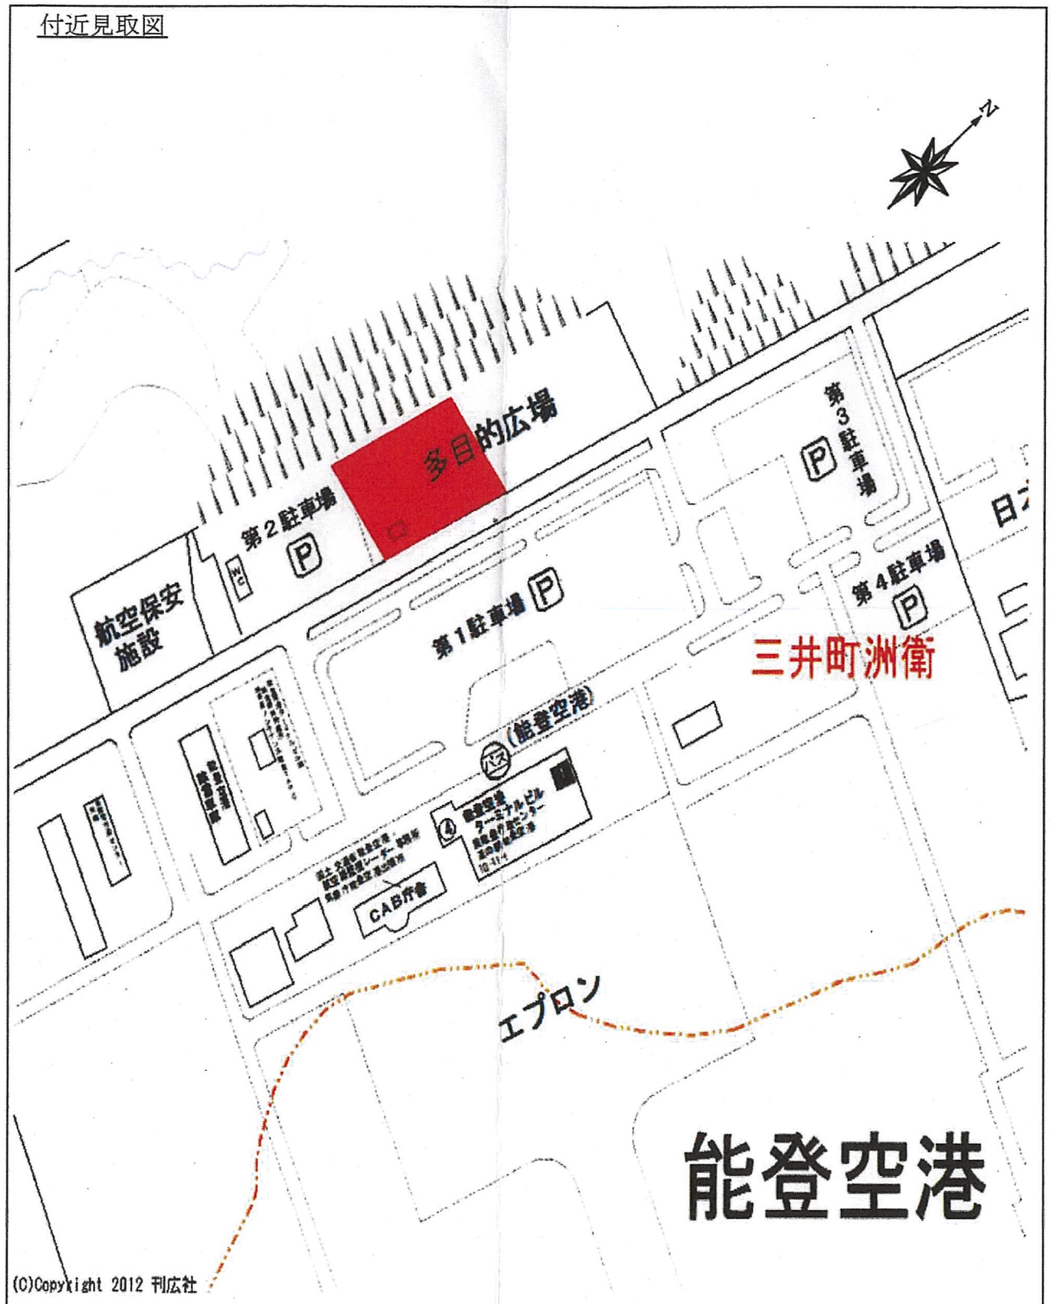

SP-ガルスパン　グランブルー　5棟（04, 06, 10, 13, 17）
SP-ガルスパン　モスグリーン　5棟（02, 08, 11, 15, 19）
SP-ガルスパン　ビターブラウン　10棟（01, 03, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 20）

Rプラン：　10棟
Lプラン：　9棟
BFプラン：　1棟

記号	名称	桝仕様				
		深さ	形状	管路口径	桝口径	蓋
◇1	小口径桝	-305	90L	100	150	塩ビ製蓋　20個所
◇2	小口径桝	-295	90YS	100	150	塩ビ製蓋　20個所
◇3	排水桝	-250	ﾄﾗｯﾌﾟ	100	300	ﾚｼﾞｺﾝ蓋　20個所
◇4	小口径桝	-315～	DR	100	200	塩ビ製蓋　20個所
◇5	小口径桝	-570	90L	100	200	塩ビ製蓋
◇6	小口径桝	-650	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇7	小口径桝	-730	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇8	小口径桝	-810	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇9	小口径桝	-890	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇10	小口径桝	-930	90L	100	200	塩ビ製蓋
◇11	小口径桝	-645	90L	100	200	塩ビ製蓋
◇12	小口径桝	-725	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇13	小口径桝	-805	90Y	100	300	塩ビ製蓋
◇14	小口径桝	-885	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇15	小口径桝	-965	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇16	小口径桝	-1025	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇17	小口径桝	-700	90L	100	200	塩ビ製蓋
◇18	小口径桝	-780	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇19	小口径桝	-860	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇20	小口径桝	-920	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇21	小口径桝	-1050	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇22	小口径桝	-570	90L	100	200	塩ビ製蓋

記号	名称	桝仕様				
		深さ	形状	管路口径	桝口径	蓋
◇23	小口径桝	-650	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇24	小口径桝	-730	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇25	小口径桝	-810	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇26	小口径桝	-880	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇27	小口径桝	-940	90L	100	200	塩ビ製蓋
◇28	小口径桝	-250	ﾄﾗｯﾌﾟ	100	150	ﾚｼﾞｺﾝ蓋
◇29	小口径桝	-350	90YS	100	150	塩ビ製蓋
◇30	小口径桝	-380	90Y	100	150	塩ビ製蓋
◇31	小口径桝	-445	90L	100	150	塩ビ製蓋
◇32	小口径桝	-645～	DR	100	200	塩ビ製蓋
◇33	小口径桝	-1030	90Y	100	200	塩ビ製蓋
◇34	小口径桝	-	90L	100	150	塩ビ製蓋
◇35	小口径桝	-	90L	100	150	塩ビ製蓋
◇36	排水桝	-250	ﾄﾗｯﾌﾟ	100	200	ﾚｼﾞｺﾝ蓋

※給水管埋設深さ-600

SP-ガルスパン　グランブルー　5棟（04, 06, 10, 13, 17）
SP-ガルスパン　モスグリーン　5棟（02, 08, 11, 15, 19）
SP-ガルスパン　ビターブラウン　10棟（01, 03, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 20）

Rプラン：　10棟
Lプラン：　9棟
BFプラン：　1棟

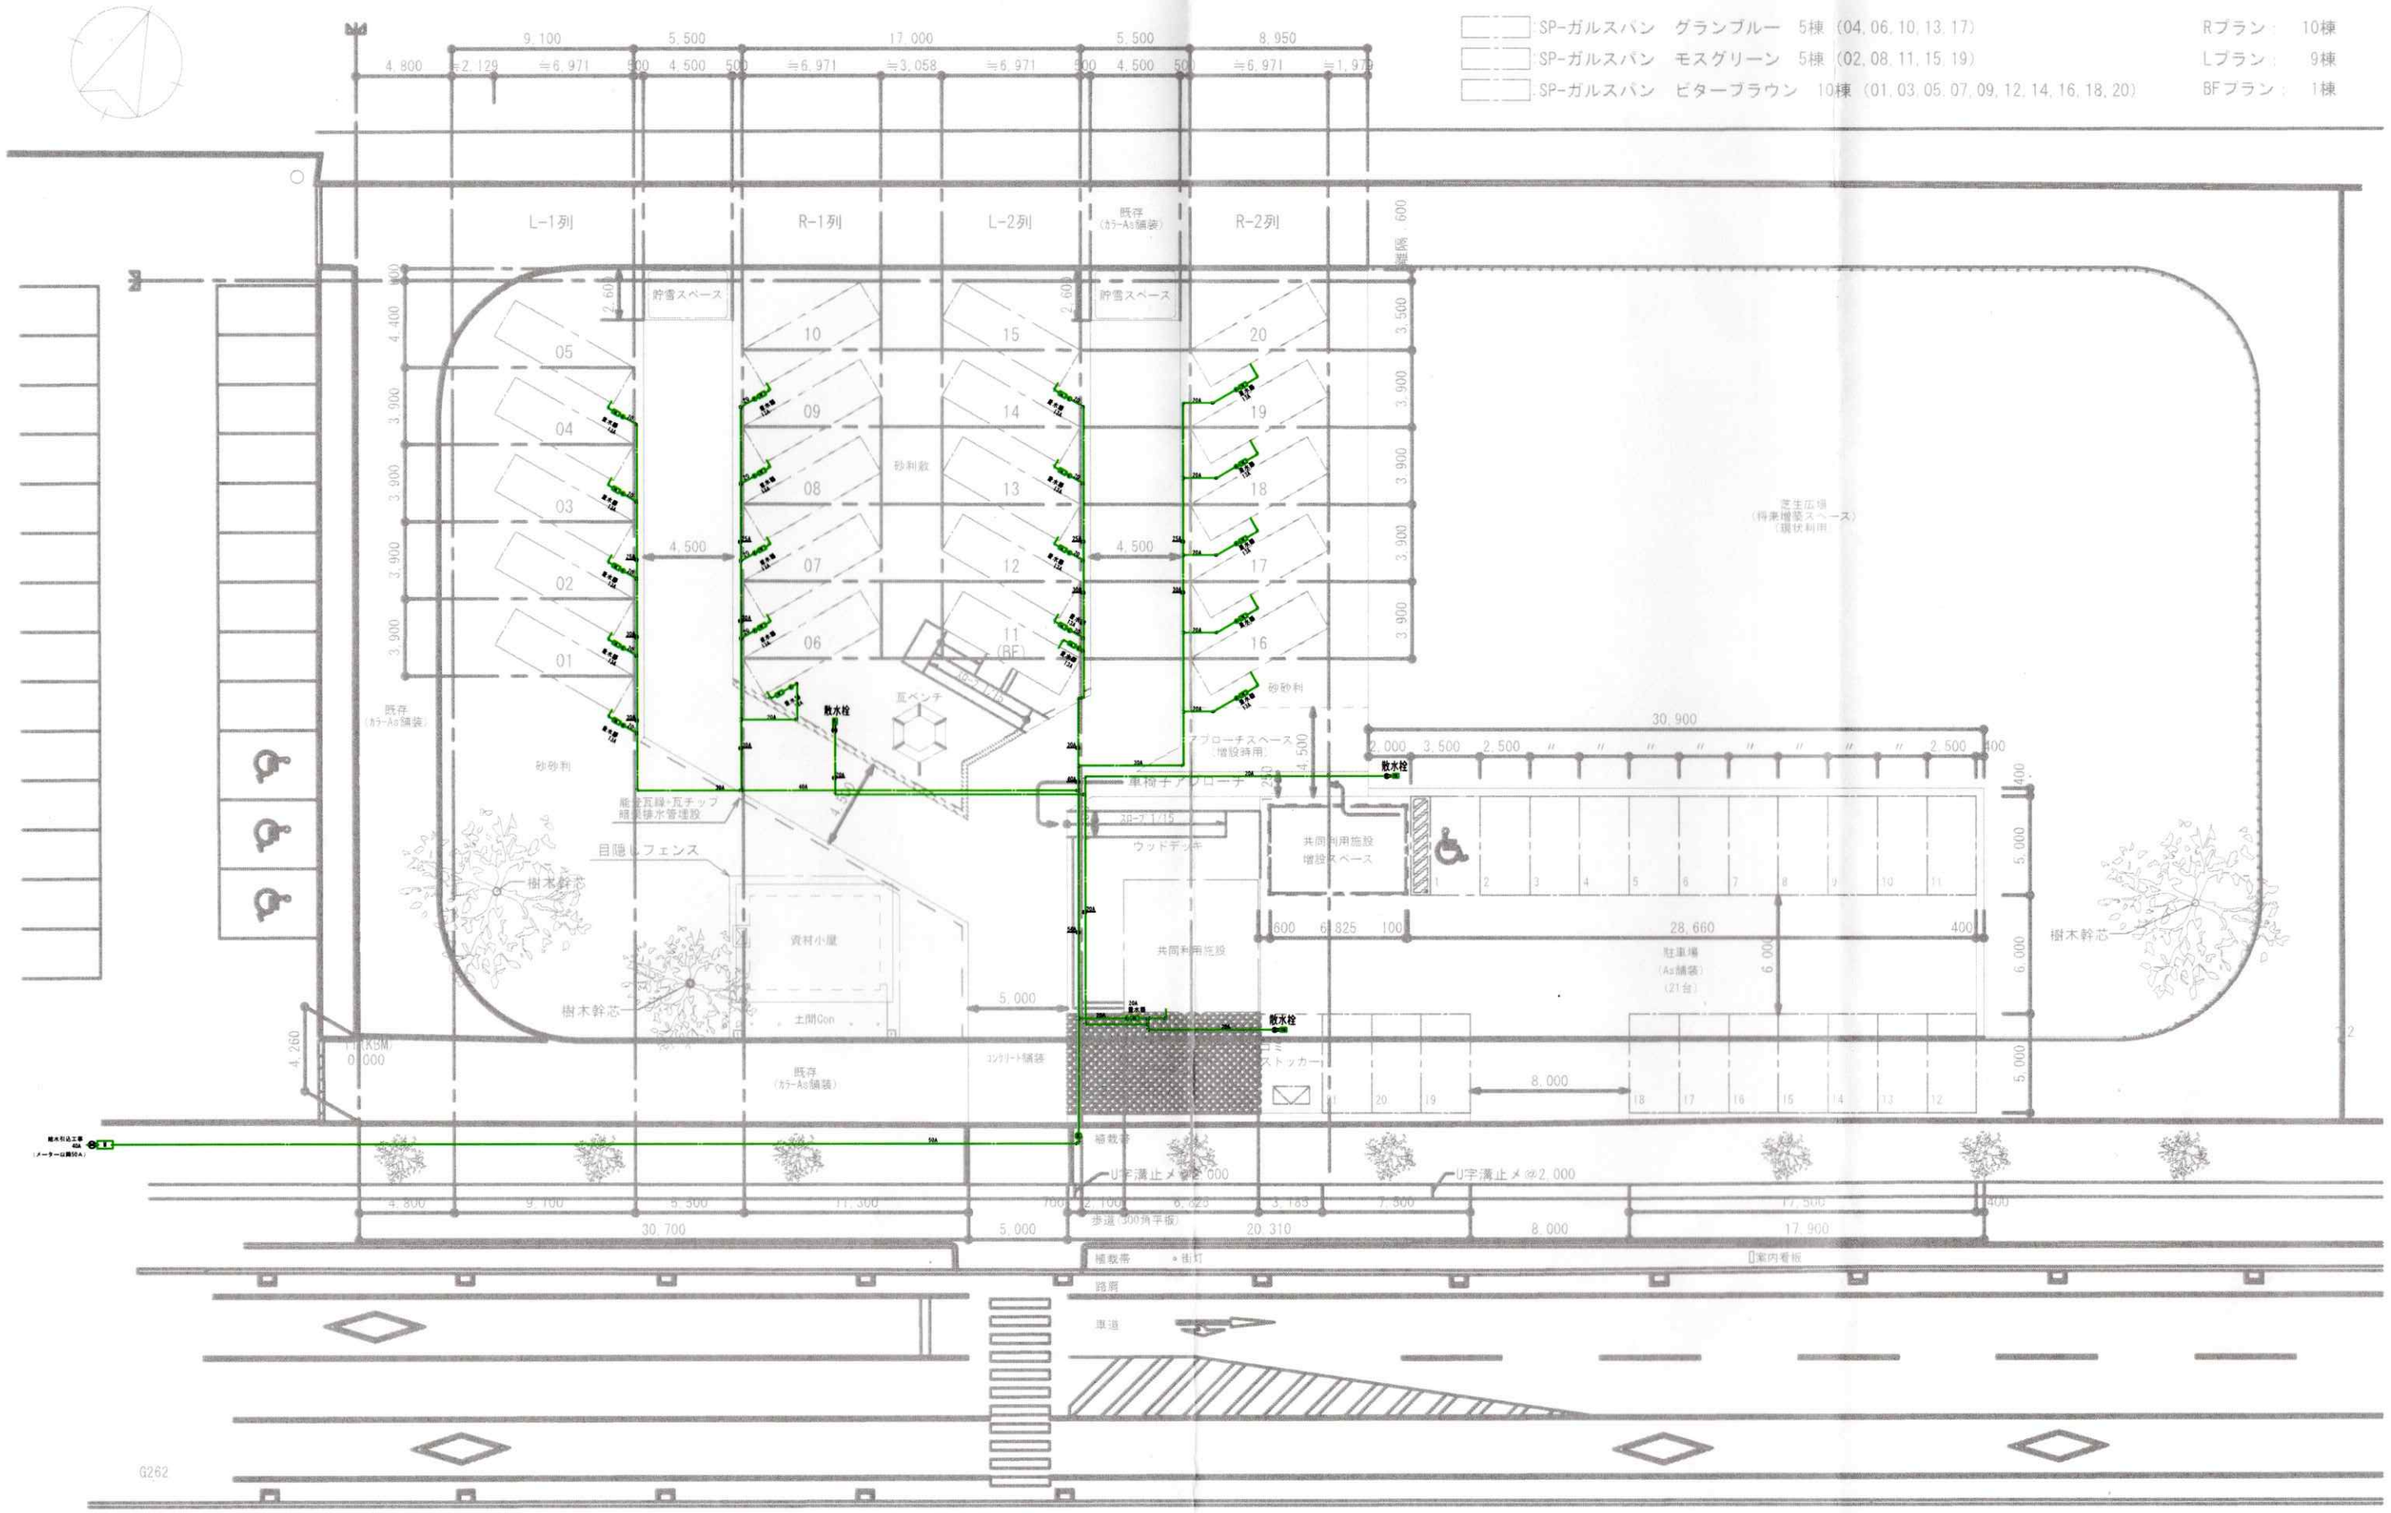

SP-ガルスパン　クランフルー　5棟　04 06 10 13 17
SP-ガルスパン　モスグリーン　5棟　02 08 11 15 19
SP-ガルスパン　ヒターブラウン　10棟　01 03 05 07 09 12 14 16 18 20

Rプラン　10棟
Lプラン　9棟
BFプラン　1棟

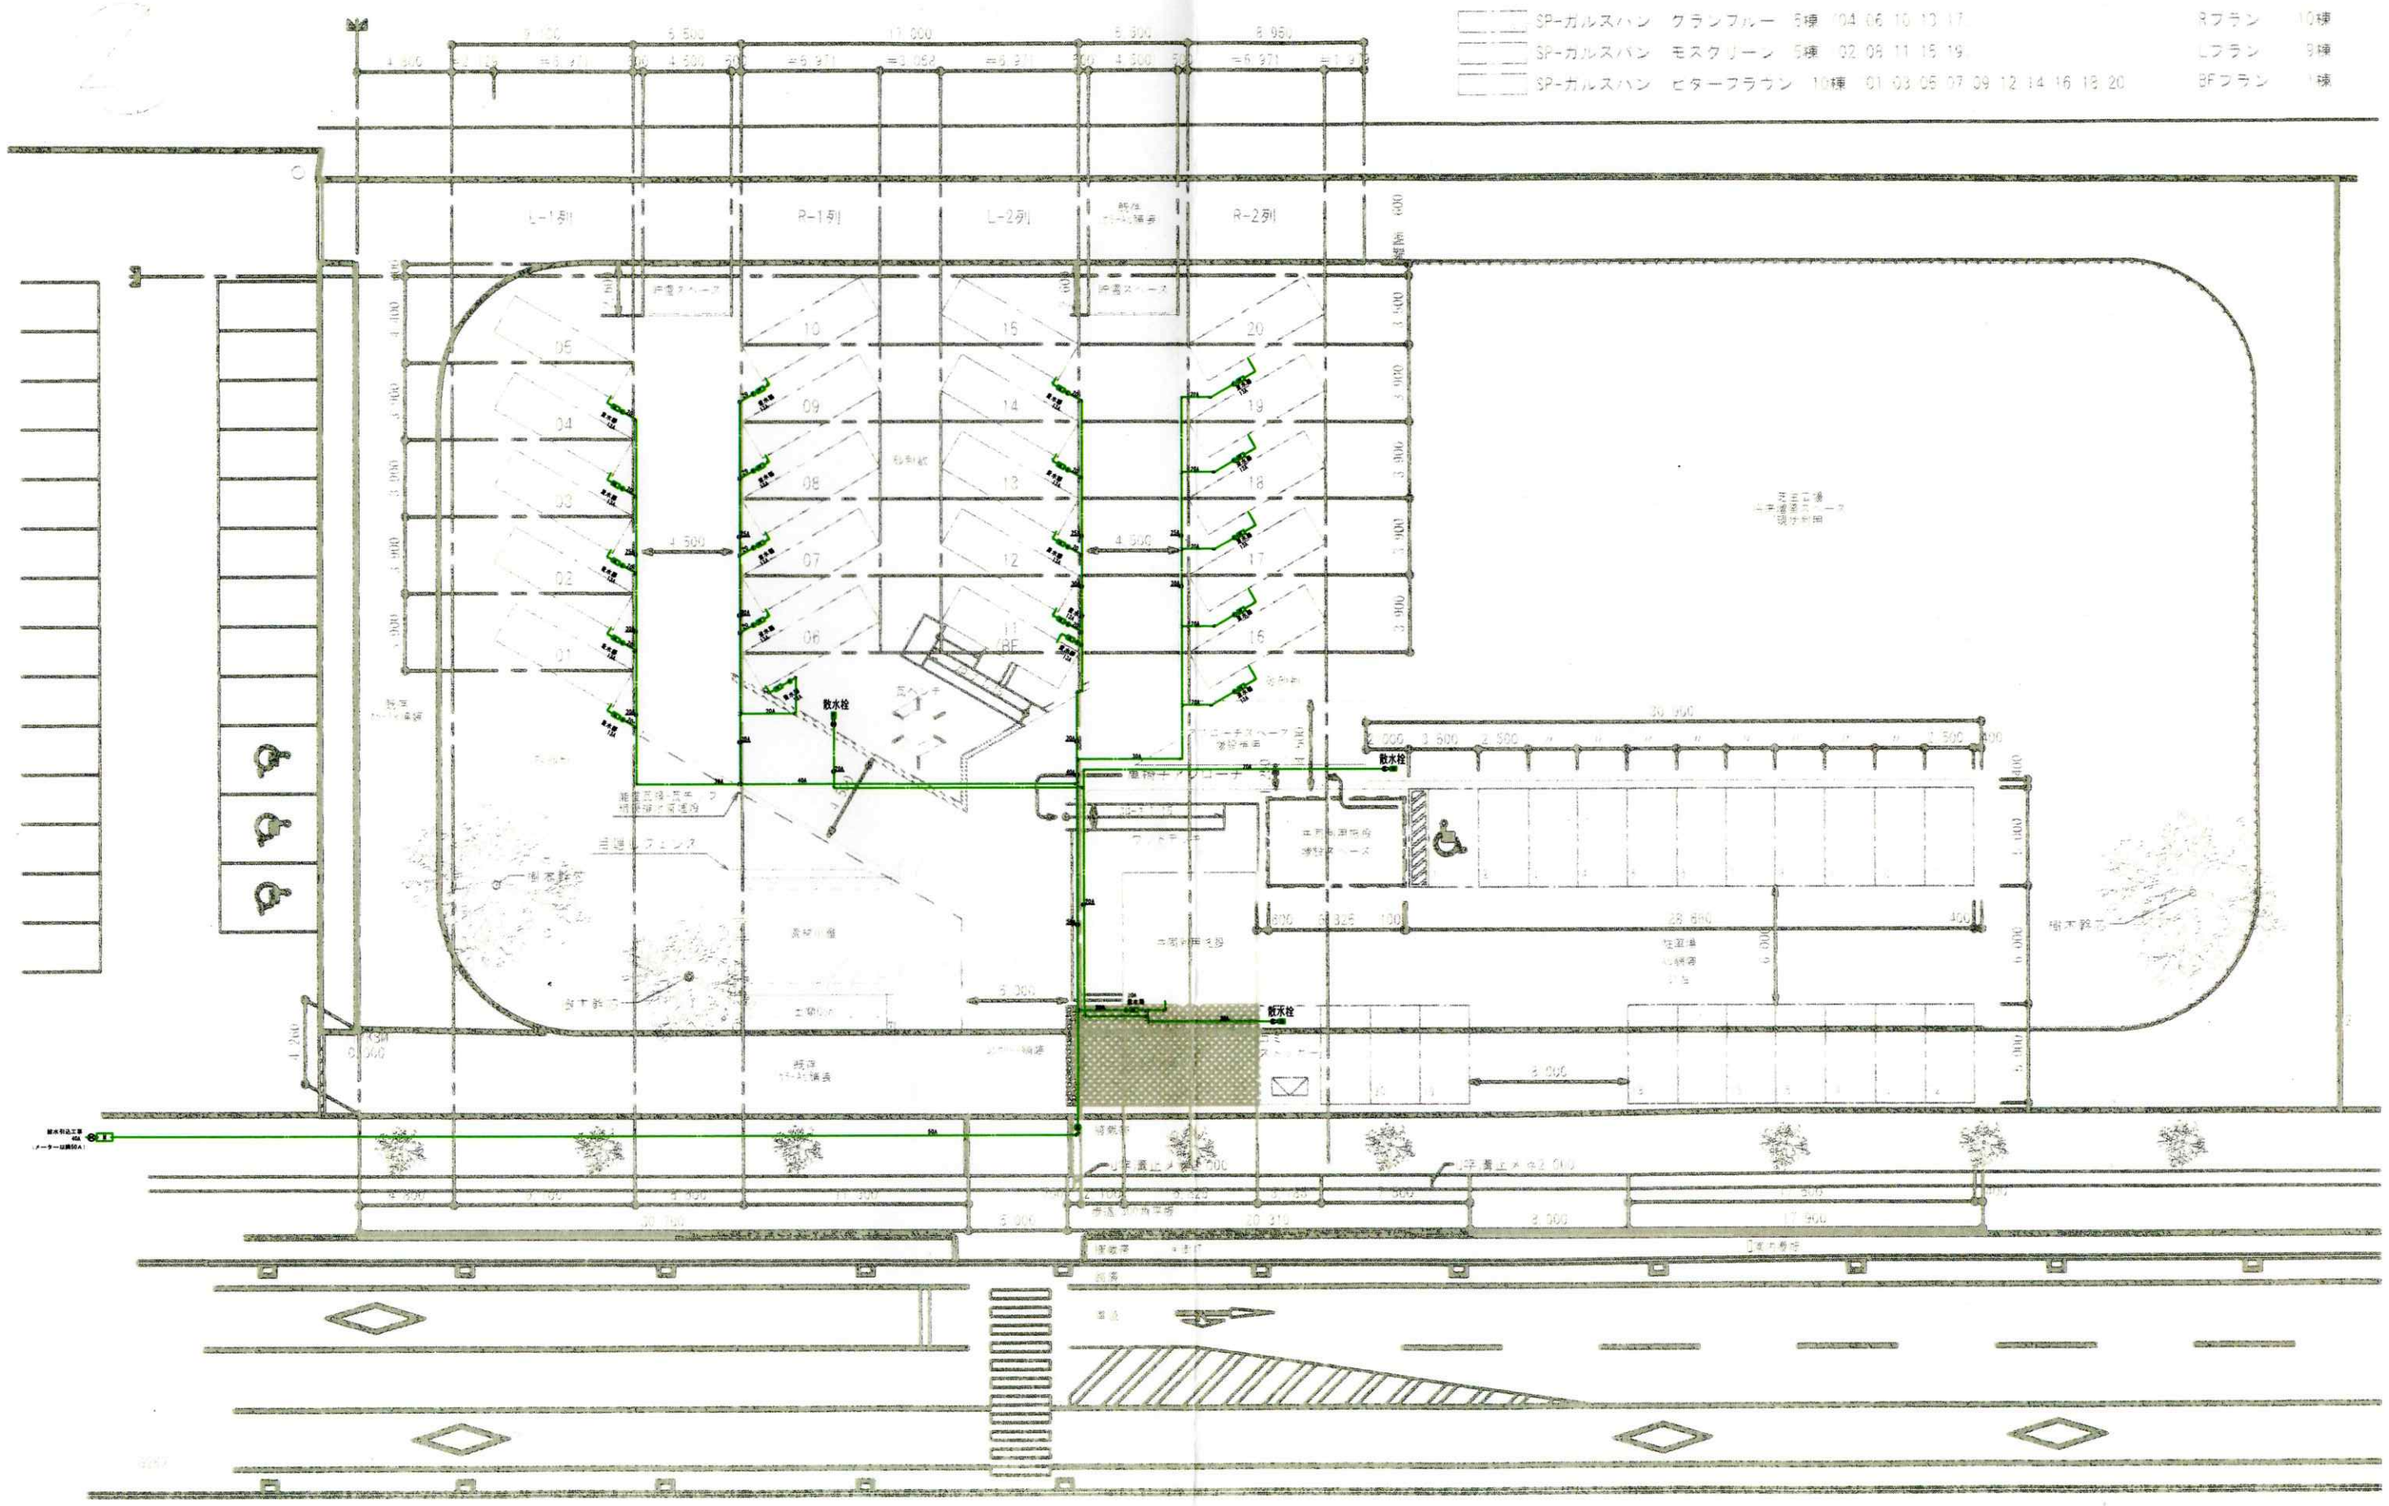

SP-ガルスパン　グランブルー　5棟（04, 06, 10, 13, 17）
SP-ガルスパン　モスグリーン　5棟（02, 08, 11, 15, 19）
SP-ガルスパン　ビターブラウン　10棟（01, 03, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 18, 20）

Rプラン：　10棟
Lプラン：　9棟
BFプラン：　1棟

