

# 公費解体の進捗状況（令和7年9月末）について




- 解体見込棟数 42,710棟（別管理建物※を除く）の **88.0%**となる **37,584棟**の解体が完了
- 9月単月 計画: 3,323棟 実績: 2,008棟 達成率:60.4%
- 9月末累計 計画:40,134棟 実績:37,584棟 達成率:93.6%

※別管理建物：修繕・利活用を申し出た建物、土砂崩れで解体できない建物、解体に時間を要する大規模建物など、市町がやむを得ないと判断した建物

|      |                    | 実行計画【R6.2】<br>解体見込22,499棟 |      |      |       |       | 加速化プラン【R6.8】<br>解体見込32,410棟 |       |       |        |        | 加速化プラン【R7.1】<br>解体見込39,235棟 |        |        |        |        | 加速化プラン【R7.7】<br>解体見込44,953棟 |        |        |        |        | 解体見込棟数 | 別管理建物 |
|------|--------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      |                    | R6.3                      | R6.4 | R6.5 | R6.6  | R6.7  | R6.8                        | R6.9  | R6.10 | R6.11  | R6.12  | R7.1                        | R7.2   | R7.3   | R7.4   | R7.5   | R7.6                        | R7.7   | R7.8   | R7.9   | R7.10  | 44,953 | 2,243 |
| 解体計画 | ①解体棟数（各月）          | 15                        | 163  | 288  | 610   | 1,112 | 1,208                       | 2,036 | 2,348 | 2,400  | 2,265  | 2,450                       | 1,958  | 2,747  | 3,096  | 3,100  | 3,006                       | 2,449  | 2,584  | 3,323  | 2,576  |        |       |
|      | ② "（累計）            | 15                        | 178  | 466  | 1,076 | 2,188 | 3,396                       | 5,432 | 7,780 | 10,180 | 12,445 | 16,602                      | 18,560 | 21,307 | 24,403 | 27,503 | 30,509                      | 34,227 | 36,811 | 40,134 | 42,710 |        |       |
|      | 解体実施率（累計）          | 0.0%                      | 0.4% | 1.1% | 2.5%  | 5.1%  | 7.9%                        | 13%   | 18%   | 24%    | 29%    | 39%                         | 43%    | 50%    | 57%    | 64%    | 71%                         | 80%    | 86%    | 94%    | 100%   |        |       |
| 解体実績 | ③解体実績（各月）          | 15                        | 163  | 288  | 610   | 1,112 | 1,208                       | 1,700 | 2,638 | 3,286  | 3,132  | 2,960                       | 1,832  | 3,541  | 3,546  | 2,629  | 3,118                       | 2,263  | 1,535  | 2,008  |        |        |       |
|      | ④ "（累計）            | 15                        | 178  | 466  | 1,076 | 2,188 | 3,396                       | 5,096 | 7,734 | 11,020 | 14,152 | 17,112                      | 18,944 | 22,485 | 26,031 | 28,660 | 31,778                      | 34,041 | 35,576 | 37,584 |        |        |       |
|      | 解体率（見込・累計）         | 0.0%                      | 0.4% | 1.1% | 2.5%  | 5.1%  | 8.0%                        | 11.9% | 18.1% | 25.8%  | 33.1%  | 40.1%                       | 44.4%  | 52.6%  | 60.9%  | 67.1%  | 74.4%                       | 79.7%  | 83.3%  | 88.0%  |        |        |       |
|      | 計画達成率（各月）<br>（③÷①） |                           |      |      |       |       | 100%                        | 83%   | 112%  | 137%   | 138%   | 121%                        | 94%    | 129%   | 115%   | 84.8%  | 104%                        | 92.4%  | 59.4%  | 60.4%  |        |        |       |
|      | 計画達成率（累計）<br>（④÷②） | —                         | —    | —    | —     | —     | 100%                        | 94%   | 99%   | 108%   | 114%   | 103%                        | 102%   | 106%   | 107%   | 104%   | 104%                        | 99.5%  | 96.6%  | 93.6%  |        |        |       |

解体見込棟数  
（別管理建物を除く）

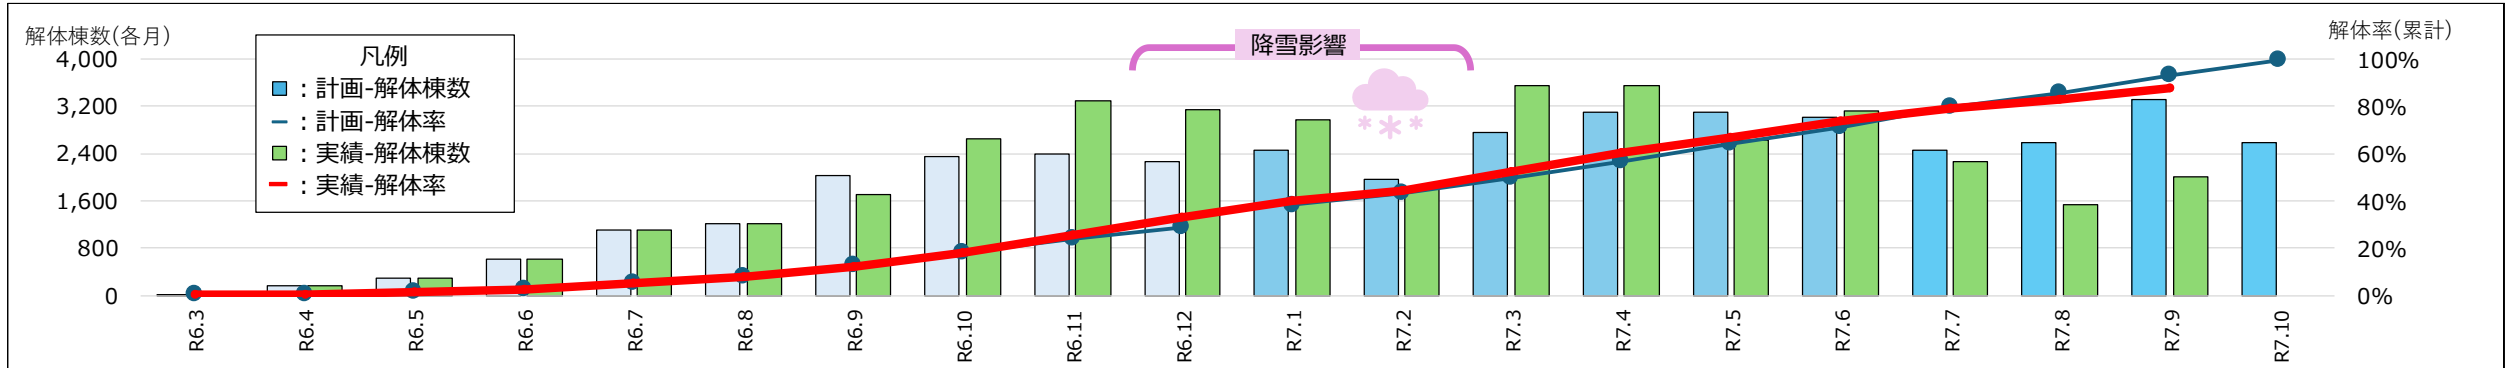

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計  
※解体見込棟数は、加速化プラン【R7.7】の棟数。別管理建物の棟数は、最新値

# 市町別の進捗状況（令和7年9月末）について



・穴水町で97%、志賀町で95%、珠洲市で94%の公費解体が完了

| 市町      | 解体見込棟数<br>〔R7.7加速化プラン〕<br>A | 申請棟数<br>B       | 完了棟数<br>C       | 公費解体            | 緊急解体       | 自費解体         | 別管理建物<br>D   | 解体率<br>(見込棟数あたり)<br>C÷(A-D) | 解体率<br>(申請棟数あたり)<br>C÷(B-D) | 解体未完了<br>(見込棟数あたり)<br>A-C-D | 解体未完了<br>(申請棟数あたり)<br>B-C-D |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 珠洲市     | 8,499<br>〔57〕               | 8,507<br>〔57〕   | 7,825<br>〔45〕   | 7,664<br>〔45〕   | 111<br>〔0〕 | 50<br>〔0〕    | 171<br>〔5〕   | 94.0%<br>〔86.5%〕            | 93.9%<br>〔86.5%〕            | 503<br>〔7〕                  | 511<br>〔7〕                  |
| 輪島市     | 12,808<br>〔217〕             | 12,461<br>〔214〕 | 10,741<br>〔77〕  | 10,421<br>〔77〕  | 259<br>〔0〕 | 61<br>〔0〕    | 670<br>〔0〕   | 88.5%<br>〔35.5%〕            | 91.1%<br>〔36.0%〕            | 1,397<br>〔140〕              | 1,050<br>〔137〕              |
| 能登町     | 4,456<br>〔18〕               | 4,474<br>〔18〕   | 3,867<br>〔18〕   | 3,777<br>〔18〕   | 2<br>〔0〕   | 88<br>〔0〕    | 10<br>〔0〕    | 87.0%<br>〔100%〕             | 86.6%<br>〔100%〕             | 579<br>0                    | 597<br>0                    |
| 穴水町     | 2,819                       | 2,795           | 2,698           | 2,659           | 0          | 39           | 27           | 96.6%                       | 97.5%                       | 94                          | 70                          |
| 七尾市     | 7,500                       | 7,154           | 4,883           | 4,342           | 0          | 541          | 674          | 71.5%                       | 75.4%                       | 1,943                       | 1,597                       |
| 志賀町     | 5,104                       | 4,931           | 4,436           | 4,041           | 9          | 386          | 424          | 94.8%                       | 98.4%                       | 244                         | 71                          |
| 上記以外の市町 | 3,767                       | 3,747           | 3,134           | 2,730           | 4          | 400          | 267          | 89.5%                       | 90.1%                       | 366                         | 346                         |
| 計       | 44,953<br>〔292〕             | 44,069<br>〔289〕 | 37,584<br>〔140〕 | 35,634<br>〔140〕 | 385<br>〔0〕 | 1,565<br>〔0〕 | 2,243<br>〔5〕 | 88.0%<br>〔48.8%〕            | 89.9%<br>〔49.3%〕            | 5,126<br>〔147〕              | 4,242<br>〔144〕              |

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

# 10月末における公費解体の見込について



- ・現状の解体ペースを維持すれば、**10月末の解体率は、県全体で93～95%と**、公費解体加速化プランで設定した10月末での**解体完了目標をおおむね達成の見込**
- ・一方で、解体完了が**11月以降にずれ込む建物は、別管理建物を除き、2,000～3,000棟**となる見込
- ・ずれ込む棟数が最も多いと見込まれるのは七尾市であり、その理由としては、申請期限を最も遅く設定したことで公費解体の体制整備が遅れたことや、駆け込み申請が多かったことなどが挙げられる
- ・11月以降も、できるだけ早期に解体を完了するとともに、令和8年3月末の災害廃棄物の処理完了を目標として、**工程管理会議などを通して、引き続き、市町を支援していく**

## 七尾市の進捗が遅い理由

- ・被災者に配慮して、申請期限を遅く設定したことにより、当初、解体の申請が伸びず、解体の体制整備が遅れたこと（七尾市 R7.8、他5市町 R7.1～R7.6）
- ・駆け込み申請が多かったこと（8月以降 780棟）
- ・半壊以上の被害認定棟数が増加したこと（R6.8→R7.8：県全体1.1倍、七尾市1.8倍）

現在、  
・専門コンサルタント  
・解体班  
の体制を強化中



# のと里山空港「『空の日』フェスティバル2025」について

- ・地震により遊び場が少なくなっている能登の子どもたちに思いきり楽しめる場を提供するほか、のと里山空港の魅力を感じてもらうため、「空の日」を記念して、「『空の日』フェスティバル2025」を開催  
→ 航空への理解・関心を高めてもらうことを目的に9月20日を「空の日」として制定され、全国の空港ではイベントを開催
- ・能登の早期復興を願う**ANA、ポケモン・ウィズ・ユー財団のご協力に感謝申し上げます**  
→ 県と（一財）ポケモン・ウィズ・ユー財団は包括連携協定を締結（令和6年7月17日）

## 主催

県、ANA、のと里山空港利用促進同盟会などで構成する  
のと里山空港「空の日」実行委員会

## 日時

10月12日(日) 9時30分～15時

## 会場

のと里山空港

## 内容

- ①ポケモンこどもキリコで空港を練り歩こう！  
（**ポケモン・ウィズ・ユー財団との連携**）
- ②ANA空港お仕事見学（**ANAとの連携**）
- ③航空教室（**ANAとの連携**）
- ④のと里山空港滑走路バスツアー
- ⑤東京に行こう！！紙飛行機 的入れゲーム

そのほか、飲食ブース、のっぴーグラス作りなど、楽しいイベントが盛りだくさん！



©Pokémon. ©Nintendo/  
Creatures Inc./GAME FREAK inc.



▲詳しくはこちら

交通総合対策監室 076(225)1336

# 「ポケモンこどもキリコ」の能登6市町巡回展示について

・ポケモン・ウィズ・ユー財団のご協力のもと、**能登6市町で「ポケモンこどもキリコ」の巡回展示を、10月13日(月・祝)からスタート**

→のと里山空港「『空の日』フェスティバル2025（10月12日）」の翌日から実施  
→(一財)ポケモン・ウィズ・ユー財団が地震の復興支援の一環で制作した「ポケモンこどもキリコ」を県に無償貸与

・**巡回展示後は、能登各地で開催されるキリコ祭りへの貸出を予定**

## 巡回展示のスケジュール

10月13日(月・祝)～令和8年6月29日(月)

|   | 市町  | 展示場所      | 展示期間                |
|---|-----|-----------|---------------------|
| ① | 穴水町 | のと鉄道穴水駅   | R7.10.13 ～ R7.11.24 |
| ② | 能登町 | イカの駅つくモール | R7.11.26 ～ R8. 1. 7 |
| ③ | 志賀町 | いこいの村能登半島 | R8. 1. 9 ～ R8. 2.19 |
| ④ | 輪島市 | ワイプラザ輪島店  | R8. 2.21 ～ R8. 4. 2 |
| ⑤ | 珠洲市 | 道の駅すず塩田村  | R8. 4. 4 ～ R8. 5.17 |
| ⑥ | 七尾市 | 和倉温泉お祭り会館 | R8. 5.19 ～ R8. 6.29 |



©Pokémon. ©Nintendo/  
Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(サイズ) 横幅160cm、奥行き246cm、高さ237cm

# いしかわ動物園での新たな動物の公開について



- ・入園者からの新しい動物を公開してほしいとの声を受け、SNSなどで人気が高まっている

## ウッドチャック2頭（オス・メス各1頭）とパルマワラビー1頭（オス）を明日から公開

- いしかわ動物園としては、2年ぶりの新たな動物の公開（R5：フェネック）
- ウッドチャック：国内3施設目、日本海側では初の導入
- パルマワラビーのメス1頭は飼育環境に馴れ次第公開

- ・明日の公開初日には、飼育員によるスペシャルガイドを実施するほか、愛称の投票も開始

公開日

明日10月11日(土)

スペシャルガイド

10月11日(土)

【ウッドチャック】10時/14時/15時(1日3回)

【パルマワラビー】10時45分/13時30分(1日2回)

愛称の候補は  
動画をご覧いただいた後  
スライドで紹介！

### ◆ウッドチャック（リス科マーモット属）



|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 生息地 | カナダ、アメリカの北東部および中央部                                            |
| 体長等 | 体長40～65cm<br>体重2～6kg                                          |
| 食性  | 草、穀物、果物など                                                     |
| 特徴  | リス科で最大級の「野生動物」<br>地面を掘るのが得意で、掘った巣穴で冬眠をする<br>※動物園で飼育する場合、冬眠しない |

### ◆パルマワラビー（カンガルー科）



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 生息地 | オーストラリア東部                           |
| 体長等 | 体長45～55cm<br>体重3～6kg                |
| 食性  | 草、野菜、果物など                           |
| 特徴  | カンガルー属で最も小さい<br>警戒心の中にある好奇心旺盛な性格が特徴 |

観光戦略課 076(225)1126

# いしかわ動物園での新たな動物の愛称投票について



## 愛称の投票

10月11日(土)～26日(日)、ウッドチャック2頭とパルマワラビー1頭の愛称を飼育員が考案した候補の中から投票園内や園公式Xで投票を受け付け

## 愛称の発表

11月中

## ウッドチャック（オス・メス）の愛称候補

|   | オス    | メス    | 由来                 |
|---|-------|-------|--------------------|
| ① | ウッディー | チャッキー | ウッドチャックの種名をもじって    |
| ② | あんころ  | おもち   | 石川県の名産             |
| ③ | だいず   | こむぎ   | 主な生息地である北米の生産が多い穀物 |
| ④ | エビカツ  | ハムカツ  | 見た目の特徴             |

## パルマワラビー（オス）の愛称候補

※メスは既に愛称「メイ」がついているので、今回はオスの愛称投票のみ実施

|   | オス  | 由来                        |
|---|-----|---------------------------|
| ① | サボ  | 伊豆シャボテン動物公園(静岡県)から仲間入りのため |
| ② | テン  | 伊豆シャボテン動物公園(静岡県)から仲間入りのため |
| ③ | ワサビ | 静岡県の特産物                   |
| ④ | グリ  | 静岡県特産品のぐり茶                |

**みなさまの投票を  
お待ちしております！**

観光戦略課 076(225)1126
